

MICROFICHE N°

34130

Gouvernement Tunisien

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNISIE

الجنة تونسية  
وزارة الفلاحة

المركز القومي  
للسويق الفلاحي  
تونس

F 1

PE-17

VILLAGES FORESTIERS

A

341972 /  
DIFFUSION RESTRIEUTE

S E P Z A

Jan 1974

EDITION PROVISOIRE

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE  
DE L'AGRICULTURE

Direction des Forêts

C.P. 21  
Organisation des Nations Unies  
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-SIDA  
N° 11-TUN-5-SWE

Assistance au développement des  
actions forestières en Tunisie

VILLAGES FORESTIERS

A

G E P Z A

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE  
DE L'AGRICULTURE

Direction des Forêts

C.P. 21  
Organisation des Nations Unies  
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-SIDA  
N° 11-TUN-5-SWE

Assistance au développement des  
actions forestières en Tunisie

VILLAGES FORESTIERS

A

G E P Z A

VILLAGES DÉTACHÉS

—  
21114828

2.3 LA GRANDE SÉCHEUR

—  
Département des PâtesOrganisation des Nations Unies  
pour l'Alimentation et l'Agriculture—  
Projet Pao/SIDA

N° 00 - 378 - 3 - 142

—  
Assistance au développement des  
activités forestières en Tunisie

VILLAGES DÉTACHÉS — FORESTATION

A

B E T H A

CONTENUS

Sommaire	X - 1
Résumé	X - 2
 1.1. Introduction.	1
1.2. Quelques données du secteur Cap Negro.	1
2. Description du Projet.	3
2.1.1. L'organisation de l'Administration du projet d'Ouled Gassou et de Nane.	3
2.1.2. Vers la création d'un "Centre de service et de formation pratique" pour les petits agriculteurs.	4
2.1.3. Les actions forestières.	6
2.2. Estimation du coût d'Investissement.	7
2.2.1. La programmation des investissements.	7
2.2.2. Les constructions dans les villages Ouled Gassou et Nane.	8
2.2.3. L'infrastructure.	9
2.2.4. Matériel de transport et équipement agricole pour le centre de service.	10
2.2.5. Matériel du bureau.	12
2.2.6. Équipement des bâtiments publics.	13
2.2.7. Les moyens d'existences.	16
2.2.8. L'accordement du projet.	17
2.2.9. Le fonctionnement du matériel.	18
2.2.10. Les frais du bureau et imprévu.	19
2.2.11. Récapitulation.	20
 Annexe 1 - Liste des plans.	21

### 1.1 INTRODUCTION :

Dans le cadre du programme spécial du développement rural, il a été prévu la création de 2 villages forestiers dans la délégation de Nofia - secteur Cap Negro. Dans ce rapport, nous présentons le programme d'édification de 2 villages : Ouled Gassou et Haas.

Le but de ces villages forestiers et le mode d'exécution ont été élaborés dans deux études préliminaires intitulées : "Villages forestiers en Kroumérie", et, "Villages forestiers à Andoum".

Nous nous limitons, dans ce rapport, à un bref rappel des objectifs de ces villages.

#### Les Objectifs :

Les villages forestiers ont comme objectif principal, de permettre aux usagers des forêts l'amélioration de leurs chances afin d'accéder à une vie plus décente.

La création d'un village comme pôle attractif dans la région, permettra de dialoguer avec la population forestière afin de :

- Nier le déséquilibre des potentialités en ressources fourragères et les besoins en cheptel des usagers.
- Intamer une stratégie pour la sauvegarde de la couverture végétale, et la lutte contre l'érosion en commun accord avec les usagers.
- Donner une formation pratique aux défaillants des enseignements secondaire et primaire dans les domaines des travaux forestiers, la Forge, la Maçonnerie, la Ferronnerie notamment aux garçons, ainsi que l'apprentissage des techniques d'artisanat aux filles et aux garçons également.
- Introduire les techniques modernes en matière de planning familial, afin de réduire autant que possible le taux de natalité de la population.

Les usagers des forêts devraient être invités à participer à la création de leur village.

Le fait de vivre en village mettra en route un processus de changements dans le mode de vie.

Une participation active des intéressés permet de faciliter l'intégration dans la vie d'un village et on favorise l'adaptation.

### 1.2 Quelques données du secteur Cap Negro.

Les villages forestiers d'Ouled Gassou et Haas sont localisés dans le secteur Cap Negro, faisant partie de la délégation de Nofia.

Le secteur Cap Negro (4.300 habitants) se caractérise, d'une part, par une faible densité de la population dans la région forestière du secteur, et, d'autre part, par une forte densité sur les plaines entre la plaine de Nefza et les forêts.

Dans le secteur, il existe deux écoles : l'une est située au bord de la route goudronnée dans les environs du poste forestier de Béjaïf (280 élèves), l'autre école à Ouled Gassou (470 élèves).

Nas se situe en pleine forêt, à côté du poste forestier Khargilia.

L'arrondissement forestier de Béja a créé une pâture de 50 ha pendant 1973 dans cette région.

Près du poste forestier, Khargilia, il existe 3 petites douars groupant en totalité 27 familles. On a l'impression qu'on se trouve dans un forêt sous-penitie, étant donné les possibilités de parcours en forêt, la pâture, les travaux forestiers et les potentialités d'irrigation.

La pisciculture pourrait être également améliorée. On nous a également parlé d'un projet de tourisme au Cap Negro pour les vacances du ramadan.

Sans connaître l'ampleur des interventions dans le cadre de ce projet, on pourrait également envisager la création d'un village de repos pour le tourisme de la population d'arrière pays (Nefza, Béja, Sedjenane, Mateur).

Tenant compte des traditions, de la vie culturelle de la population rurale du secteur Cap Negro, il pourrait être souhaitable que le projet touristique se réalisera, par exemple, aux îles de la Galite. Selon ces indications précédentes, il se dégage que 175 ménages peuvent être intégrés à Nas , suivant les données de l'arrondissement forestier. On doit également tenir compte du fait qu'une partie importante de ces ménages est dirigée vers le petit pôle d'attraction de Taméra.

La création d'un village à Ouled Gassou, situé à 6 km de Nefza, sera aussi comme conséquence la diminution du nombre de ménages intéressés du village de Nas.

La localisation du centre de ce village doit être bien étudiée, tout en tenant compte de ces tendances de l'attraction vers Taméra, Ouled Gassou et Nefza.

Il n'est pas exclu qu'un petit village avoisinant la méditerranée aura plus de chances à moyen terme grâce aux travaux forestiers et un développement touristique ; les possibilités de pêche et des zones de pâture intenses sont à une distance d'environ 5 km.

Le secteur Cap Negro (4.300 habitants) se caractérise, d'une part, par une faible densité de la population dans la région forestière du secteur, et, d'autre part, par une forte densité sur les piedmonts entre la plaine de Nefaa et les forêts.

Dans le secteur, il existe deux écoles : l'une est située au bord de la route goudronnée dans les environs du poste forestier de Delfif (280 élèves), l'autre école à Ouled Gassam (470 élèves).

Nazza se situe en pleine forêt, à côté du poste forestier Khorgalia.

L'arrondissement forestier de Déja a créé une pâturage de 50 ha pendant 1973 dans cette région.

Près du poste forestier, Khorgalia, il existe 3 petits douars groupant en totalité 27 familles. On a l'impression qu'on se trouve dans une forêt sous-peuplée, étant donné les possibilités de parcours en forêt, la pâturage, les travaux forestiers et les potentialités d'irrigation.

La pisciculture pourrait être également améliorée. On nous a également parlé d'un projet de tourisme au Cap Negro pour les amateurs du randonnée.

Sans connaître l'ampleur des interventions dans le cadre de ce projet, on pourrait également envisager la création d'un village de repos pour le tourisme de la population d'arrière pays (Nefaa, Déja, Sodjenane, Metour).

Tenant compte des traditions, de la vie culturelle de la population rurale du secteur Cap Negro, il pourrait être souhaitable que le projet touristique se réalisera, par exemple, aux îles de la Galite. Selon ces indications précédentes, il se dégage que 175 ménages peuvent être intégrés à Nazza, suivant les données de l'arrondissement forestier. On doit également tenir compte du fait qu'une partie importante de ces ménages est dirigée vers le petit pôle d'attraction de Tadra.

La création d'un village à Ouled Gassam, situé à 6 km de Nefaa, aura aussi comme conséquence la diminution du nombre de ménages intéressés du village de Nazza.

La localisation du centre de ce village doit être bien étudiée, tout en tenant compte de ces tendances de l'attraction vers Tadra, Ouled Gassam et Nefaa.

Il n'est pas exclu qu'un petit village avoisinant la méditerranée aura plus de chances à moyen terme grâce aux travaux forestiers et un développement touristique ; les possibilités de pêche et des zones de pâturage intensive sont à une distance d'environ 5 km.

Le village d'Ouled Gassam pourrait être créé dans les environs de l'école primaire et les bâtiments de l'ancienne ferme Crochet.

Le chemin de fer Tunis - Gabès se trouve à une distance de 2 km. Le train s'arrête pour les passagers et les voyageurs, mais le déchargement n'est plus possible actuellement.

Il serait important d'encourager la réparation du chemin de fer, et constituer un hangar afin de garantir le transport des marchandises. La piste menant jusqu'à la route goudronnée (Route N° 7 de Mefca à Sidi Djedid) doit être aménagée sur une distance de 4 km.

Cinq gares sont directement intéressées par le village Ouled Gassam regroupant 222 ménages.

Si nous avons constaté à Béja une très forte dispersion des ménages, Ouled Gassam est par contre caractérisé par une forte concentration de ces 222 ménages.

Se référant à une enquête (1), il y a en moyenne 3 enfants non-actifs par ménage.

Le chef de ménage travaille 4 mois par an hors du domaine agricole, parce que chaque famille ne possède qu'un demi ha en moyenne.

Le revenu annuel est estimé à 85 dinars par ménage, non compris la consommation de la production de leur propre potager familial.

## 2 - DESCRIPTION DU PROJET :

### 2.1.1. L'organisation de l'Administration du projet d'Ouled Gassam et de Béja :

Le conseil de gouvernement de Béja contrôle et supervise le programme de développement rural.

Suite à la circulaire du 18 avril 1974 du Premier Ministère, il aura institué un "Bureau de l'Animation Rurale" dans chaque gouvernorat.

"Il aura pour tâche, sous l'autorité directe du gouverneur, d'identifier et de suivre les projets à réaliser dans le cadre du programme de développement rural, en étroite collaboration avec les services techniques régionaux des différents départements ministériels, les représentations régionales de certaines offices et entreprises nationales, et éventuellement les associations agréées à cet effet".

Le gouvernorat est autorisé à octroyer "des subventions et aides en argent à des personnes physiques ou morales comme dans le cadre de l'amélioration de l'habitat ou de l'encouragement de certaines activités telles que la pêche, l'artisanat et autres".

(1). effectuée par G. HAVELINCK de l'Université d'Amsterdam.

Le village d'Ouled Gassoum pourrait être créé dans les environs de l'école primaire et les bâtiments de l'ancienne ferme Croissant.

Le chemin de fer Tunis - Gabes se trouve à une distance de 2 km. Le train s'arrête pour les passagers et les voyageurs, mais le débarquement n'est plus possible actuellement.

Il serait important d'envisager la réparation du chemin de fer, et constituer un hangar afin de garantir le transport des marchandises. La piste devant jusqu'à la route goudronnée (Route N° 7 de Nefza à Bedjenane) doit être aménagée sur une distance de 4 km.

Sept douars sont directement intéressés par le village Ouled Gassoum groupant 222 ménages.

Si nous avons constaté à Nass une très forte dispersion des séjours, Ouled Gassoum est par contre caractérisé par une forte concentration de ces 222 ménages.

Se référant à une enquête (1), il y a en moyenne 3 enfants non-mariés par ménage.

Le chef de ménage travaille 4 mois par an hors du domaine agricole, parce que chaque famille ne possède qu'un demi ha en moyenne.

Le revenu annuel est estimé à 85 dinars par ménage, non compris la consommation de la production de leur propre potager familial.

## 2 - DESCRIPTION DU PROJET :

### 2.1.1. L'organisation de l'Administration du projet d'Ouled Gassoum et de Nass :

Le conseil de gouvernorat de Béja contrôle et supervise le programme du développement rural.

Suite à la circulaire du 18 Avril 1974 du Premier Ministère, il sera institué un "Bureau de l'Animation Rurale" dans chaque gouvernorat.

"Il sera pour tâche, sous l'autorité directe du gouverneur, d'identifier et de suivre les projets à réaliser dans le cadre du programme de développement rural, en étroite collaboration avec les services techniques régionaux des différents départements ministériels, les représentations régionales de certaines offices et entreprises nationales, et éventuellement les associations agréées à cet effet".

Le gouvernorat est autorisé à octroyer "des subventions et aides en argent à des personnes physiques ou morales comme dans le cadre de l'amélioration de l'habitat ou de l'encouragement de certaines activités telles que la pêche, l'artisanat et autres".

(1). effectuée par G. HERVERKAMP de l'Université d'Amsterdam.

Le point fondamental concerne l'organisation et l'administration du programme d'exécution, étant donné l'absence d'une structure spécifique pour ces projets intégrés dans les zones forestières. L'association tunisienne pour la promotion de l'emploi et du logement (APEL) a obtenu en 1973 l'accord du gouvernement de Béja pour exécuter un programme à Ouled Gassan.

L'objectif du programme a été l'aménagement d'un "centre de service", la mise en valeur d'une ancienne ferme (150 ha) et la construction de 20 logements.

En suivant les moyens de financement de l'APEL, ce programme pourrait être réalisé pendant les années 1974 - 1976. Le devis estimatif du projet est de l'ordre de 40.000 Dinars dont 25 % seront, en principe, subventionnés par le gouvernorat de Béja. L'exécution des deux villages forestiers d'Ouled Gassan et de Nass pourrait être confiée à l'APEL.

Le "Comité régional de l'APEL" à Béja contrôle et surveille l'exécution par son équipe le programme à Ouled Gassan et Nass dont les rapports seront communiqués au Bureau d'Initiation Rurale à Béja.

#### 2.1.2. Vers la création d'un "Centre de service et de formation pratique" pour les petits agriculteurs :

L'aide aux petits agriculteurs est une action difficile à réaliser sur le terrain.

La distribution des biens en cheptel, semences .... au profit des petits agriculteurs n'aboutit souvent pas aux résultats escomptés qu'on a désirés. Le problème fondamental est souvent le manque d'infrastructure et d'organisation locale, afin d'assister les agriculteurs pendant quelques années. Dans les zones forestières, la situation est encore pire, tenant compte de l'absence de ces structures d'organisation agricoles et les difficultés d'accès dans ces zones.

Un changement du point de vue technique a souvent aussi des conséquences sur la vie d'une communauté.

Les projets de "développement communautaire" en Asie et en Afrique ont été souvent voués à l'échec. Les causes ont été certes multiples, mais nous nous bornons à attirer l'attention sur deux aspects importants :

##### 1<sup>er</sup> aspect.

L'aide est fournie à un certain nombre de bénéficiaires qui ne sont pas organisés.

Ces bénéficiaires ne sont pas possesseurs de grands ou même de moyens capitaux. Ils n'ont qu'un capital limité.

A la fin, ils vendent la production, alors que le capital se trouve dans l'achat des besoins quotidiens nécessaires, mais aussi dans des circonstances exceptionnelles (mariages, fêtes.....).

L'interprétation de l'aide par le bénéficiaire est importante, du moment qu'elle est réalistique :

Si le bénéficiaire cherche un intérêt à court terme, il abandonnera vite, en attendant une nouvelle aide. Mais si le bénéficiaire reçoit une aide qui est conditionnée par un système de contrôle dans sa propre sécurité, on a une chance d'atteindre un meilleur résultat.

Même si l'aide est prévue sous forme d'un don, il est souhaitable que le bénéficiaire alimente, par exemple avec un tiers de son bénéfice, une "Caisse locale d'entraide", afin d'en faire évoluer ses propres voies, ce qui est encourageant pour lui à mieux profiter de l'aide accordée. Il ne faut pas oublier qu'une telle approche aboutira bientôt à une rentabilité optimale de l'investissement.

En fur et à mesure, la création d'un comité local s'impose, afin de gérer cette "caisse locale d'entraide".

Au bout de 2 ou 3 années, ce comité local pourrait assurer le conseil d'administration d'une coopérative de service, ou d'une association d'entraide.

#### 2<sup>me</sup> aspect :

L'assistance technique aux bénéficiaires est nécessaire, afin de leur permettre l'apprentissage gradué de l'emploi des techniques modernes.

Souvent, un petit agriculteur n'est pas en mesure de prendre lui-même le risque d'un échec éventuel d'une expérimentation.

Il est possible de montrer sur une parcelle statique le mode d'irrigation et de l'exploitation d'une culture (légumes, pomme de terre, pâturage intensif .....

Le malheur est souvent que ces expériences dépassent largement la "boîte" du petit agriculteur qui n'est pas habitué à utiliser le matériel moderne. Il semble nécessaire d'intégrer dès le début de l'opération, les futurs bénéficiaires dans une telle action, en leur donnant directement un propre intérêt.

On pourrait suggérer, par exemple, une prime égale à un tiers de la production, sans que le bénéficiaire en prenne le risque en dehors de la période de l'expérimentation.

La création d'un "Centre de service et de formation pratique" est à envisager dans le cadre de ce projet à la ferme "Croisac" (150 ha). L'ancienne ferme pourrait être aménagée facilement, et devenir le centre de l'action dans les deux villages forestiers à Culei Gamme et à Nana.

### 2.1.). les opérations forestières.

Le domaine des forêts dans le secteur du cap Negro concerne notamment les séries aménagées de Bellif I et Bellif II et une zone non - aménagée autour du poste forestier Khorghaliz. (1)

La série de Bellif I contient une surface de 2.171 ha divisée en 40 parcelles. Neuf parcelles ayant une superficie de 652 ha sont incluses dans le programme de reboisement pour la période 1971 - 1980 (2).

La série de Bellif II contient une superficie de 1.391 ha divisée en 23 parcelles. Dix parcelles sont à reboiser d'une superficie de 581 ha pendant la décennie 1971 - 1980.

Dans la zone non - aménagée de Khorghaliz un pâturage intensif de 50 ha a été réalisé en 1973. Le plan quadriennal de l'Arrondissement forestier de Béja prévoit une extension dans la délégation de Nefza sur une surface de 400 ha.

Les autres travaux forestiers concernent notamment :

- 1°) Le défrichement pour la réalisation de reboisement et la zone de pâturage intensif.
- 2°) L'extension du réseau des pistes et l'entretien des pistes existentes.
- 3°) Les travaux de C.E.S.
- 4°) Les coupes d'amélioration dans le Bellif I (1.072 ha) et le Bellif II (800 ha).
- 5°) La récolte de liège. La production de liège pendant la période 1970 - 1975 a été estimée pour le Bellif I à 87.400 quintaux et pour le Bellif II à 23.000 quintaux.

Tenant compte de tous ces travaux, il nous semble qu'il n'y aura pas suffisamment de main d'œuvre disponible dans les clairières des forêts. Il est probable que l'on doive constituer des brigades de travail pour réaliser les objectifs de reboisement et de pâturage intensif.

Le village de Nass pourrait devenir un centre de travail pour ces brigades. Le village d'Ouled Gassas pourrait fournir une grande partie de la main d'œuvre nécessaire.

Il paraît souhaitable de lier les actions d'amélioration pastorale dans la région de Khorghaliz à la création des deux villages forestiers. En donnant le droit aux ouvriers forestiers d'utiliser la zone de pâturage intensif suivant le calendrier défini par le service compétent, on pourrait améliorer la rentabilité du cheptel des ouvriers. Les deux sources principales du revenu familial :

- (1). Les données de base de ce paragraphe ont été fournies par le Service d'Aménagement de la Direction des Forêts.
- (2). Les actions forestières sont prévues sur le budget d'investissement de la Direction des Forêts.

salariés ouverts ouverts (permanence ou temporaire) et la production d'élevage, pourraient garantir des ressources à long terme pour les habitants des deux villages.

### 2.2. Estimation du C.O. d'investissement :

#### 2.2.1. La préparation des investissements :

Le programme d'expansion dans les 2 villages à Nefza sera échelonné sur 3 années : 1974 - 1975 - 1976. Pendant la première année (1974), le centre du village sera créé, à côté de 40 logements qui seront construits à Ouled Gassoum.

En 1975, l'accent sera mis sur l'amélioration des moyens d'existence à Ouled Gassoum et Nassau, ainsi que la construction de 40 logements à Ouled Gassoum, le centre d'action et 10 logements à Nassau.

En 1976, la dernière année de l'expansion, le programme des constructions sera achevé, et la mise en place d'une structure locale devra être réalisée, laquelle pourrait prendre la relève de l'association en ce qui concerne la gestion, des bâtiments publics et l'assistance technique et financière, pour un emploi optimal des investissements.

salariés ouverts ouverts (permanence ou temporaire) et la production d'élevage, pourraient garantir des ressources à long terme pour les habitants des deux villages.

### 2.2. Estimation du C.O. d'investissement :

#### 2.2.1. La préparation des investissements :

Le programme d'expansion dans les 2 villages à Nefza sera échelonné sur 3 années : 1974 - 1975 - 1976. Pendant la première année (1974), le centre du village sera créé, à côté de 40 logements qui seront construits à Ouled Gassoum.

En 1975, l'accent sera mis sur l'amélioration des moyens d'existence à Ouled Gassoum et Nassau, ainsi que la construction de 40 logements à Ouled Gassoum, le centre d'action et 10 logements à Nassau.

En 1976, la dernière année de l'expansion, le programme des constructions sera achevé, et la mise en place d'une structure locale devra être réalisée, laquelle pourrait prendre la relève de l'association en ce qui concerne la gestion, des bâtiments publics et l'assistance technique et financière, pour un emploi optimal des investissements.

**2.2.2. LES CONSTRUCTIONS L'HS LES VILLAGES OÙ LE GASCÉ ET MAIS.**

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Plan	Unité	Cost d'une	Cost Total (D).	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
		E*						
1	Magnins.	10	2	750	1.500	750	750	2.000
2	Galle de réunion.	11	1	2.000	2.000			
3	Dispensaire rural	12	1	2.000	2.000			
4	Atelier de menuiserie.	13	1	2.500	2.500			
5	Ranger / Atelier de menuiserie.	14	1	2.500	2.500			
6	Centre d'apprentissage pour les filles.	15	1	2.500	2.500			
7	Atelier d'animateur.		1	600	600			
8	Ateliers scéniques.		1	600	600			
9	Logements à Ouled Gassef.	15 à 9	120	400	48.000	16.000	16.000	16.000
10	Logements à Mais.	15 à 9	20	400	8.000	4.000	4.000	4.000
11	Poulaillers.		60	200	12.000	4.000	4.000	4.000
	ITAL DES CONSTRUCTIONS			82.200 <sup>D</sup>	26.450 <sup>D</sup>	29.750 <sup>D</sup>	26.000 <sup>D</sup>	

8.4.3. INFRASTRUCTURE.

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Longueur (m)	Coût d'une <sup>4</sup> .	Coût Total.	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
12	L'aménagement d'eau potable.	4.000	0,700	2.800	2.000	600	
13	L'aménagement d'aires de repos à COLAS OLISER.			4.000	2.000	2.000	
14	L'aménagement des pistes.	6.000	4	24.000	12.000	12.000	
15	L'aménagement des sentiers.	2.000	0,500	1.000		1.000	
	TOTAL INFRASTRUCTURE			31.800 <sup>D</sup>	16.000 <sup>D</sup>	15.800 <sup>D</sup>	

**2.2.4. LISTE DE MATERIEL ET EQUIPEMENT AACHÉVÉ POUR LE CHANTIER DE SAVAGE (1)**

N° Ordre.	Description.	Unité	Coût d'unité	Coût total.	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
16	Trecteurs.	2	5.000	10.000	5.000	5.000	6.000
17	Tremieuse.	1	6.000	6.000			
18	Véhicule de service.	1	2.500	2.500	2.500		
19	Grue émetteuse.	1	2.400	2.400	2.400		
20	Tréteau.	1	150	450	100	150	650
21	Boîte réfrigérante.	2	650	1.300	650		
22	Ocultateur à dent.	1	300	300	300		
23	Broaleau (cultipacker).	1	250	250	250		
24	Peséeuse.	1	600	600	600		
25	Plateau fourneau.	1	1.700	1.700	1.700		
26	Fraise - Pelle.	1	300	600	600		
27	Citernes.	1	1.700	1.700	1.700		
28	Plâtre de rochage (0,6%).	1	15.000	15.000	5.000	5.000	3.000
29	Boîte Poche.	1	250	750	350	350	
30	Pelle.	1	1.200	1.200	75	75	
31	Boîte Poche.	1	1.100	1.100	55	55	
32	Machine à déchets.	1	2.000	2.000	40	40	
33	Moules.	1	3.000	3.000	60	60	
34	Pourches.	1	2.500	2.500	125	125	
					100	100	

(1). Le matériel sera acheté au nom de l'association et immatriculé au no.

N° ordre.	INSCRIPTION.	Unités	Coût d'unité	Coût Total.	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
36	i Bouille.	10	1,500	30	30		
37	i Travau d'entretien.	200	0,360	72	60	60	
38	i Pulvérisateur à dos.	10	30	300	150	150	
39	i Brosseuse.	20	14,000	280	140	140	
40	i Bidons de lait.	10	12	120	120	120	
41	i Chariotte des Bidons de lait.	1	1	1	60	60	
42	i Sacole (0 ~ 100 kg).	90	90	90	90	90	
43	i Brosse (4 650 kg).	1	350	350	350	350	
44	i Caisson.	100	3	300	300	300	
45	i Sac en jute.	500	0,300	150	150	150	
46	i Cordes (5 x 100 m).	5	8	40	40	40	
47	i Brosse pour bidons.	10	1,500	15	15	15	
48	i Frigidaire.	1	150	150	150	150	
49	i Padié canante pour bétail.	2	30	60	60	60	
50	i Rondelles de mesure de 25 m.	-	-	-	-	-	
51	i Semences et plants.	2	900	1800	100	100	100
52	i engrafe chinoise.	-	600	200	200	200	
53	i Insecticide, pesticide etc.....	-	450	150	150	150	
<b>TOTAL MATERIEL DE TRANSPORT ET EQUIPEMENT VÉHICULE :</b>		<b>46.820<sup>D</sup></b>	<b>22.730<sup>D</sup></b>	<b>18.340<sup>D</sup></b>	<b>3.750<sup>D</sup></b>		

2.2.5. MATERIEL DU BUREAU.

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Unités	Coût		Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
			d'unité	Total			
X	Machine à écrire.	-	-	-	-	-	-
55	Machine à calculer.	1	160	160	160	160	160
56	Fourneaux.	2	150	300	150	150	150
57	Chaises de bureau.	2	25	50	110	110	110
58	Armoire.	6	10	60	60	60	60
59	Etagères de bureau.	1	70	70	70	70	70
60	Tiroir pour les plans.	2	5	10	10	10	10
61	Chaises, papiers imprimés etc....	1	80	80	60	60	60
		-	150	150	90	90	90
	<b>TOTAL DU MATERIEL DE BUREAU.</b>		790	790	690	690	690

2.2.6. BIENESTRE MUNICIPAL

■ 43 ■

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Unité	Coût unité	Coût total.	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
--------------	--------------	-------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELECTRIFICATION.

- 62 - Généraux électriques.
- 63 - Installations.

ÉLÉVATEUR.

- 64 - Escaliers en bois.

MUR DE SÉPARATION (1).

- 65 - Comptoirs.

MUR DE SÉPARATION (1).

- 66 - Tables.

- 67 - Chaises.

- 68 - Banquettes.

- 69 - Tables d'alimentation.

- 70 - Appareils télévisuels.

MEUBLES.

- 72 - Bureau.

- 73 - Caisses de bureau.

- 74 - Lits.

- 75 - Matelas.

- 76 - Gouvertures.

.../...

N° Ordre.	DESCRIPTION	Unité	Cout d'unité	Cout Total	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
77	- Marques.	2	10	20	20	20	20
78	- Matos d'alsa.	3	12	36	36	36	36
79	- Poles à rasoir.	1	100	100	100	100	100
<b>ÉQUIPEMENT / REUR !</b>							
80	- Matériel pour l'apprentissage.	1	600	600	800	800	800
81	- Poste d'exploitation.	1	500	500	500	500	500
<b>ATTIREZ EN MOBILISÉ.</b>							
82	- Bâtières de 4 m.	23	10	230	230	230	230
83	- Automobiles.	1	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
84	- Poste d'exploitation.	1	500	500	500	500	500
<b>CENTRE D'APPRENTISSAGE.</b>							
85	- Machines à tricoter.	2	200	400	400	400	400
86	- Poste d'exploitation pour formation.	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>MATERIEL MÉTALLIQUE.</b>							
87	- Tables.	2	50	100	100	100	100
88	- Chaises simples.	6	48	288	288	288	288
89	- Armoires de cuisine.	25	50	1.250	1.250	1.250	1.250
90	- Lits.	20	20	400	400	400	400

(Suite 2A 3)

- 15 -

No. order.	Description.	Units.	Cost of unit(s)	Cost total.	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
91	- Datelabs.	2	12	24	24		
92	- Rechargeable bat.	2	20	40	40		
	- Pollas & magnet.	2	60	120	120		
	NET EQUIPS AM	-	-	9,415 <sup>D</sup>	1,649 <sup>D</sup>	5,567 <sup>D</sup>	

- 16 -

N° Créa.	DESCRIPTION	Unités	Débit d'unité	Coût total	Budget 1974	Budget 1975	Budget 1976
93	Materielles pour l'agriculture.	50	60	4.000	2.000	2.000	
94	Poids pour l'exploitation d'un poulailler (100 poulets de chair).	50	100	5.000	1.000	1.000	
95	Poids pour l'exploitation d'un poulailler (50 poules pondeuses).	50	100	5.400	1.800	1.800	
96	Buches.	100	10	1.000	500	500	
97	Lapins + 20 lapins.	50	60	4.000	2.000	1.000	
98	Halots avec équipage.	50	150	7.500	2.500	2.500	
99	Hévéas.	2.000	0,500	1.000	250	500	250
100	Citrons.	3.000	0,200	600	200	500	200
101	Landiers.	2.400	0,300	600	200	200	200
102	Terrains à acheter.	10 ha	200	2.000	1.000	1.000	
<b>TOTAL DES MATERIELS D'EXIGENCE</b>				<b>29.100<sup>D</sup></b>	<b>11.450<sup>D</sup></b>	<b>10.700<sup>D</sup></b>	<b>6.950<sup>D</sup></b>

N° ordre.	DESCRIPTION.	Unité	Budget 1974		Budget 1975		Budget 1976	
			Gains Prix unité / 100	Total	Odet	Total	Odet	
101	Directeur du Projet.	1	200	7.200	-	2.400	-	2.400
102	Secrétaire acceptable.	1	100	3.600	-	1.200	-	1.200
103	Animateur forestier.	1	P.I.	-	-	-	-	-
104	Kinéthrix.	1	50	1.800	600	600	600	600
105	Chasseurs tracteurs.	3	60	6.480	2.160	2.160	2.160	2.160
106	Concierge tracteur.	2	45	2.880	550	960	960	960
107	Dameuse.	2	40	2.880	960	960	960	960
<b>TOTAL DE L'EXERCICE I</b>			<b>24.640</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	

2.2.5. 12 RÉSULTATS EN MARS.

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Carburant.	Direction	Cost Total	Budget	Budget 1975	Budget 1976
			Assurances.		1974		
110	Voiture de service.	700	500	1.200	400	400	400
111	Chauffage.	600	450	1.050	350	350	350
112	Tracteurs (1).	6.000	4.500	10.500	3.500	3.500	3.500
113	Énergie électrique.	800	400	1.200	400	400	400
<b>TOTAL RÉSULTAT EN MARS</b>		-	-	<b>13.950<sup>D</sup></b>	<b>4.650<sup>D</sup></b>	<b>4.650<sup>D</sup></b>	<b>4.650<sup>D</sup></b>

2.2.10. LES FRAIS DE BUREAU ET IMPRIMÉ.

- 19 -

N° Ordre.	DESCRIPTION.	Credit	Credit	Budget	Budget	Indagot
		par année.	Total.	1974	1975	1976
114	Location bureau association à MELA.	400	1.200	400	400	400
115	Maintenance du bureau.	200	600	200	200	200
116	Frais de téléphone.	200	600	200	200	200
117	Imprimerie.	-	6.664	2.001	1.503	3.160
	<b>TOTAL DES FRAIS DE BUREAU ET IMPRIMÉ.</b>		<b>9.084<sup>D</sup></b>	<b>2.801<sup>D</sup></b>	<b>5.303<sup>D</sup></b>	<b>3.960<sup>D</sup></b>

2.2.11. RÉCAPITULATIF.

- 20 -


Chapitre	DESCRIPTION.	Cost total	Budget 1974	Budget 1973	Budget 1975
2.2.2.	Constructions.	82.200	26.450	29.750	26.000
2.2.3.	Infrastructure.	31.000	16.000	15.800	-
2.2.4.	Materiel de transport et équipement agricole.	46.820	22.730	16.340	5.750
2.2.5.	Materiel de bureau.	790	690	50	50
2.2.6.	Équipement des bâtiments publics.	9.416	1.849	3.567	-
2.2.7.	Moyens d'existence.	29.100	11.450	10.700	6.950
2.2.8.	Emménagement.	24.840	6.280	6.260	5.280
2.2.9.	Fonctionnement du matériel.	13.520	4.650	4.650	4.650
2.2.10.	Frais du bureau et imprimerie.	9.084	2.801	2.303	3.900
<b>TOTAL DU PROJET :</b>		<b>243.000<sup>D</sup></b>	<b>96.900<sup>D</sup></b>	<b>95.440<sup>D</sup></b>	<b>55.660<sup>D</sup></b>

MESURES POUR LA PLAGE.

1. Localisation des villages forestiers.
2. Débâcle d'un débarcement.
3. Concentration de la population à Ouled Gacem.
4. Plan type d'un établissement.
5. Habitat évolutif en tuiles.
6. Habitat évolutif en îlots fermés.
7. Habitat évolutif en dalles isolées.
8. Habitat évolutif en dalles horizontale.
9. Habitat évolutif en voûte.
  
10. Peignoir.
  
11. Salles de réunion.
  
12. Dispensaires.
  
13. Boulangerie / Pergo.
  
14. Boucher / Atelier de confection.
  
15. Centre de tissage.

# CONCENTRATION DE LA POPULATION A OULED GASSEM

C.N.D.A 34130

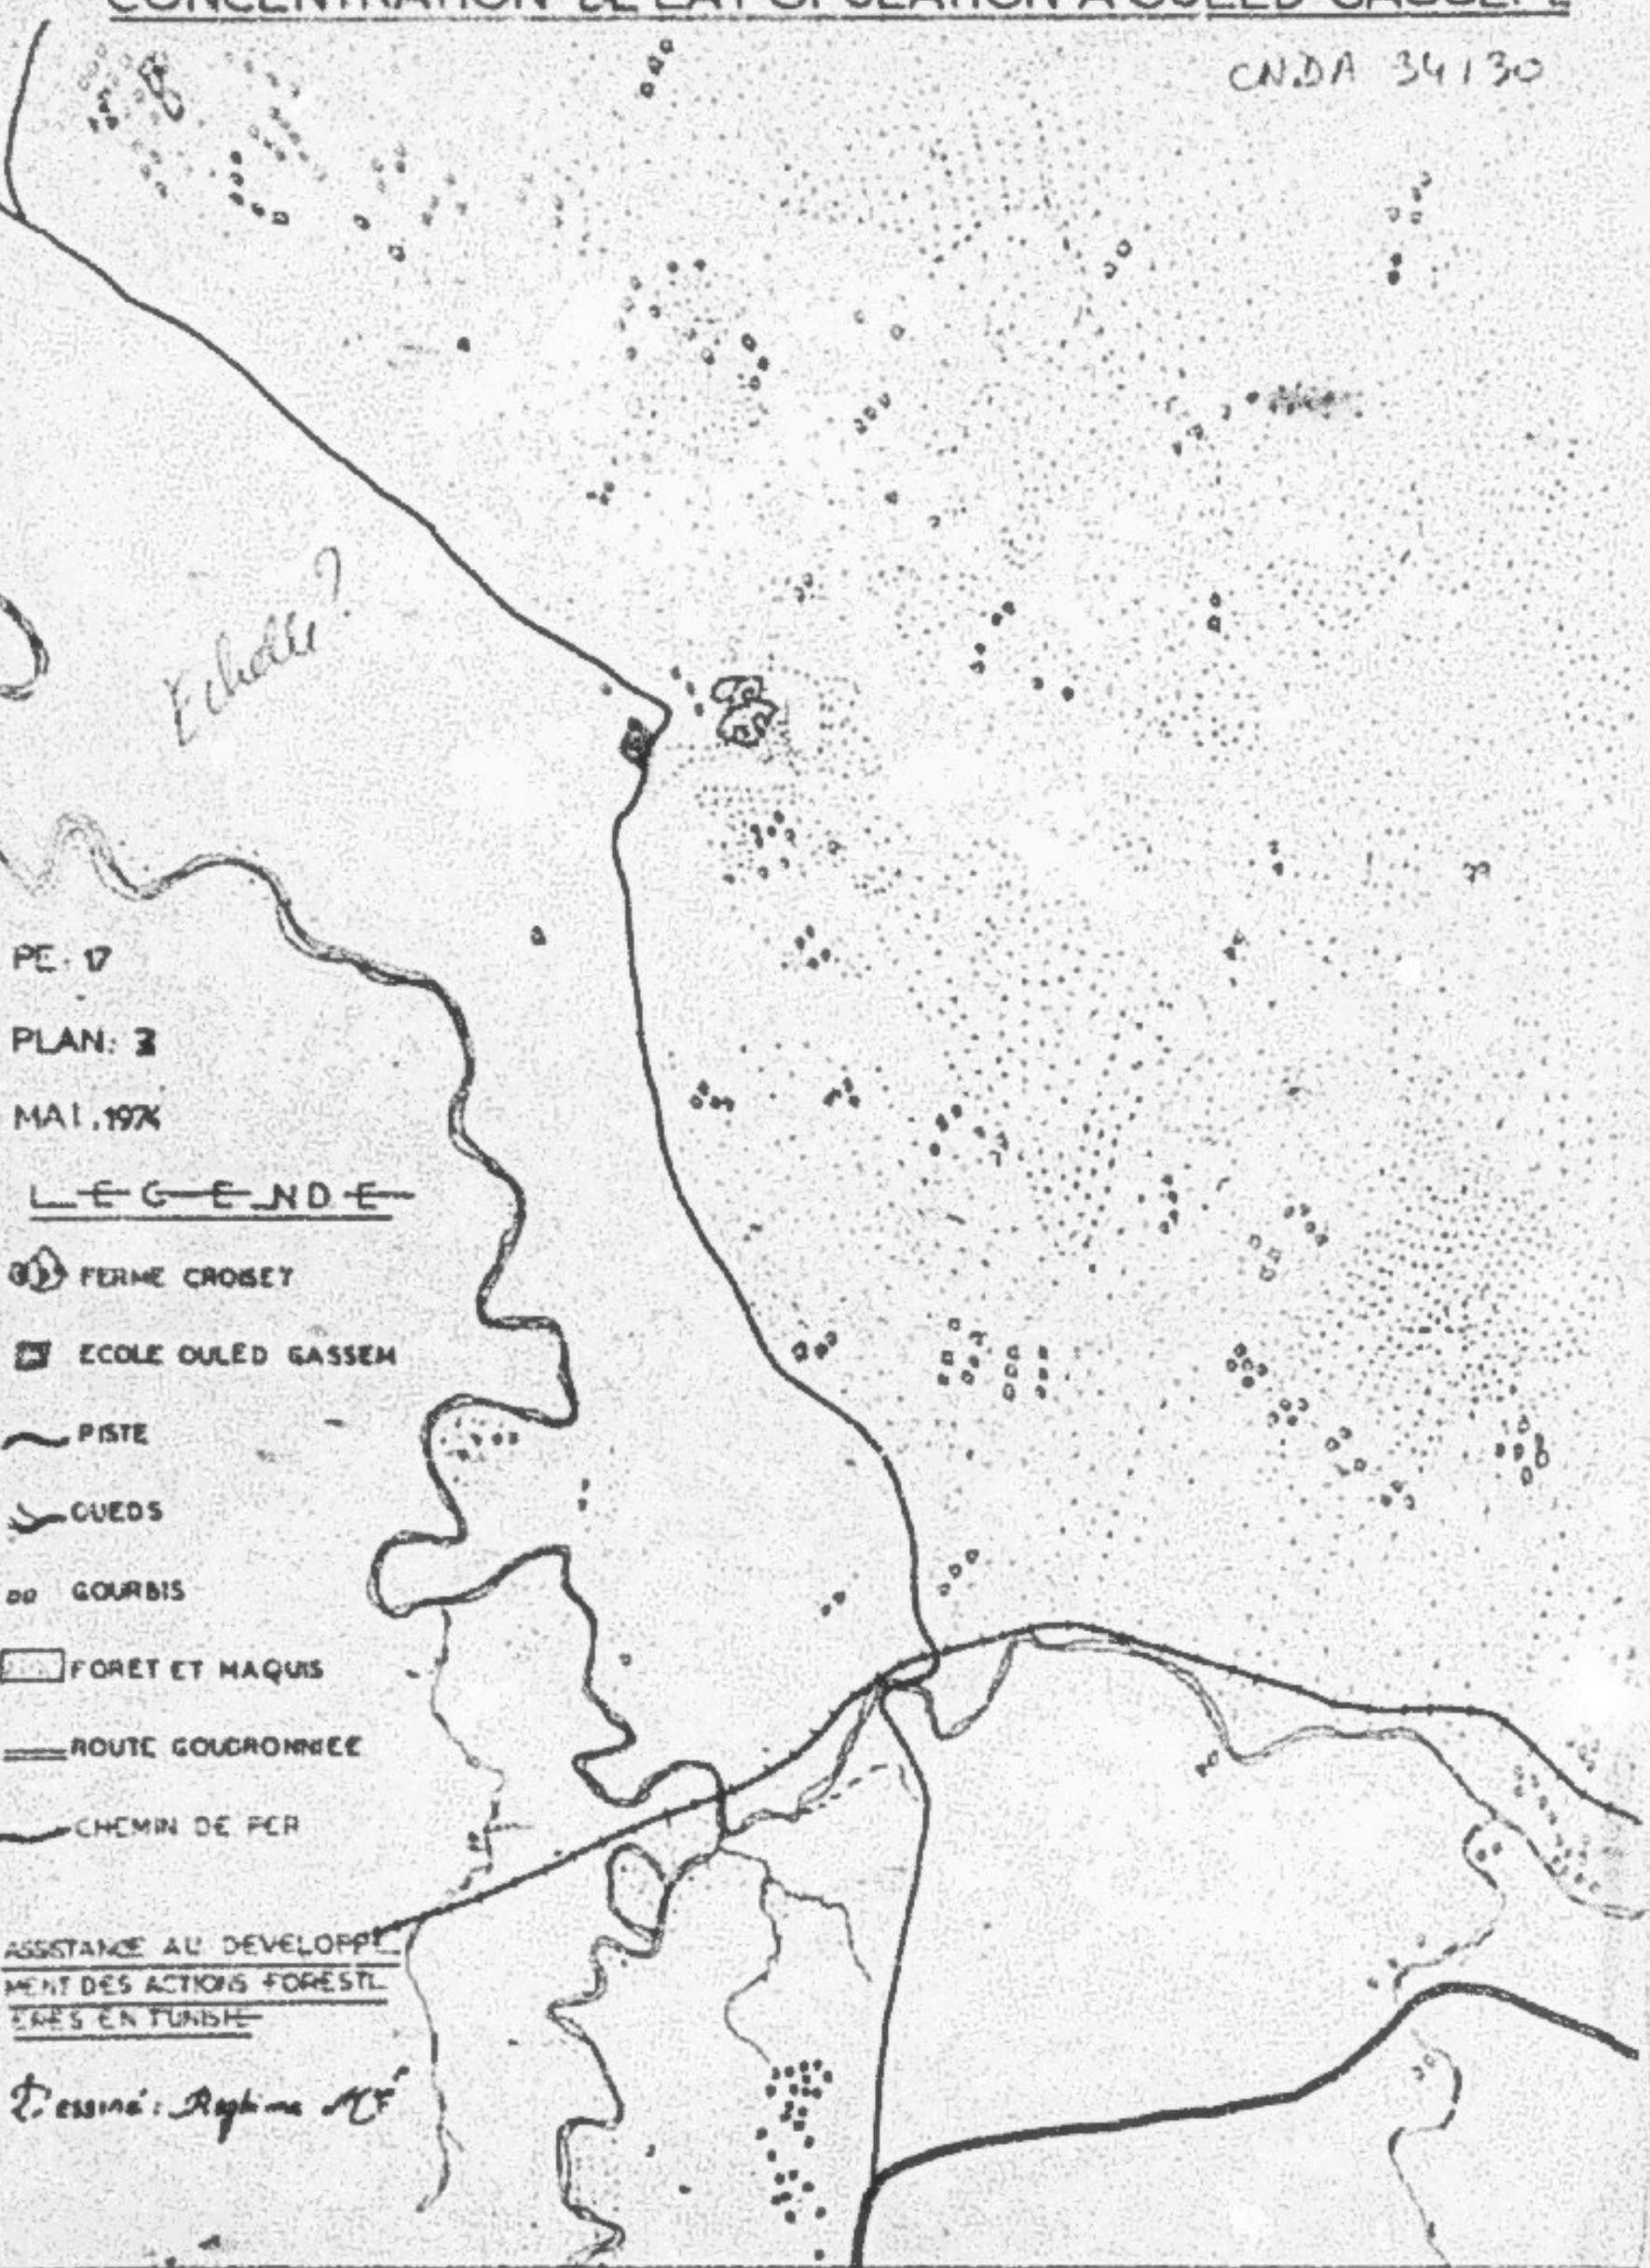


P.E. 15-17

PLAN.2

ECHELLE: 1/5000

Section sociologie

## SCHEMA D'UN DOUAR AMENAGE

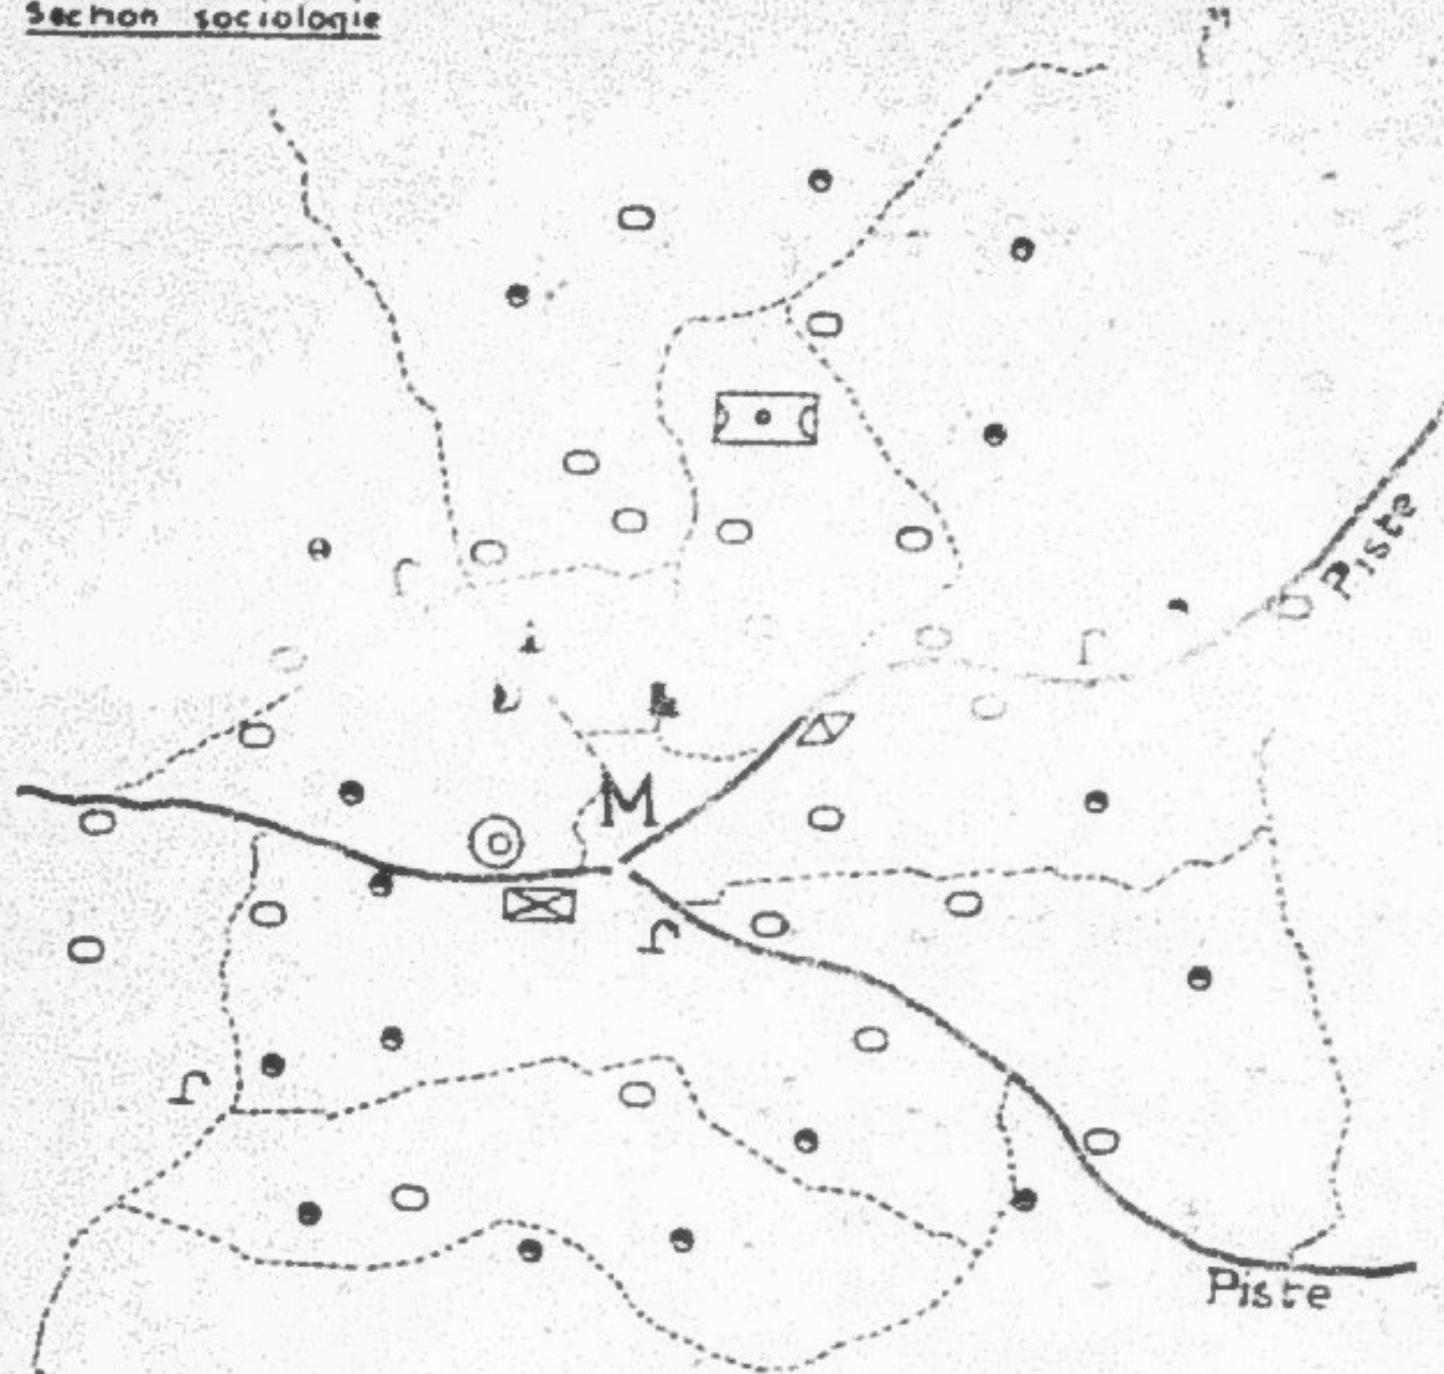

### LEGENDE

— PISTE	— HANGAR / ATELIER DE MACONNERIE
— SENTIER	
— POINT D'EAU PUBLIQUE	DISPENSaire
● GOURBI	MAGASIN
○ MAISON EN DUR	TERRAIN DE SPORT
■ ECOLE	CENTRE DE TISSAGE
△ MINUISERIE / FORGE	SALLE DE REUNION

REPUBLIQUE TOUBASSIERE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE


SERVICE DES ETUDES FORESTIERES

DIRECTION DES FORETS

# SUBDIVISION FORESTIERE DE


Ouchlata I — Ouchlata II (Dunes) — Nefza I — Nefza II — Nefza III — Taboutz

Echelle: 1/50.000

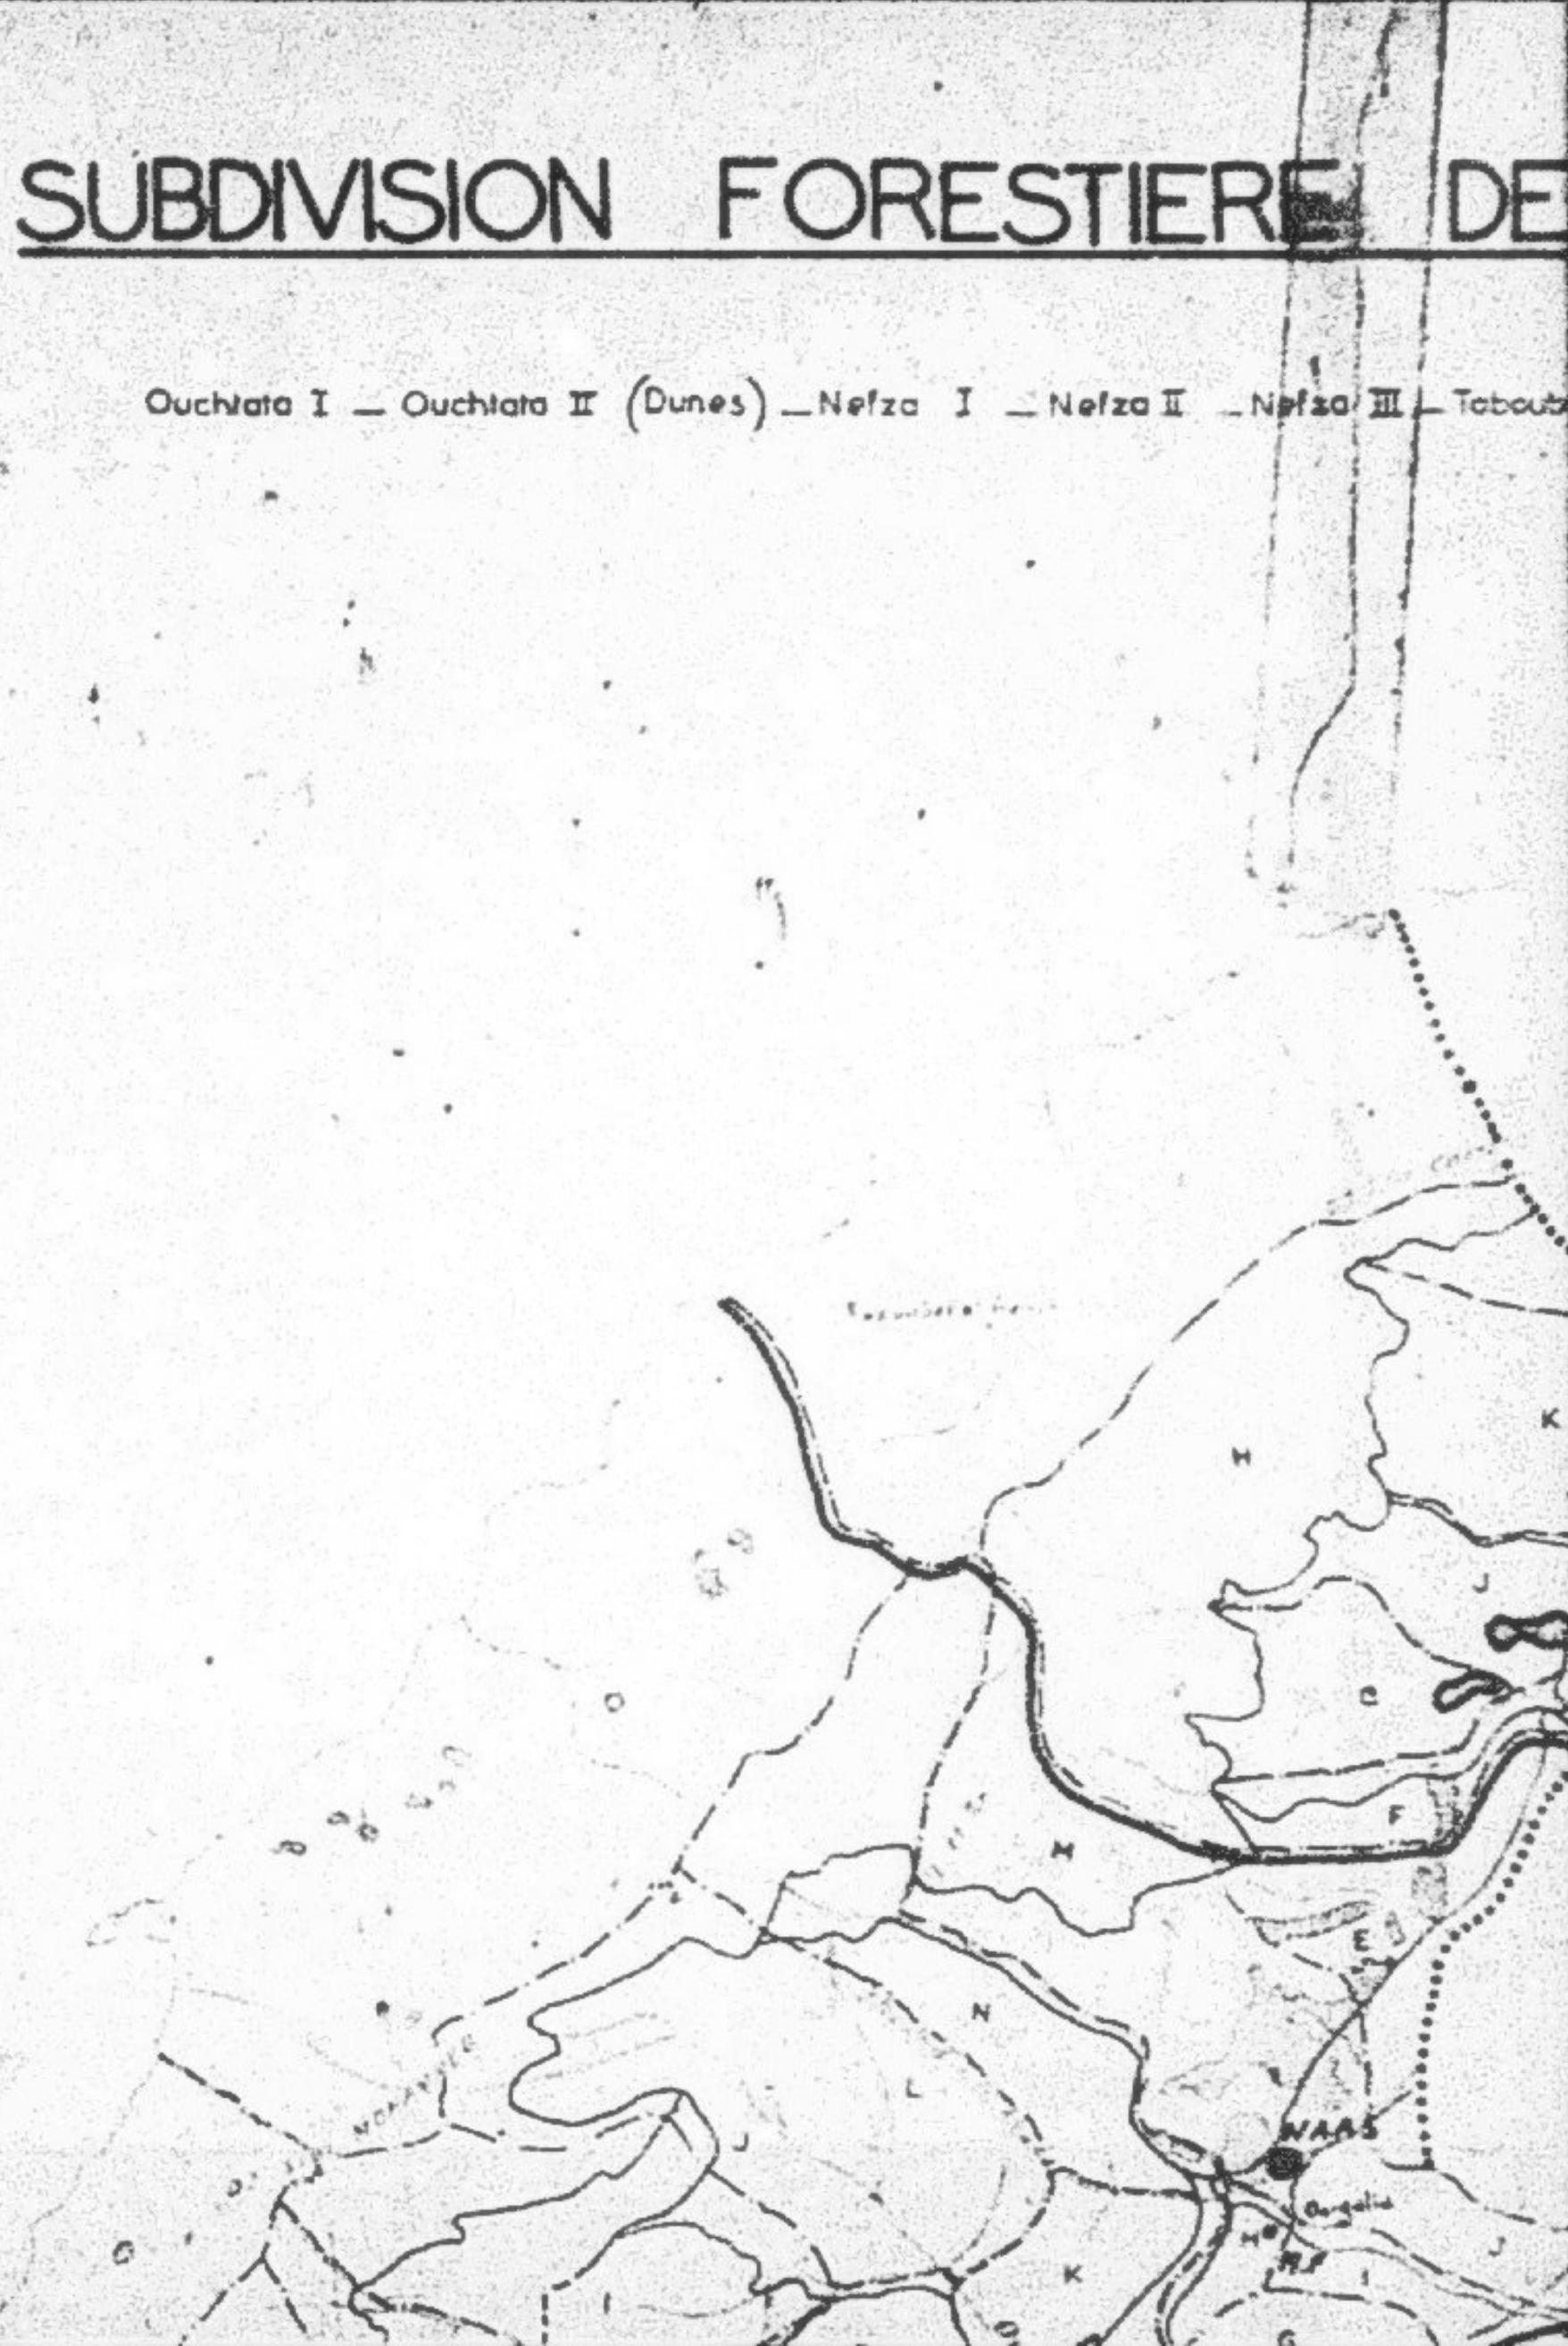


# E DE NEFZA

30 III Tabouba — Amdoun II (partie)

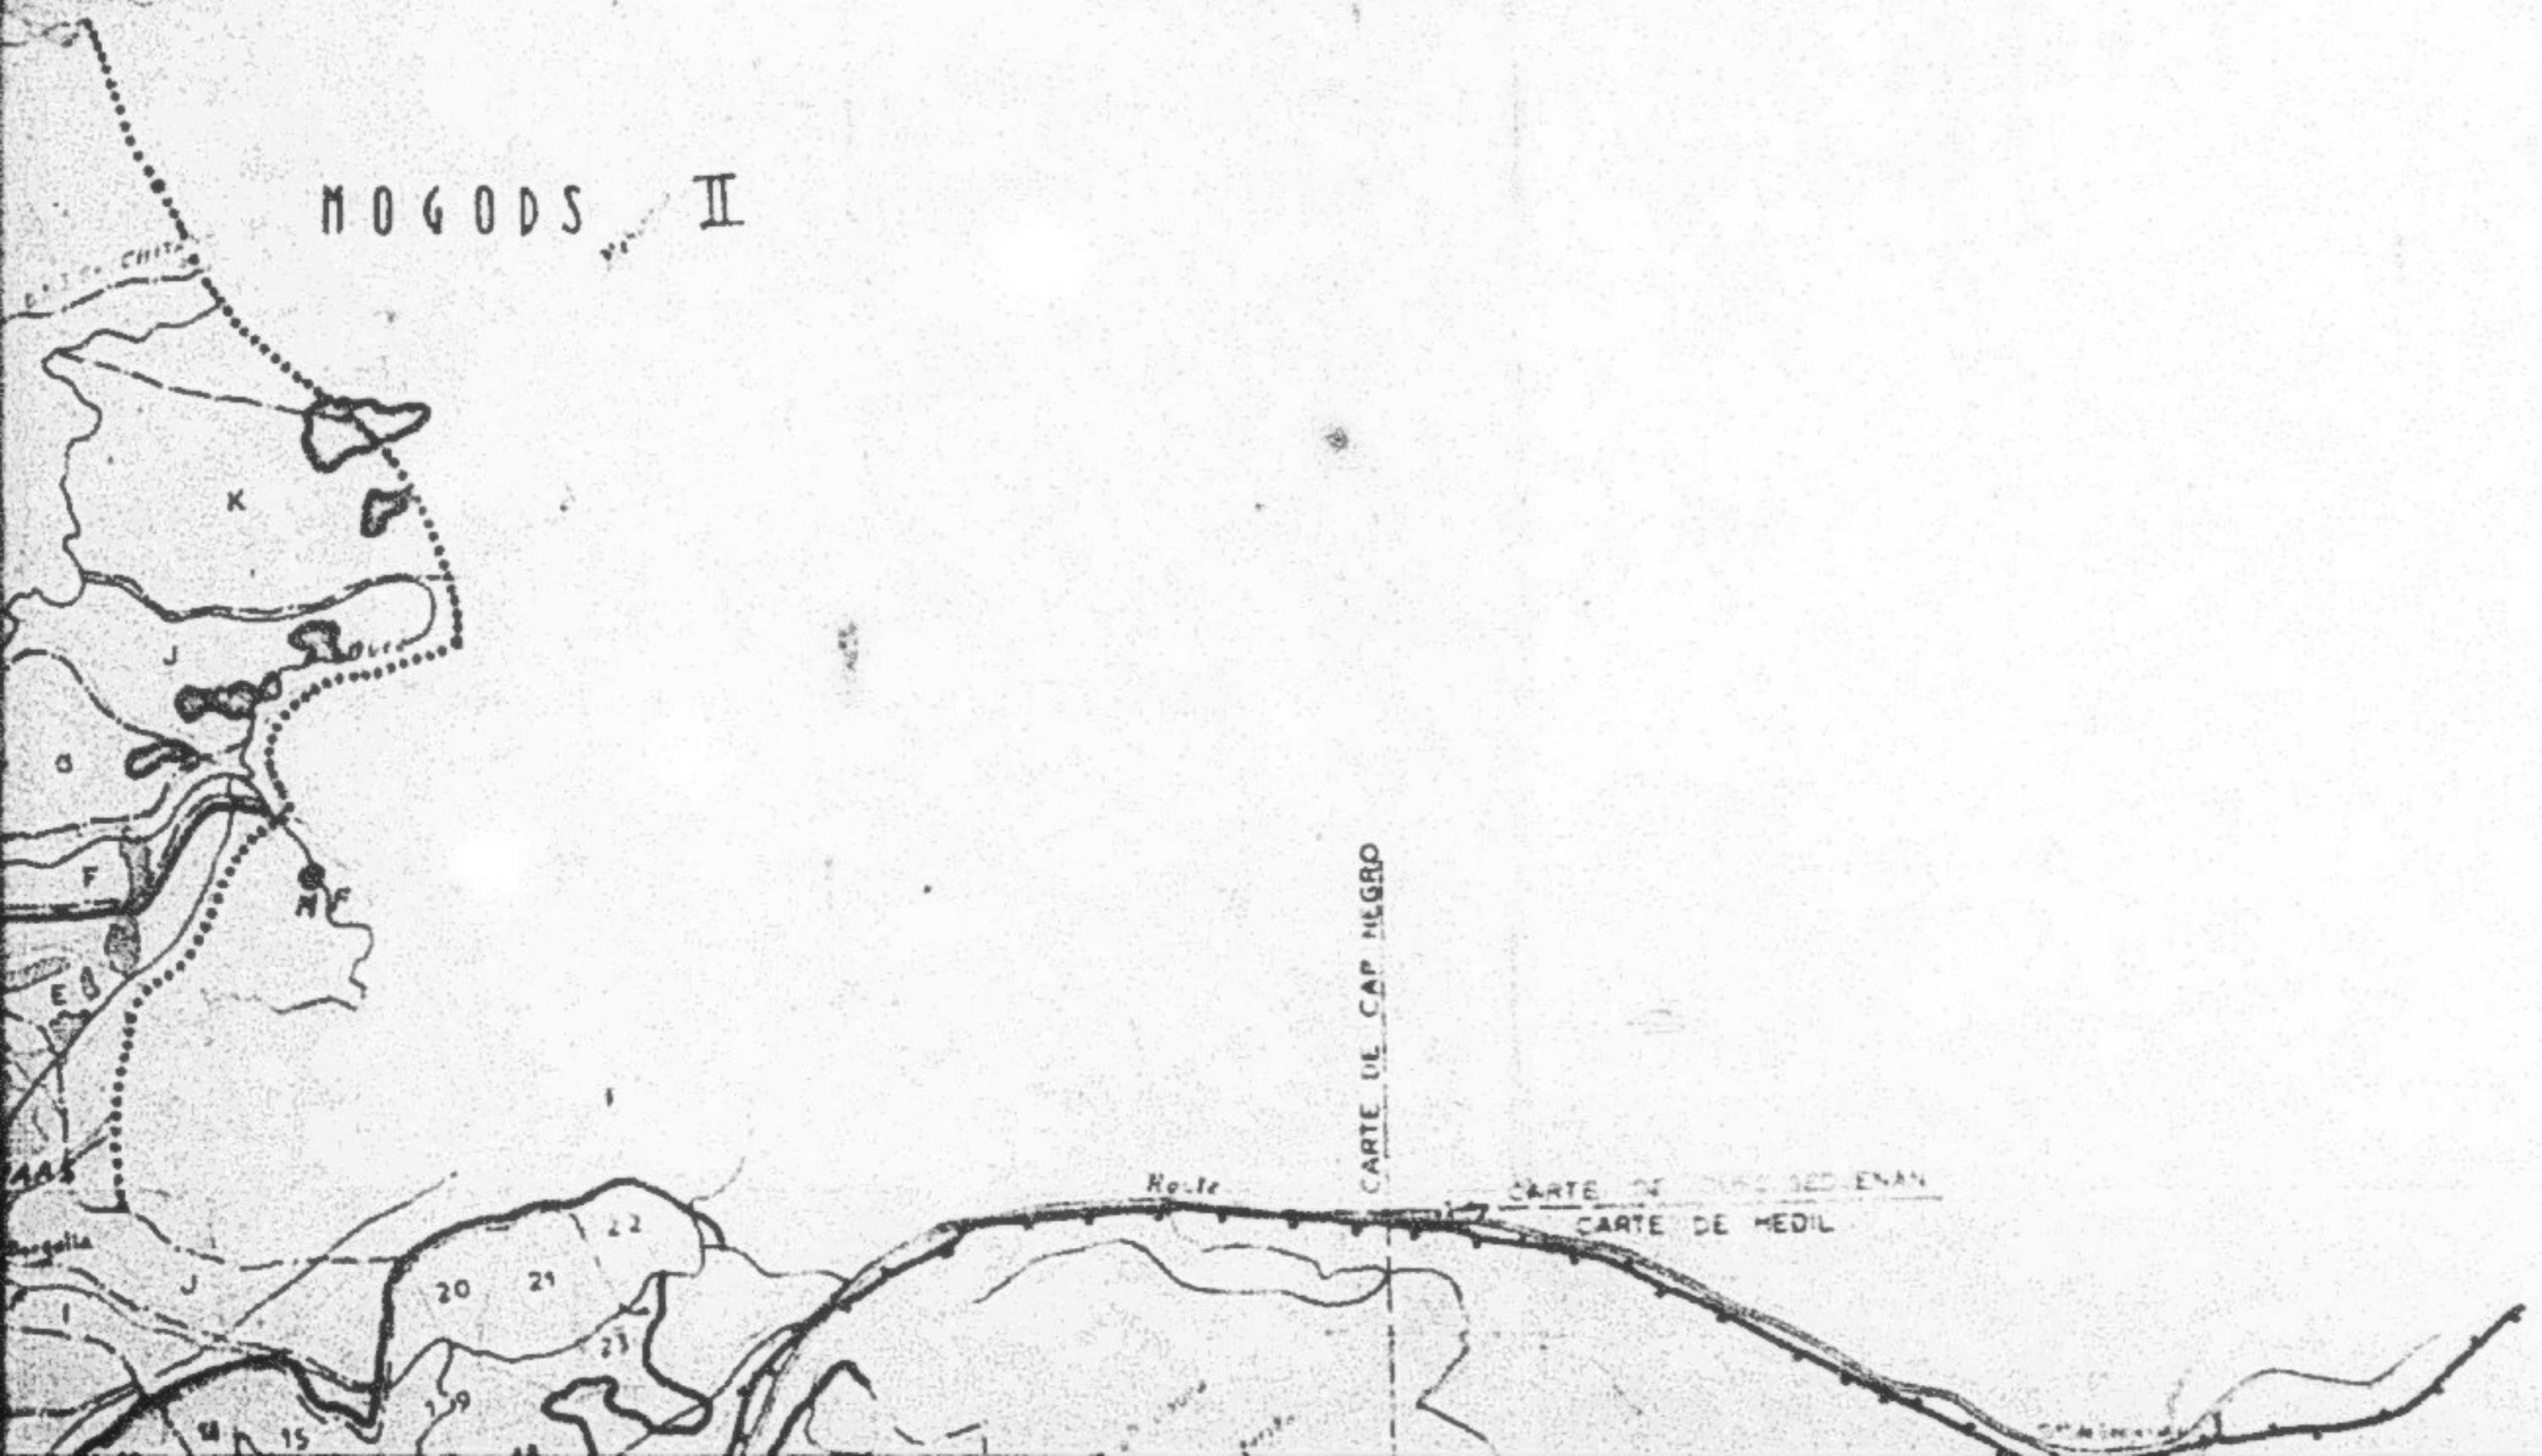

CARTE DE CAP NEGRO  
CARTE DE NEFZA

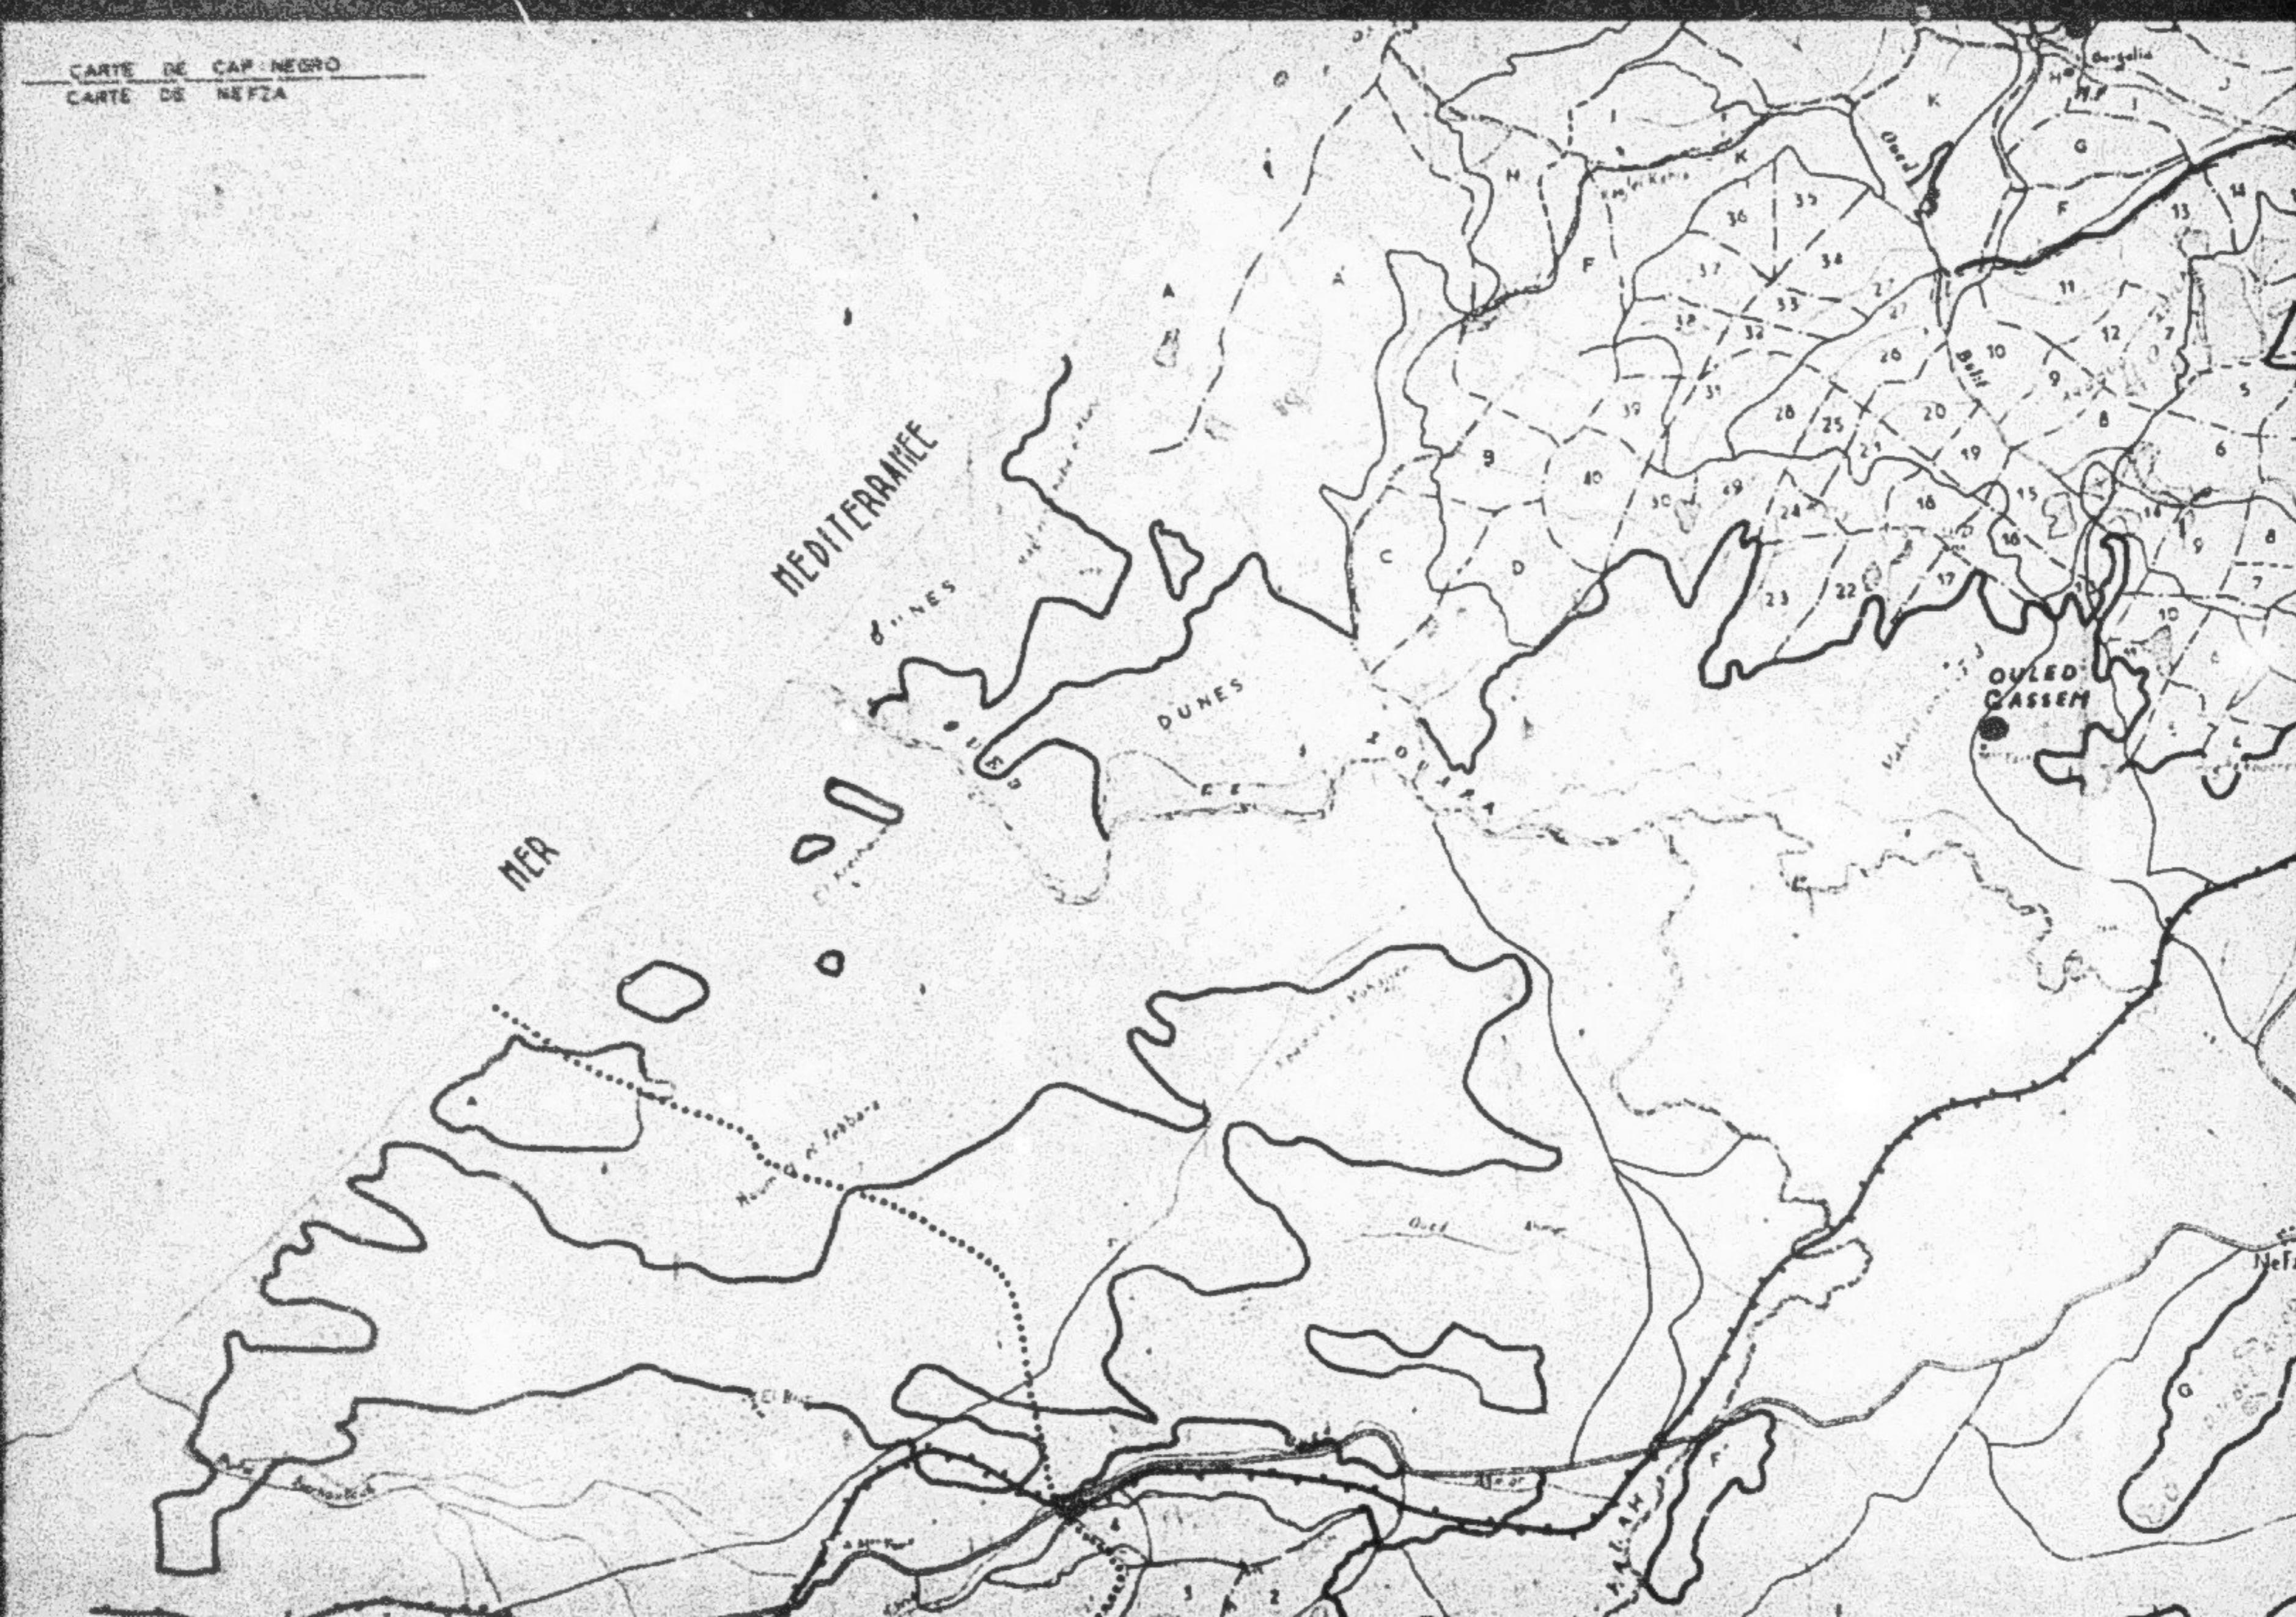

CARTE DE MÉD

## NO GODS II

~~OYLED  
GASSEN~~


MEKKA II

CARTE DE NEFZA  
CARTE DE ZAOUIET MEDEN

ANDOON I


AMDOUN II



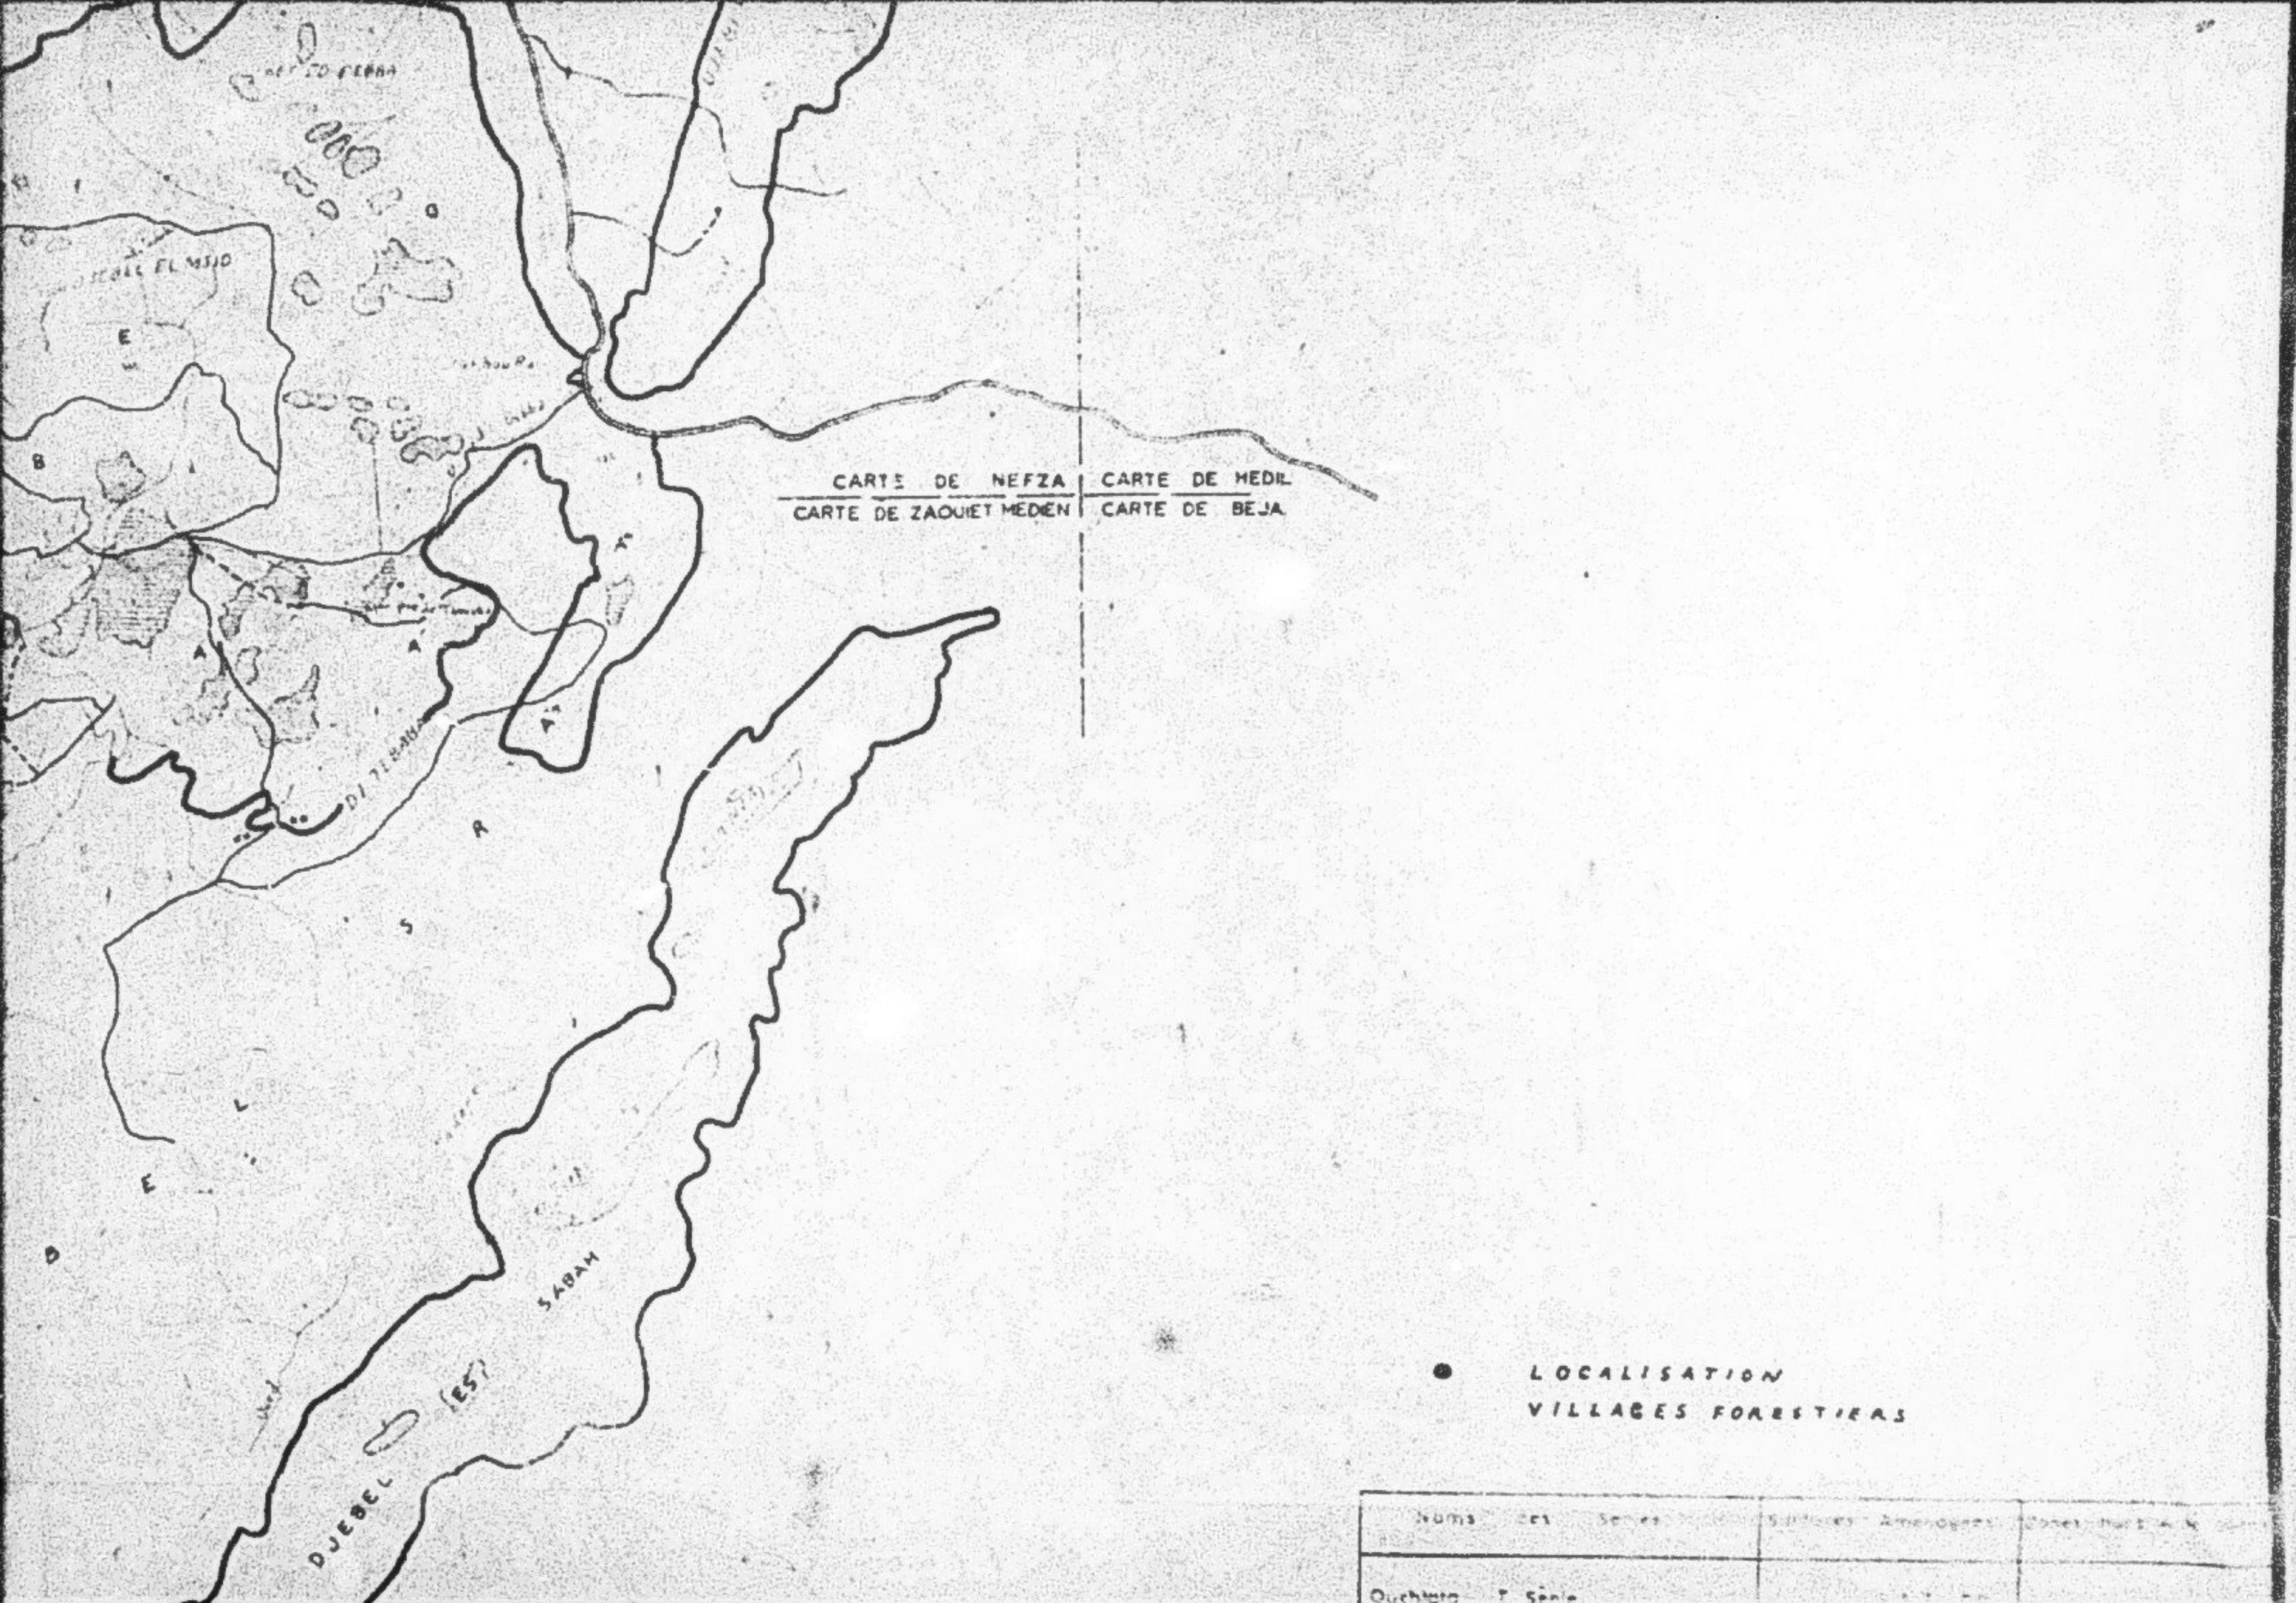

LOCALISATION  
VILLAGES FORESTIERS

NOMS DES SITES	COORDINATES	Altitudes	Aménagements	Carte
Ouchama	7 Série			

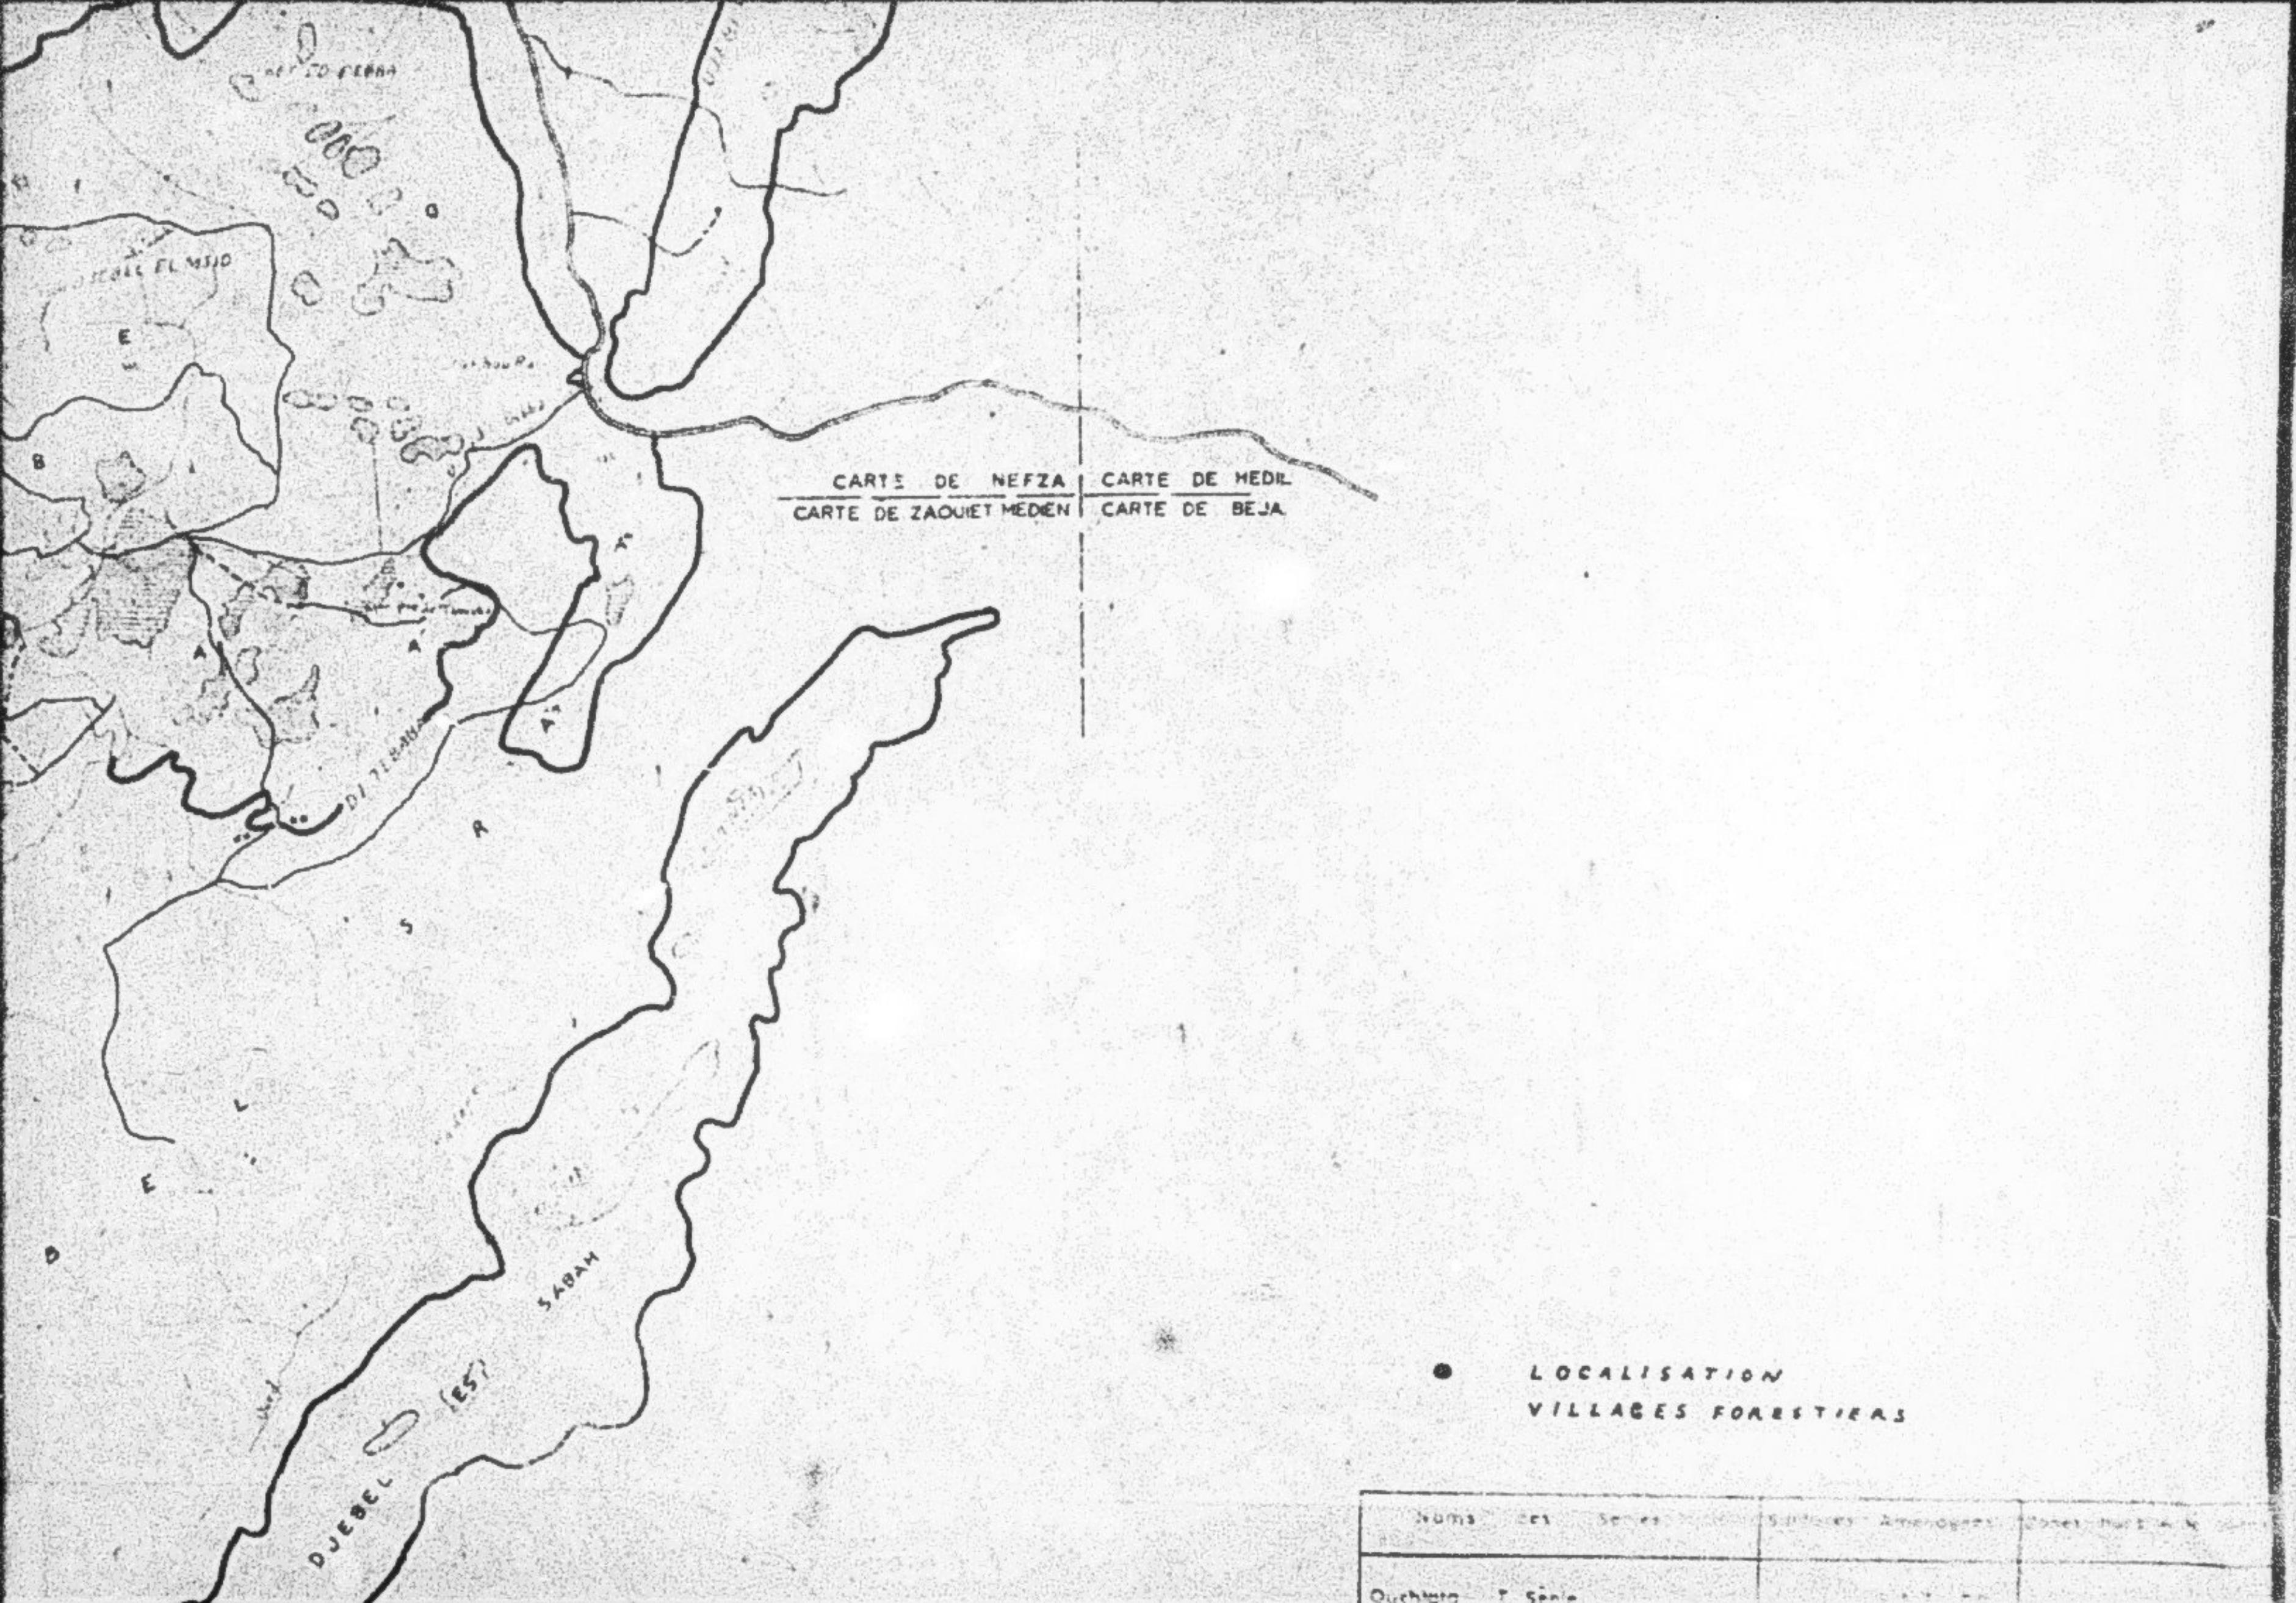


LOCALISATION  
VILLAGES FORESTIERS

NOMS DES SITES	COORDINATES	Altitudes	Aménagements	Carte
Ouchama	7 Série			

AMDOUM II

AMDOUM I

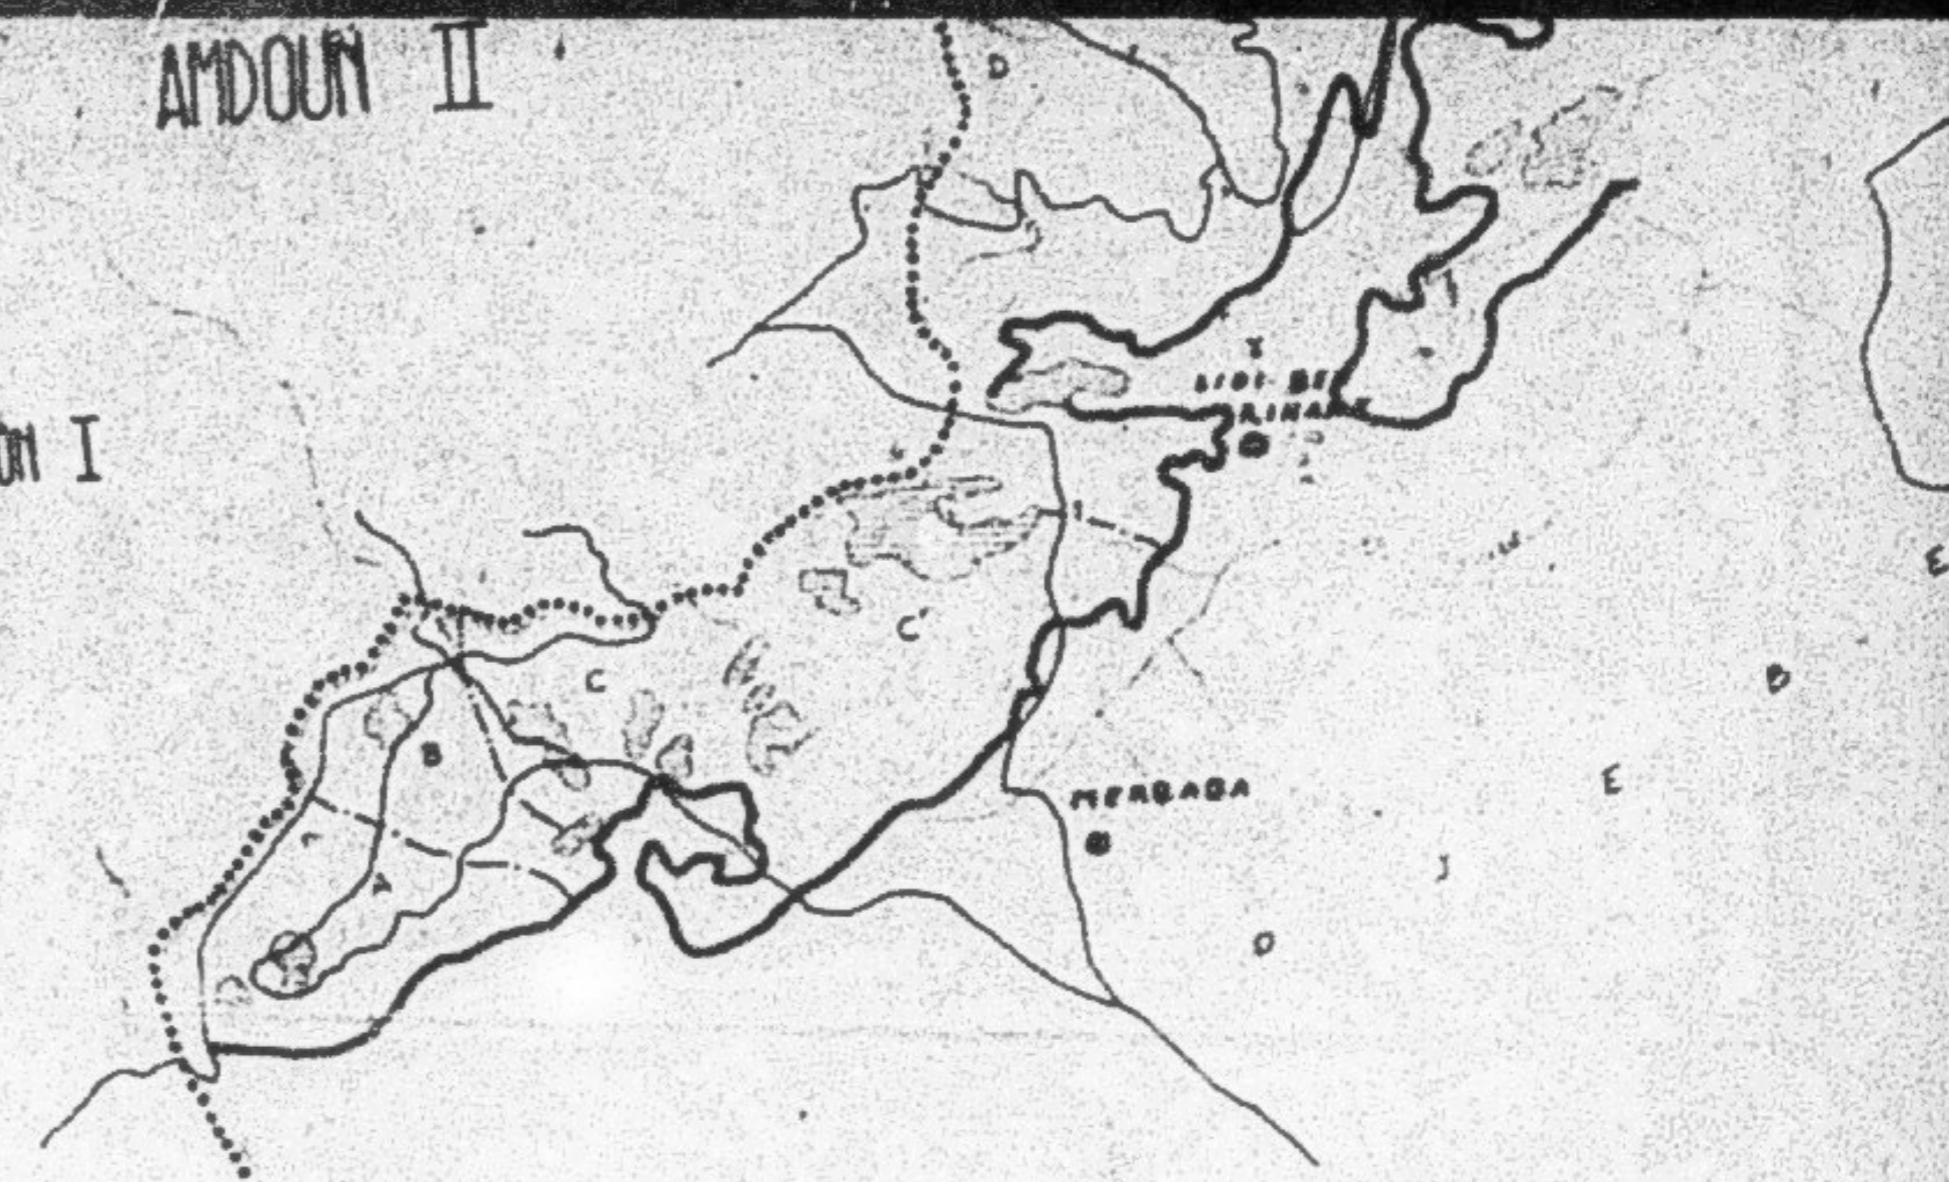

LEGENDE

- ROUTE
- PISTE
- SENTIER
- LAYON
- OUED
- VOIE FEREE
- ... LIMITE DE GOUVERNORAT
- LIMITES FORET ET SERIE
- DUNES
- CLAINIERE



LOCALISATION  
VILLAGES FORESTIERS


NOMS DES VILLAGES	LEADER	COORDONNÉES
Ouchtors I Serie		
Ouchtors II Serie "Tunes"		
Nefza I Serie		
Nefza II Serie		
Nefza III Serie		
Tadoubs		
ATIDOUR II Serie "Korche"		
<b>TOTAL</b>		

Voilà quelques villages forestiers que j'ai trouvés  
dans le territoire des Elantes forestières

TAIER CHOLAB


*(Signature)*


*C. L.*

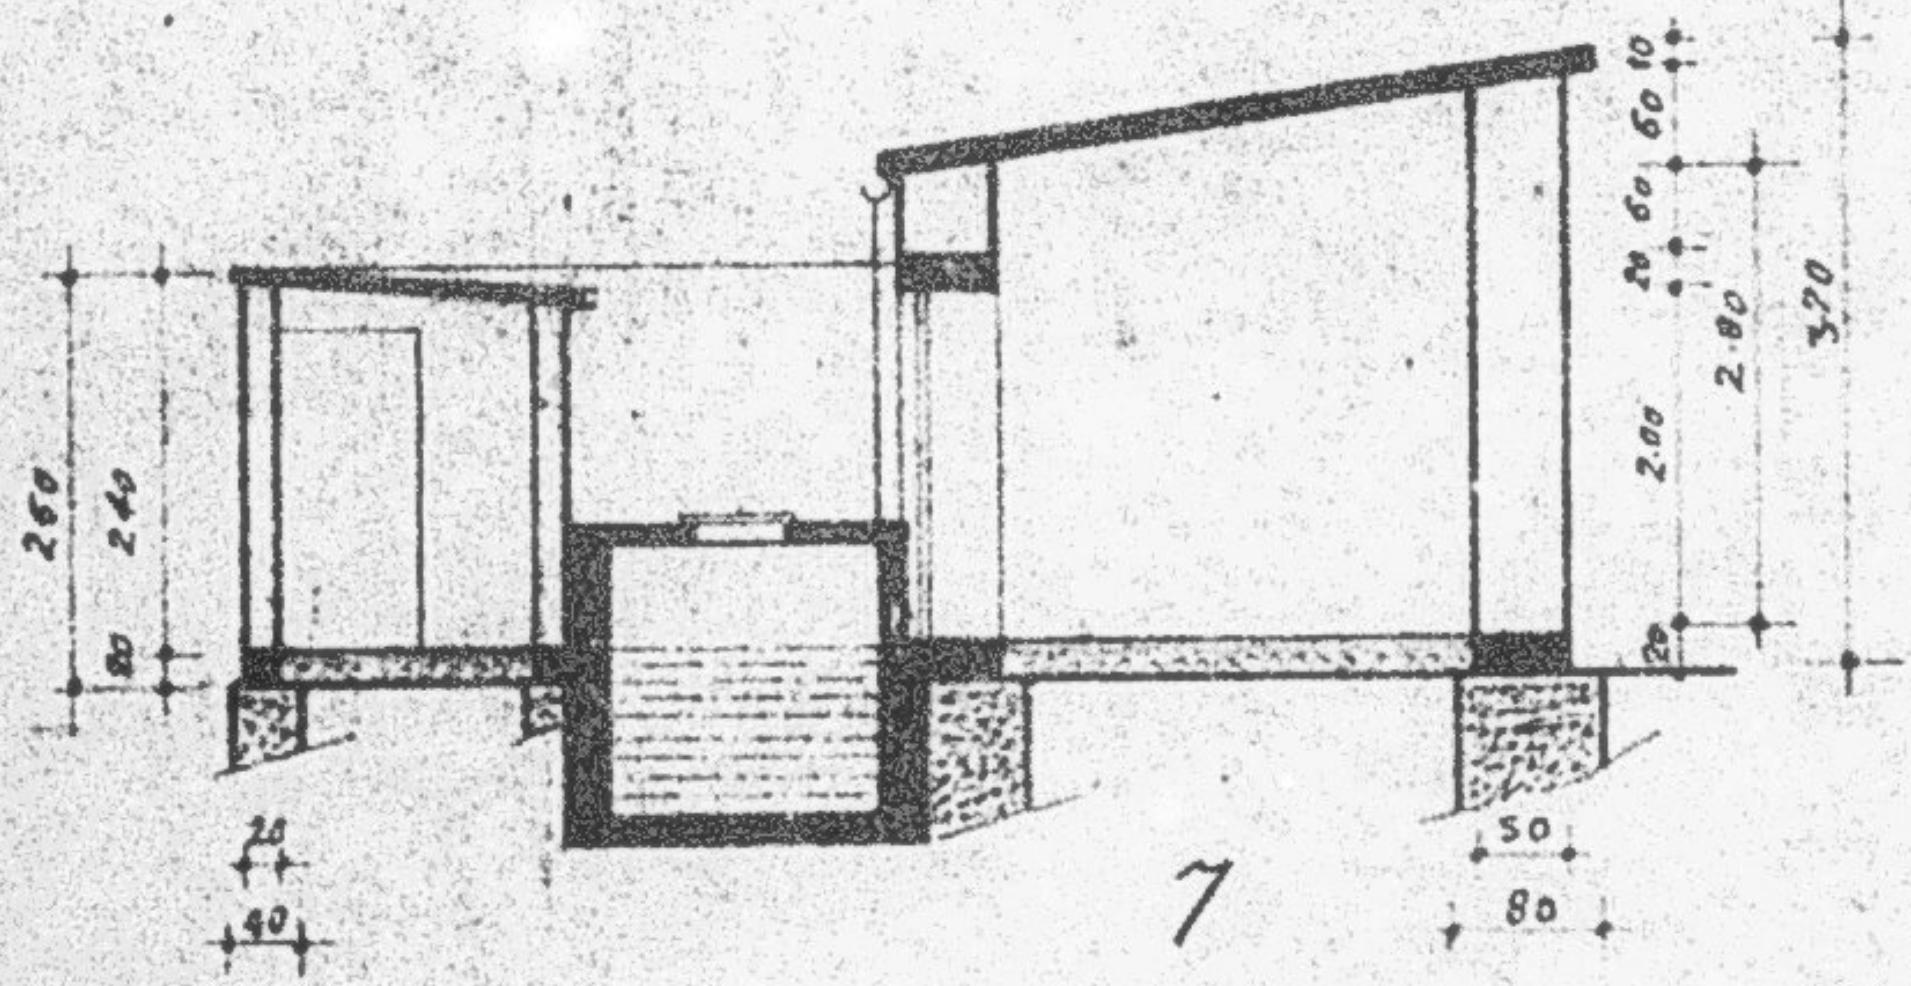


COUPE AA.

Variante (I) à demi dalle inclinées:

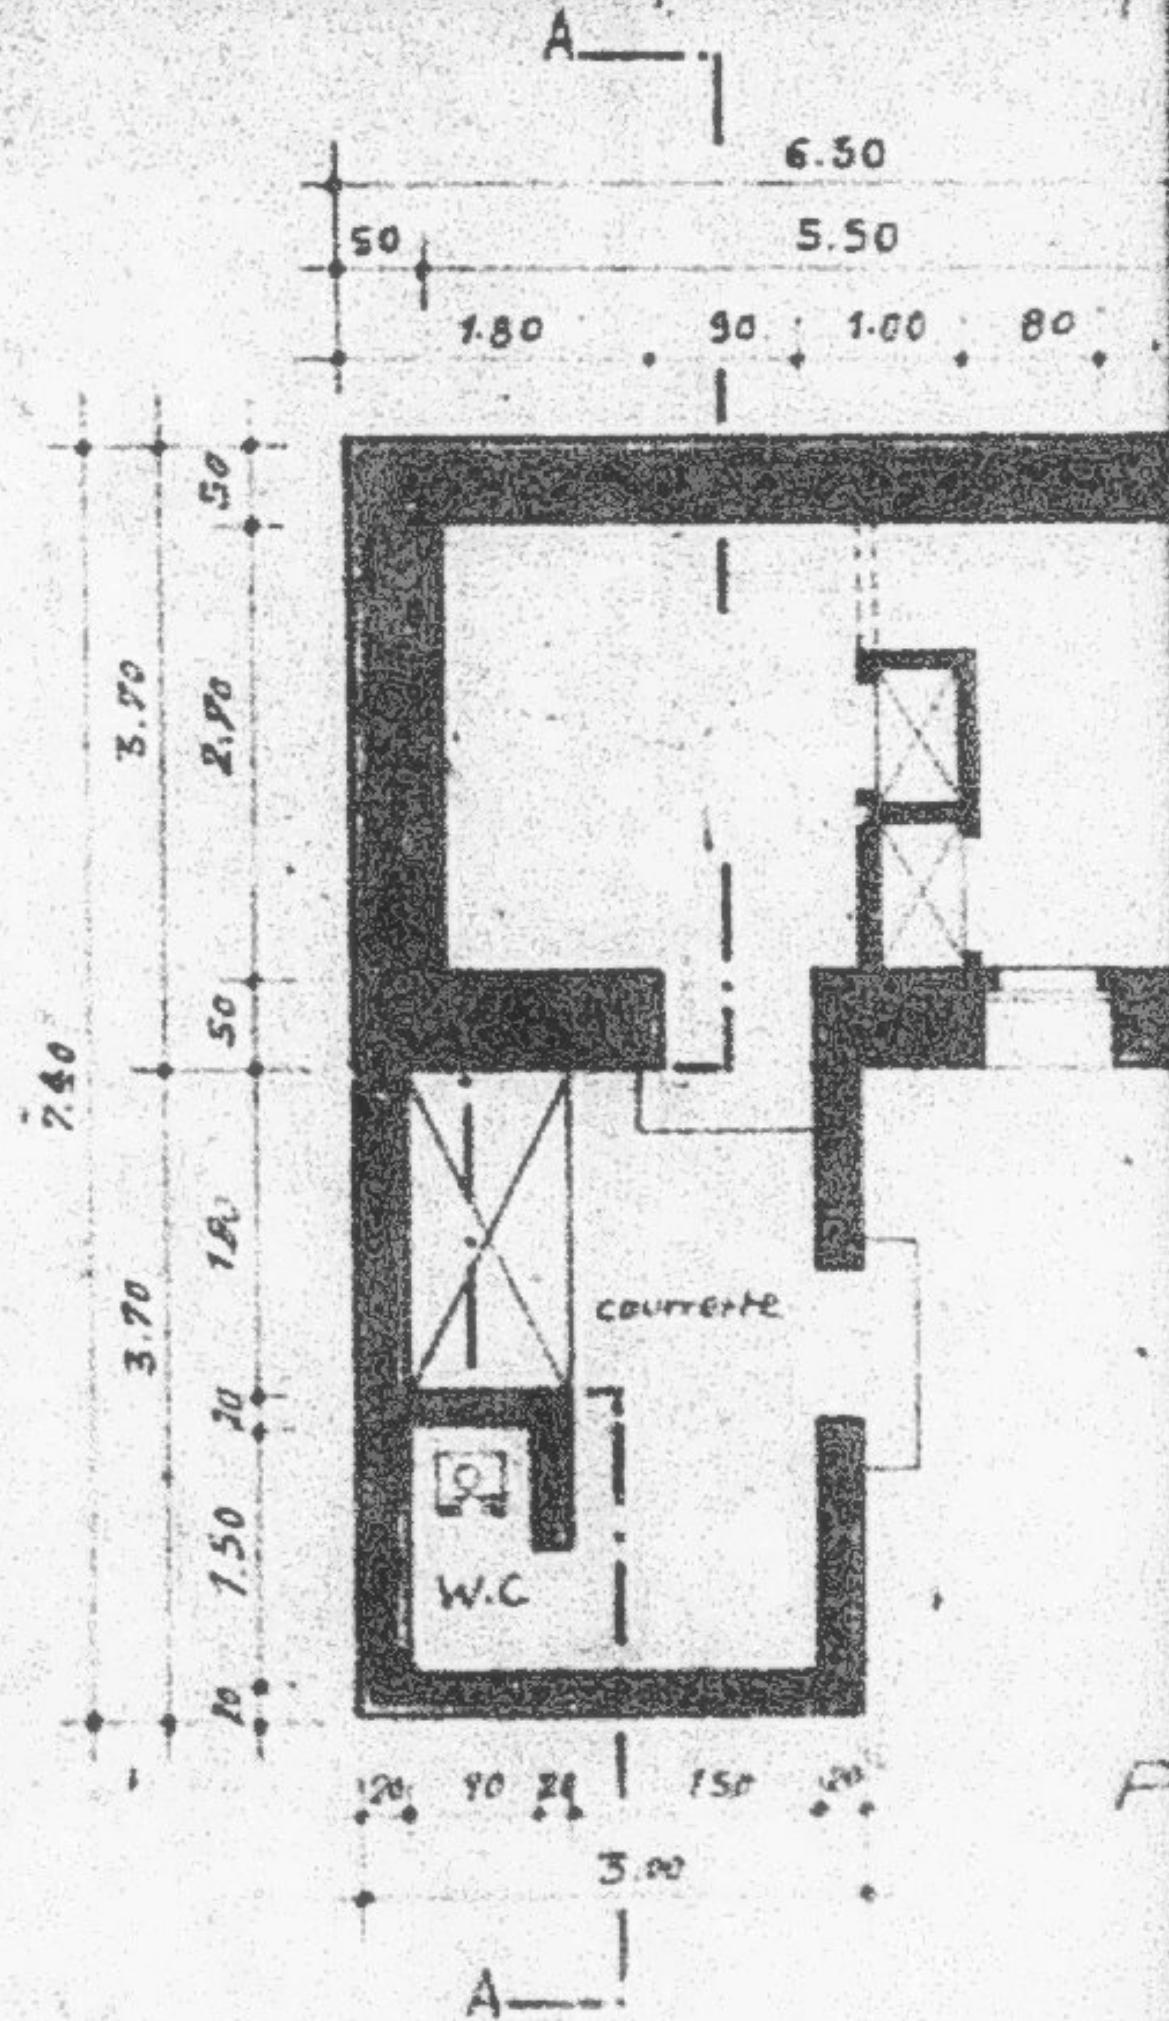

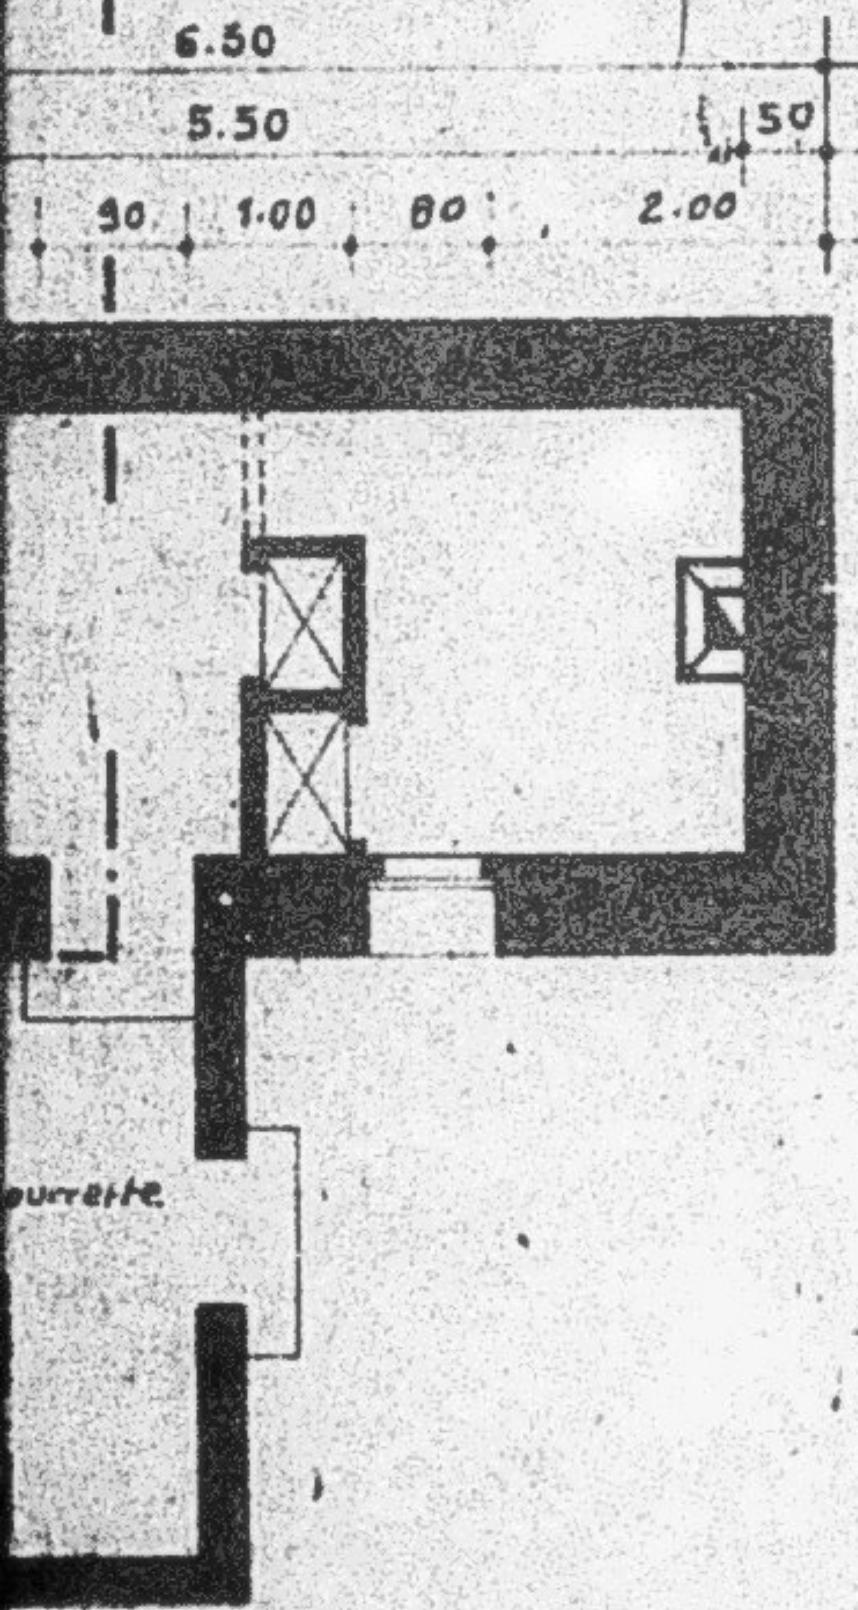


PLAN

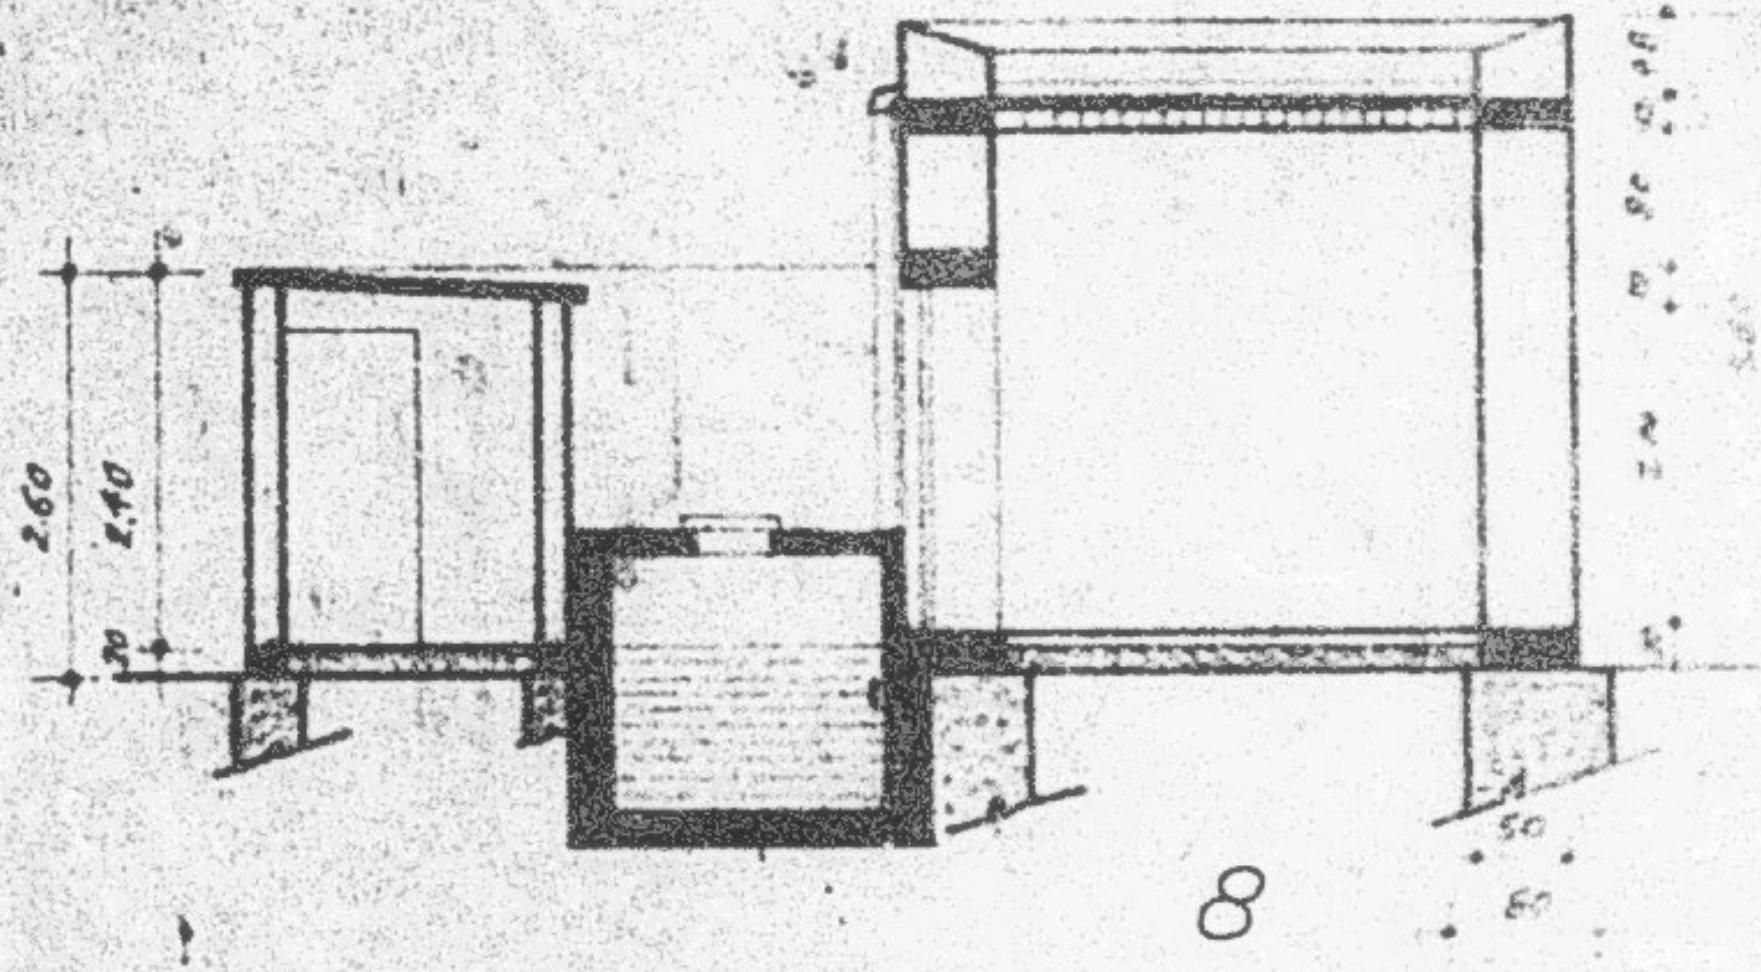



COUPE AA

Variante III. Durante la linea orizzontale.


ANDA 24130

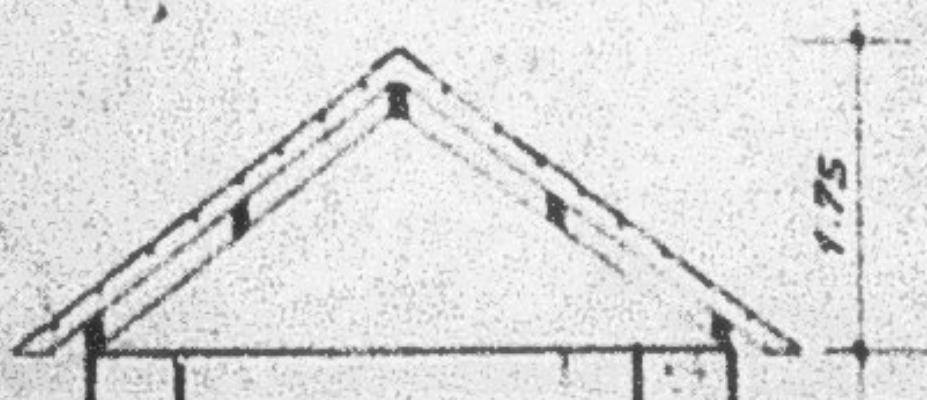

Variant(I) : demi dalle inclinées:

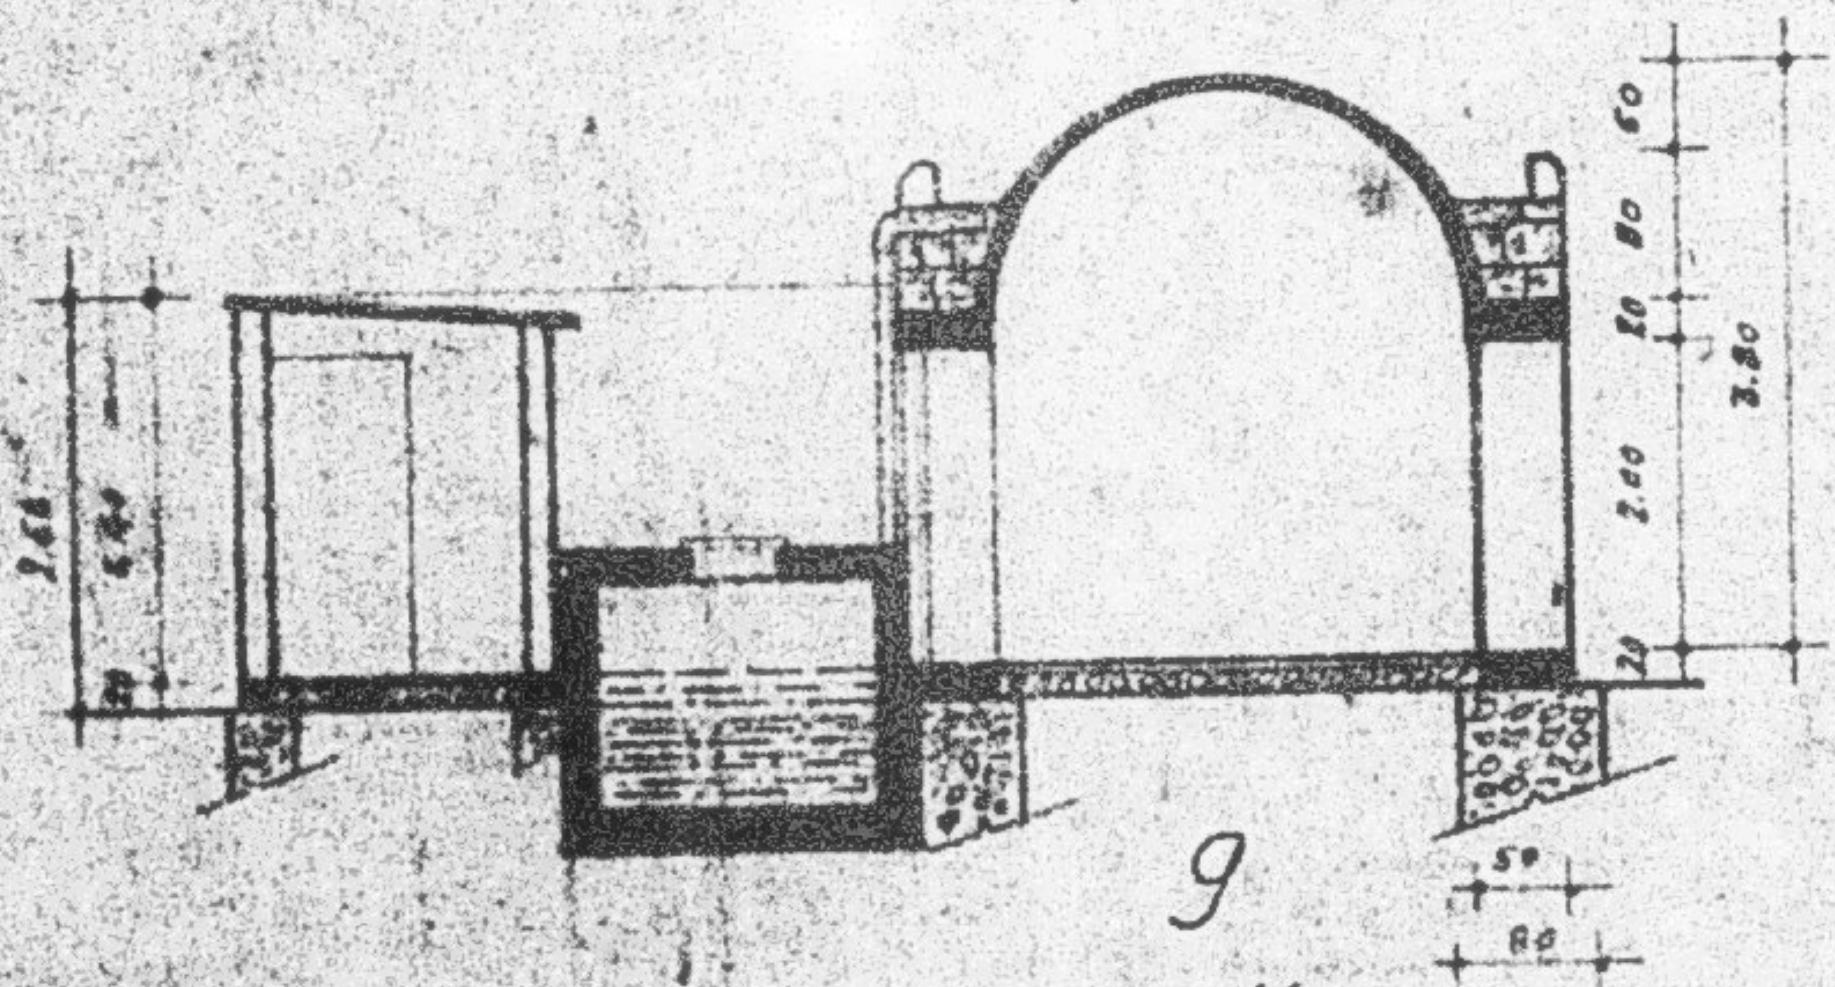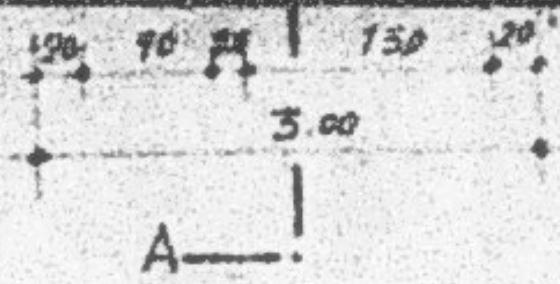

COUPE AA  
Variante (II) - Voûte.

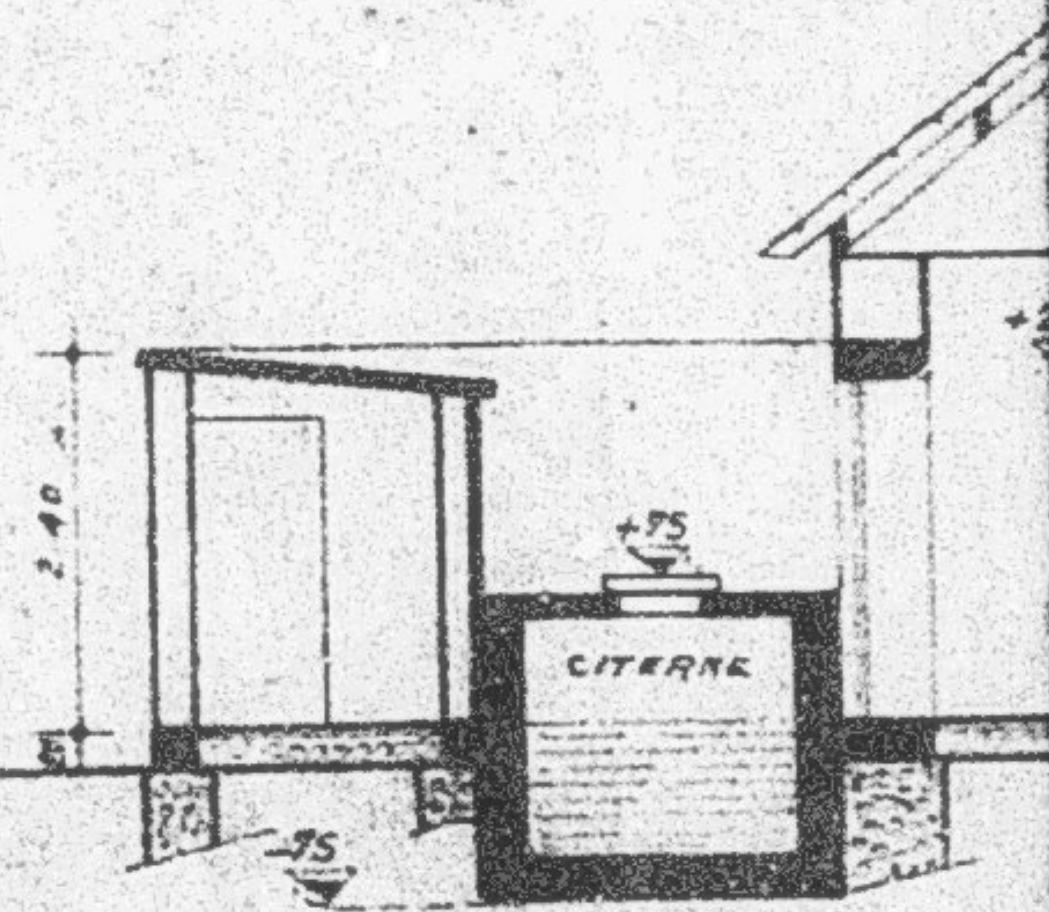


COUPE  
Variante (II)

PLAN


Variante(II)-Demi dalle horizontale.

ENDA 34130

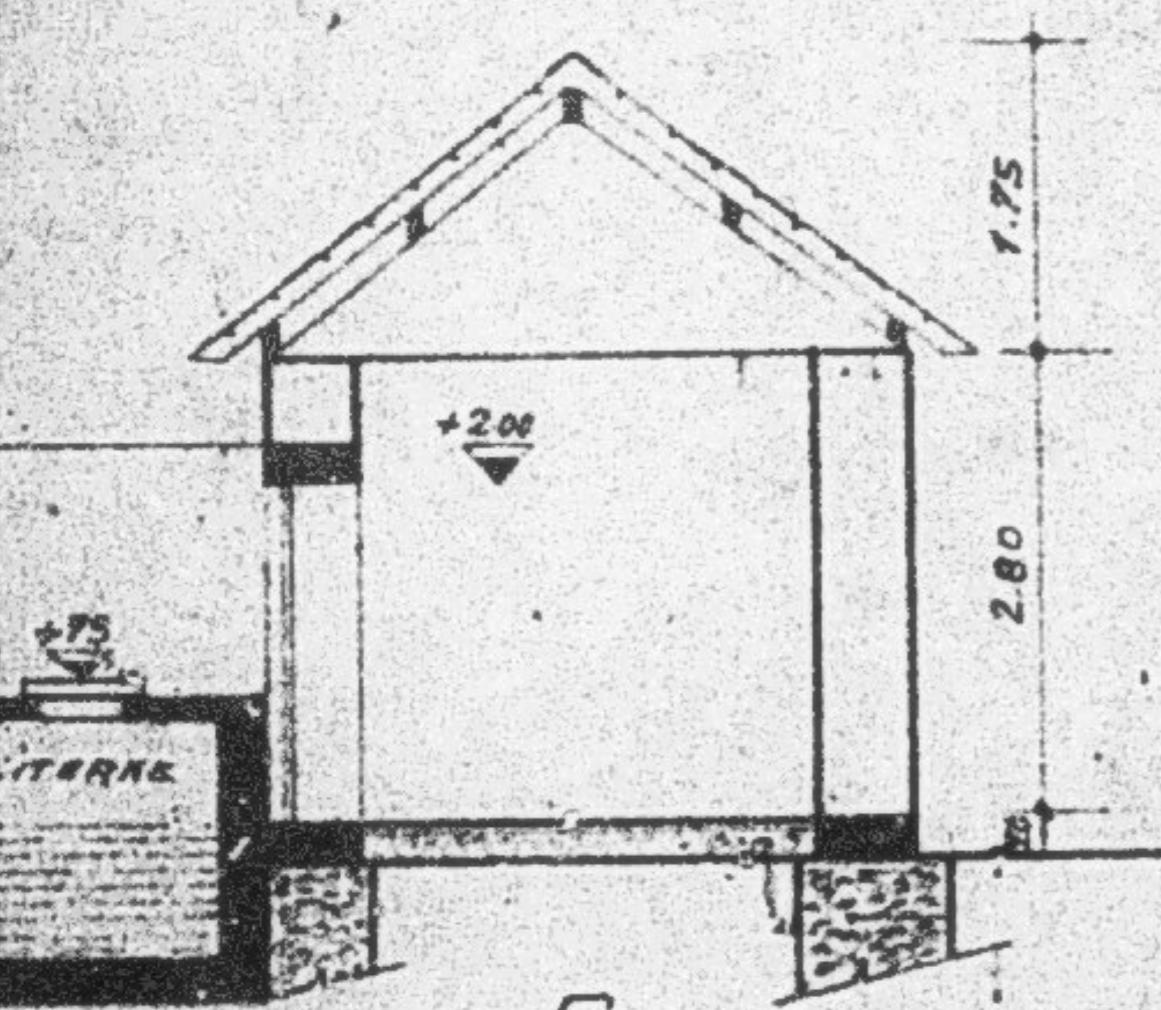

COUPE AA

Variante(IV)-TOILE

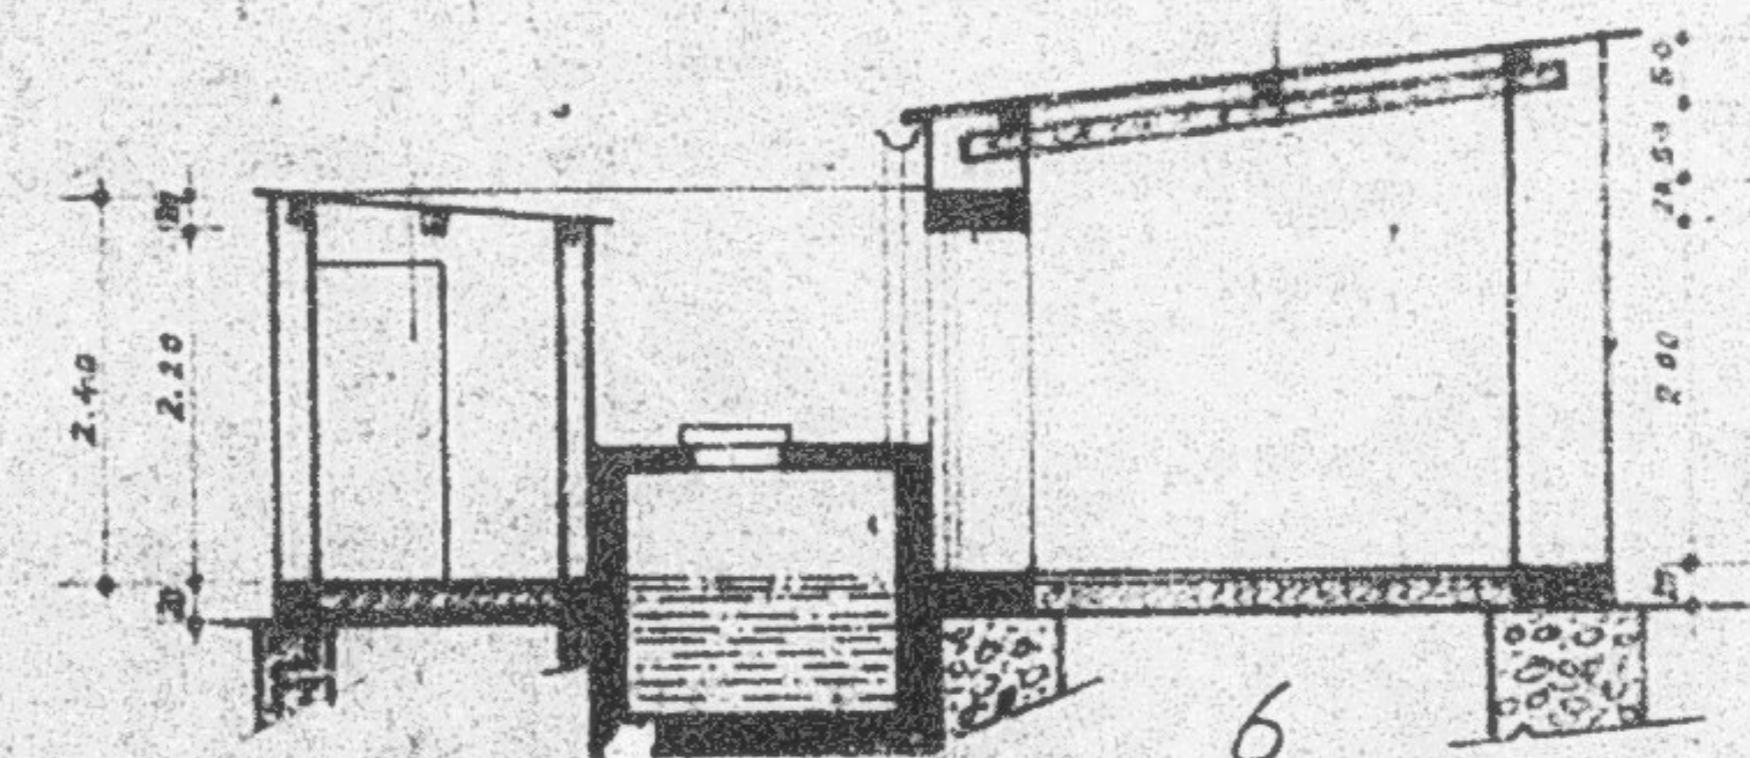

COUPE AA

Variante(V)-Toile

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET : FAO/SIDA  
TF-TUN-5-SWE

Assistance au développement  
des activités forestières en Tunisie

PROGRAMME: VILLAGES FORESTIERS

SUITE EN

F

2



MICROFICHE N°

34130

Agence Nationale de la Documentation

DÉPARTEMENT DE LA DOCUMENTATION

AGENCE NATIONALE DE

DOCUMENTATION


FLAMME

(الجنة تونسية الوطنية  
وزارة العدل


المركز القومى  
للتوصيق الفنى  
تونس

F 2


## **FAÇADE PRINCIPALE**

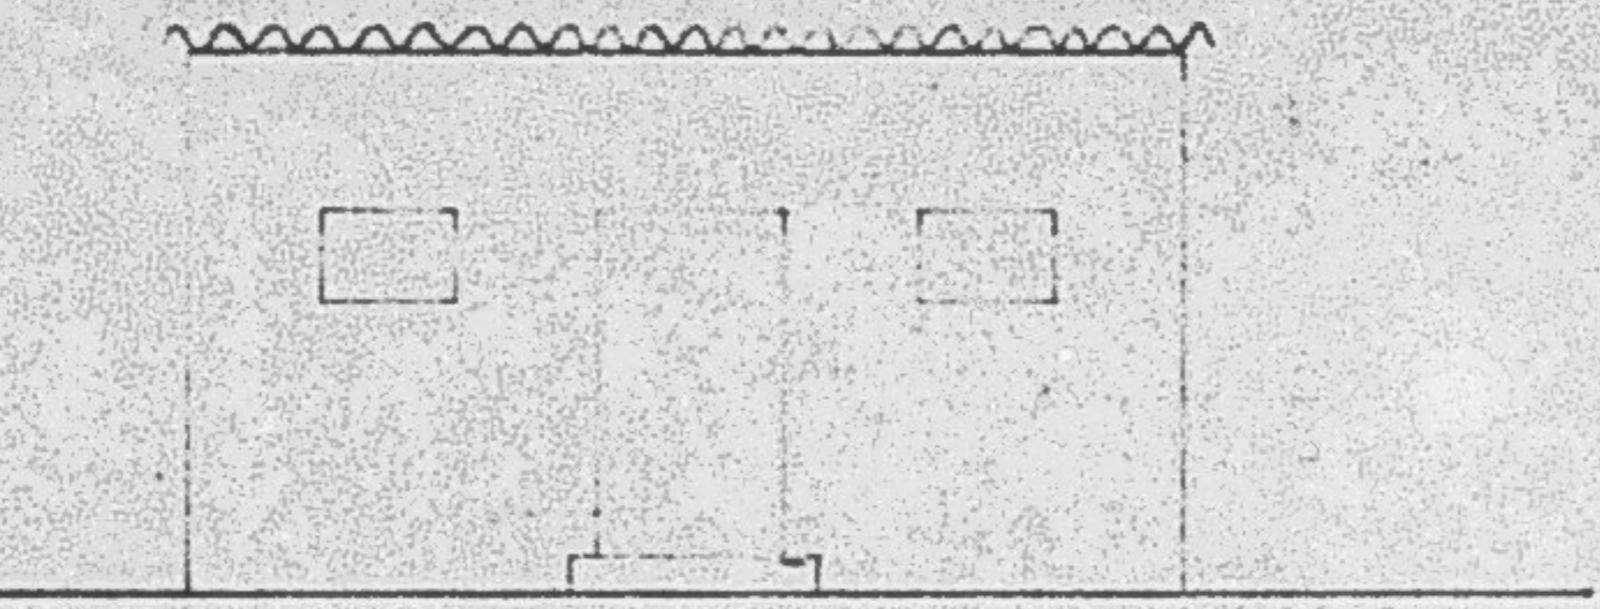


**COUPE .AA.**

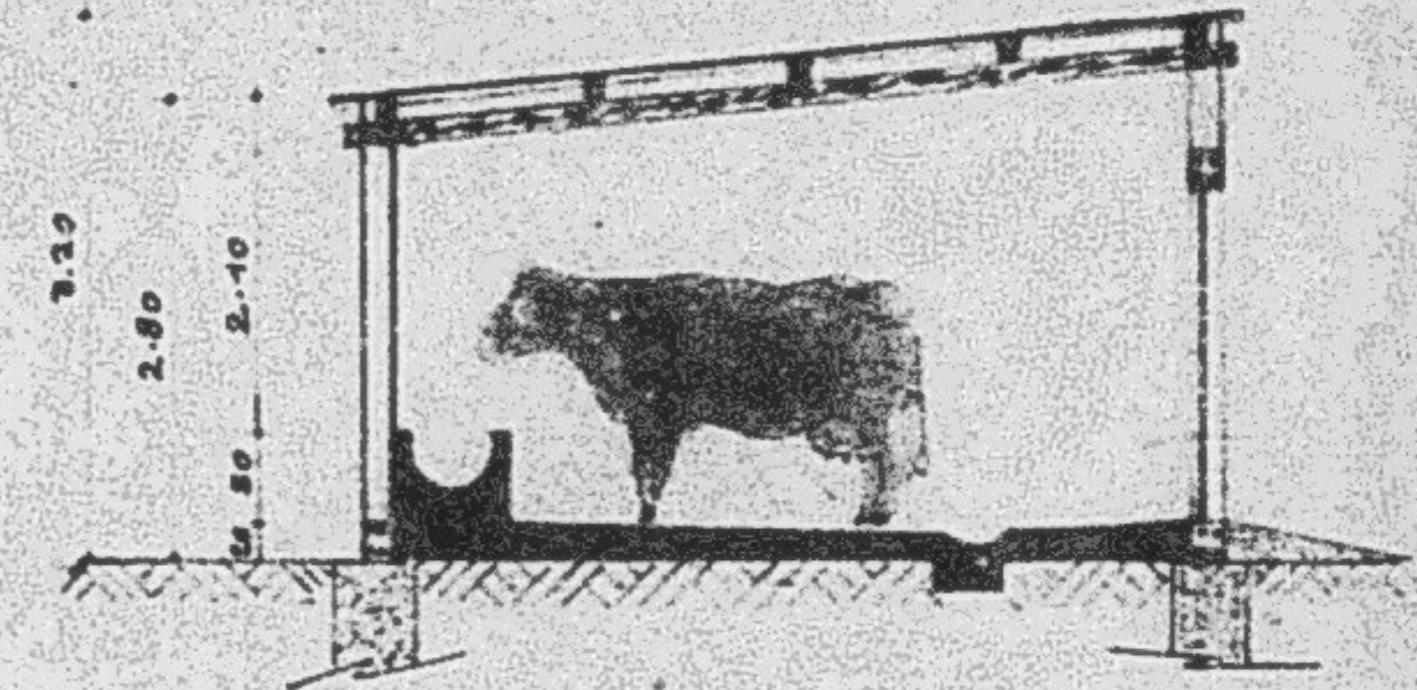

14 Plaques éternit  
(3.00 - 1.00)

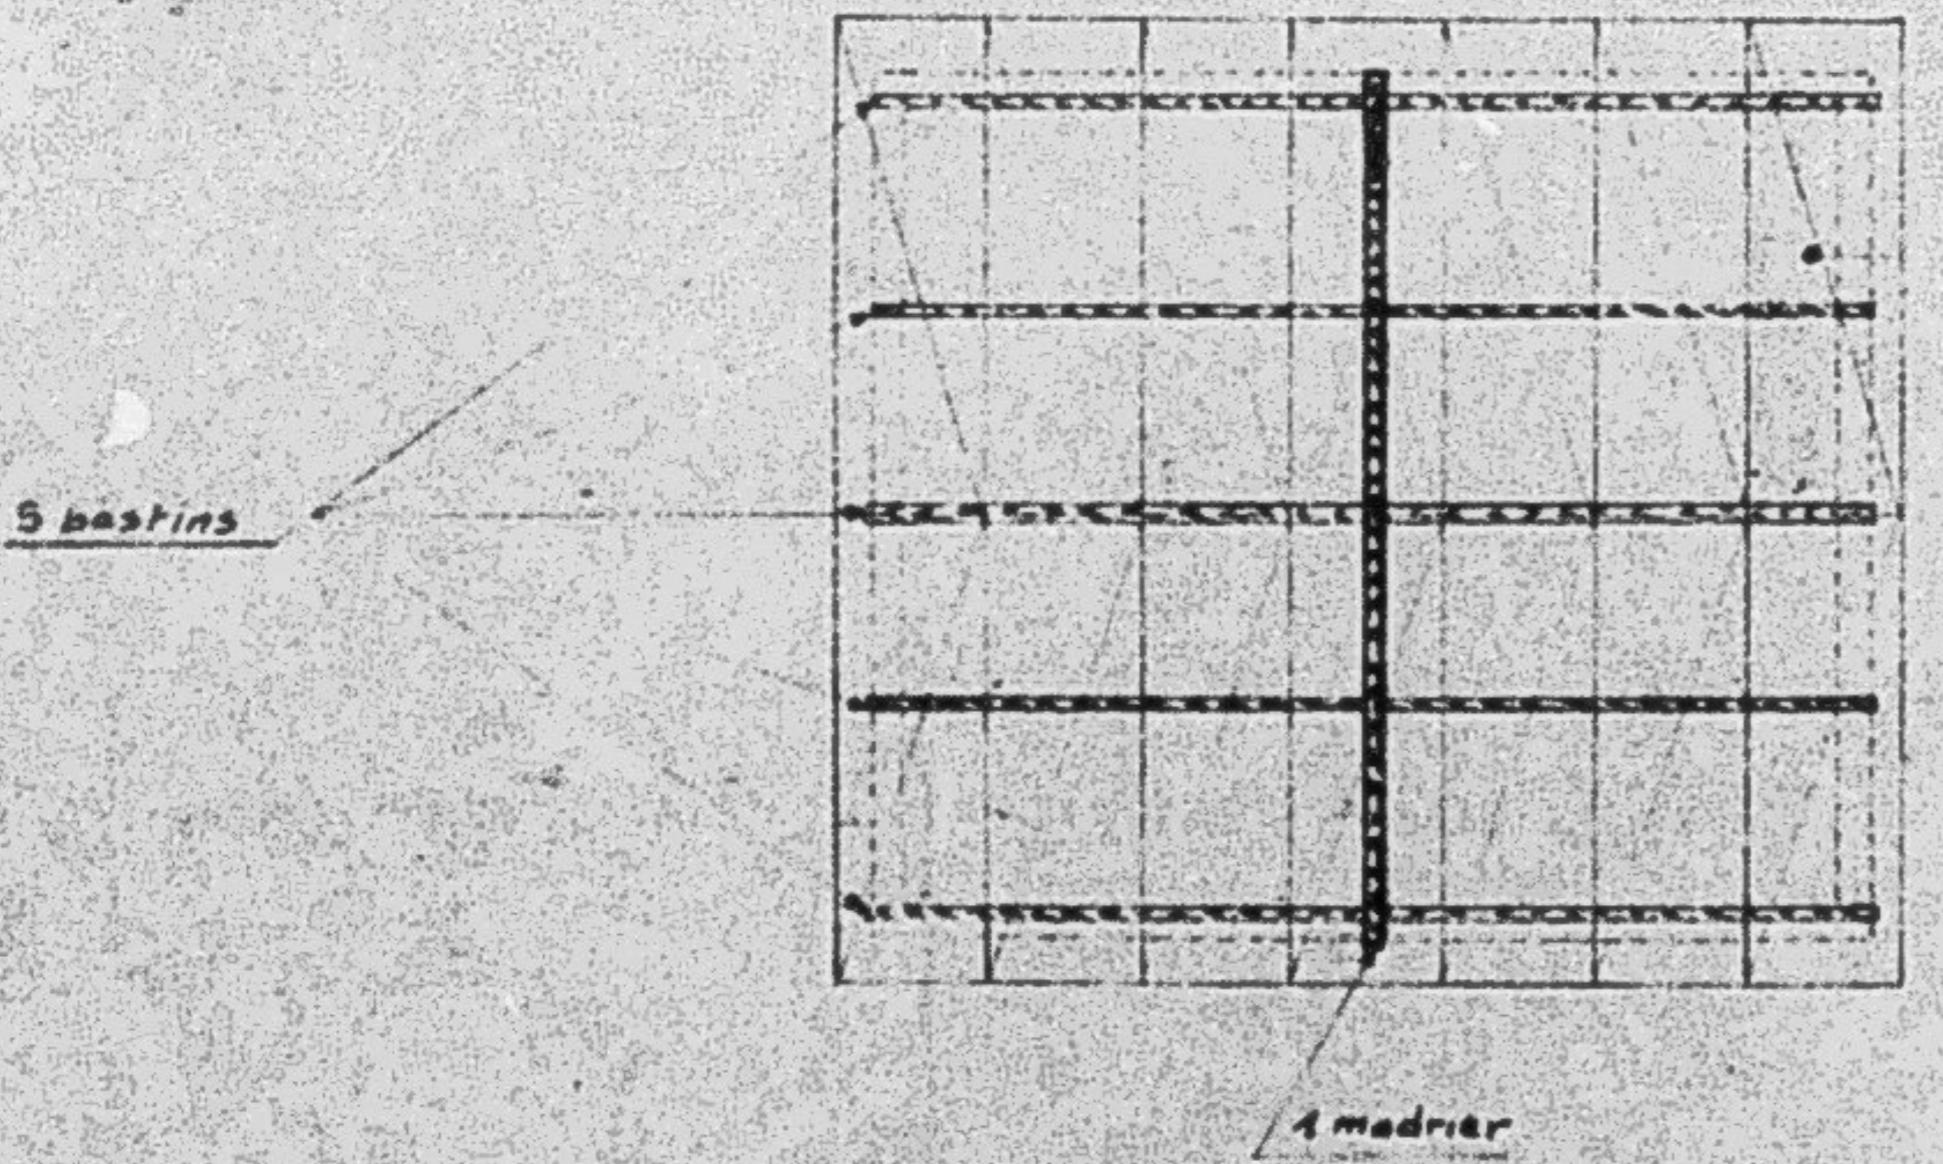


## DETAIL PLANCHER


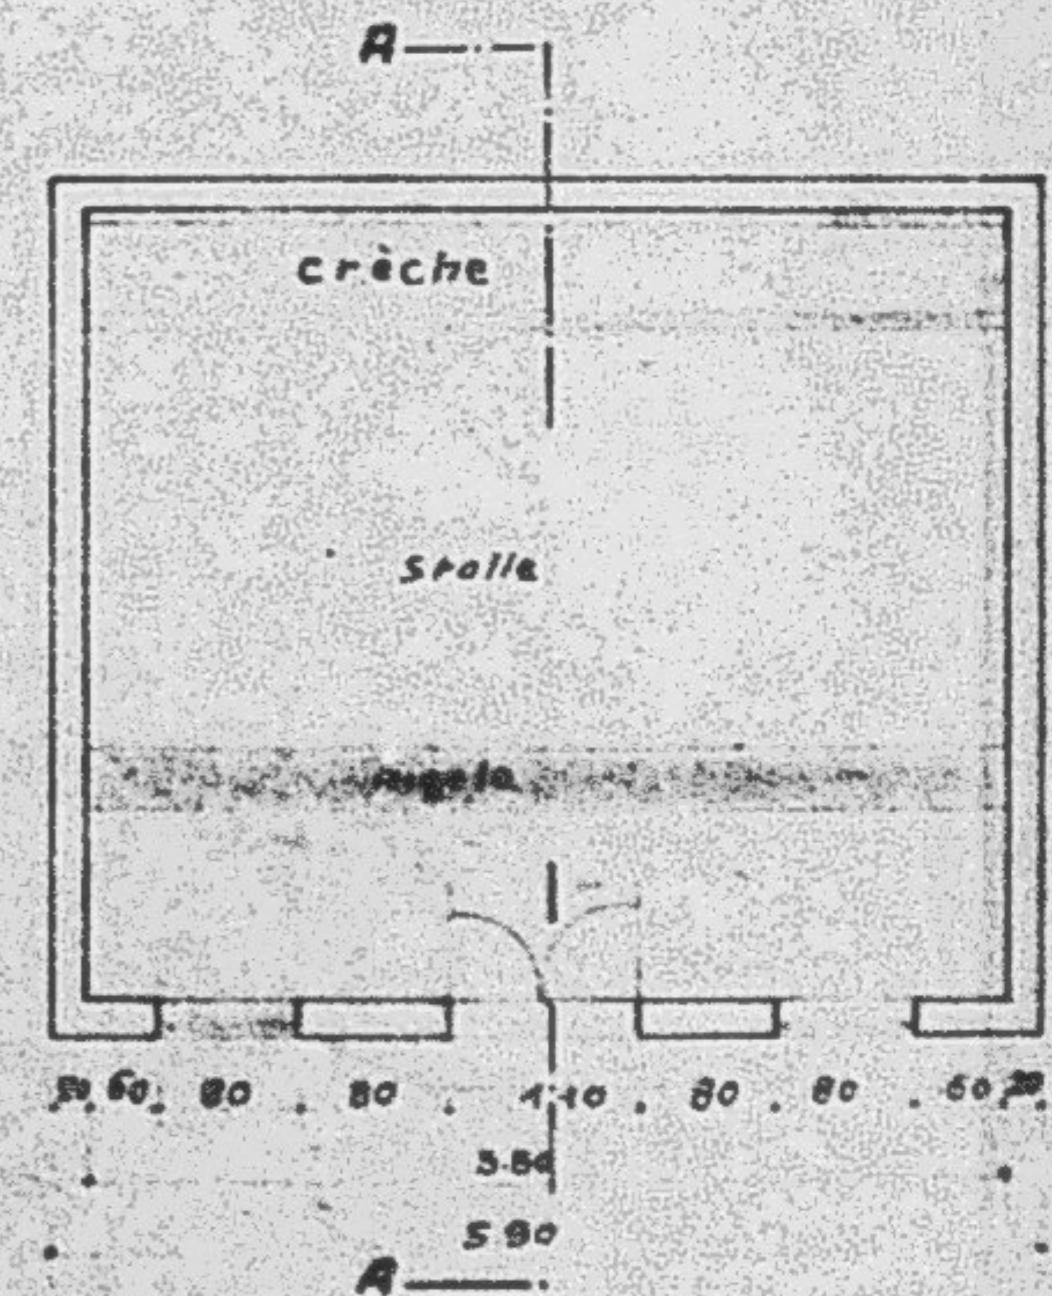


## PLAN


FAÇADE PRINCIPALE

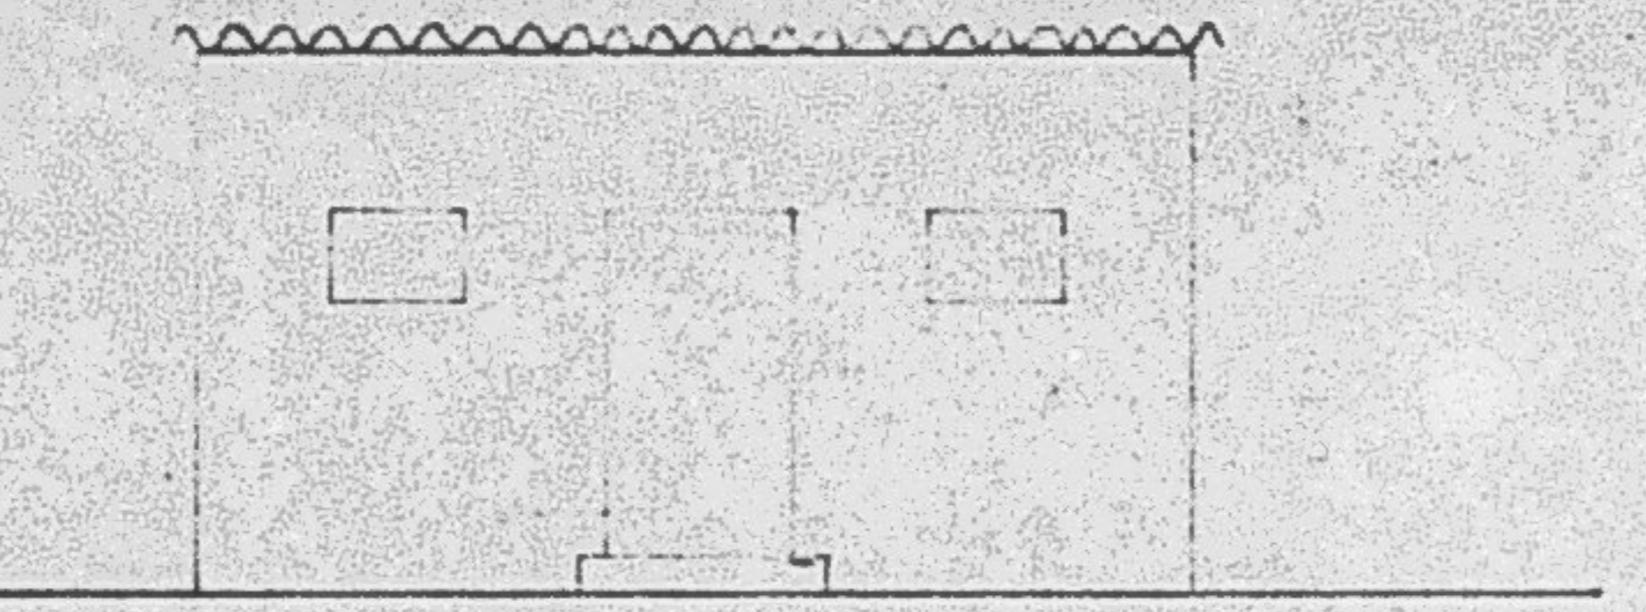

COUPE AA.

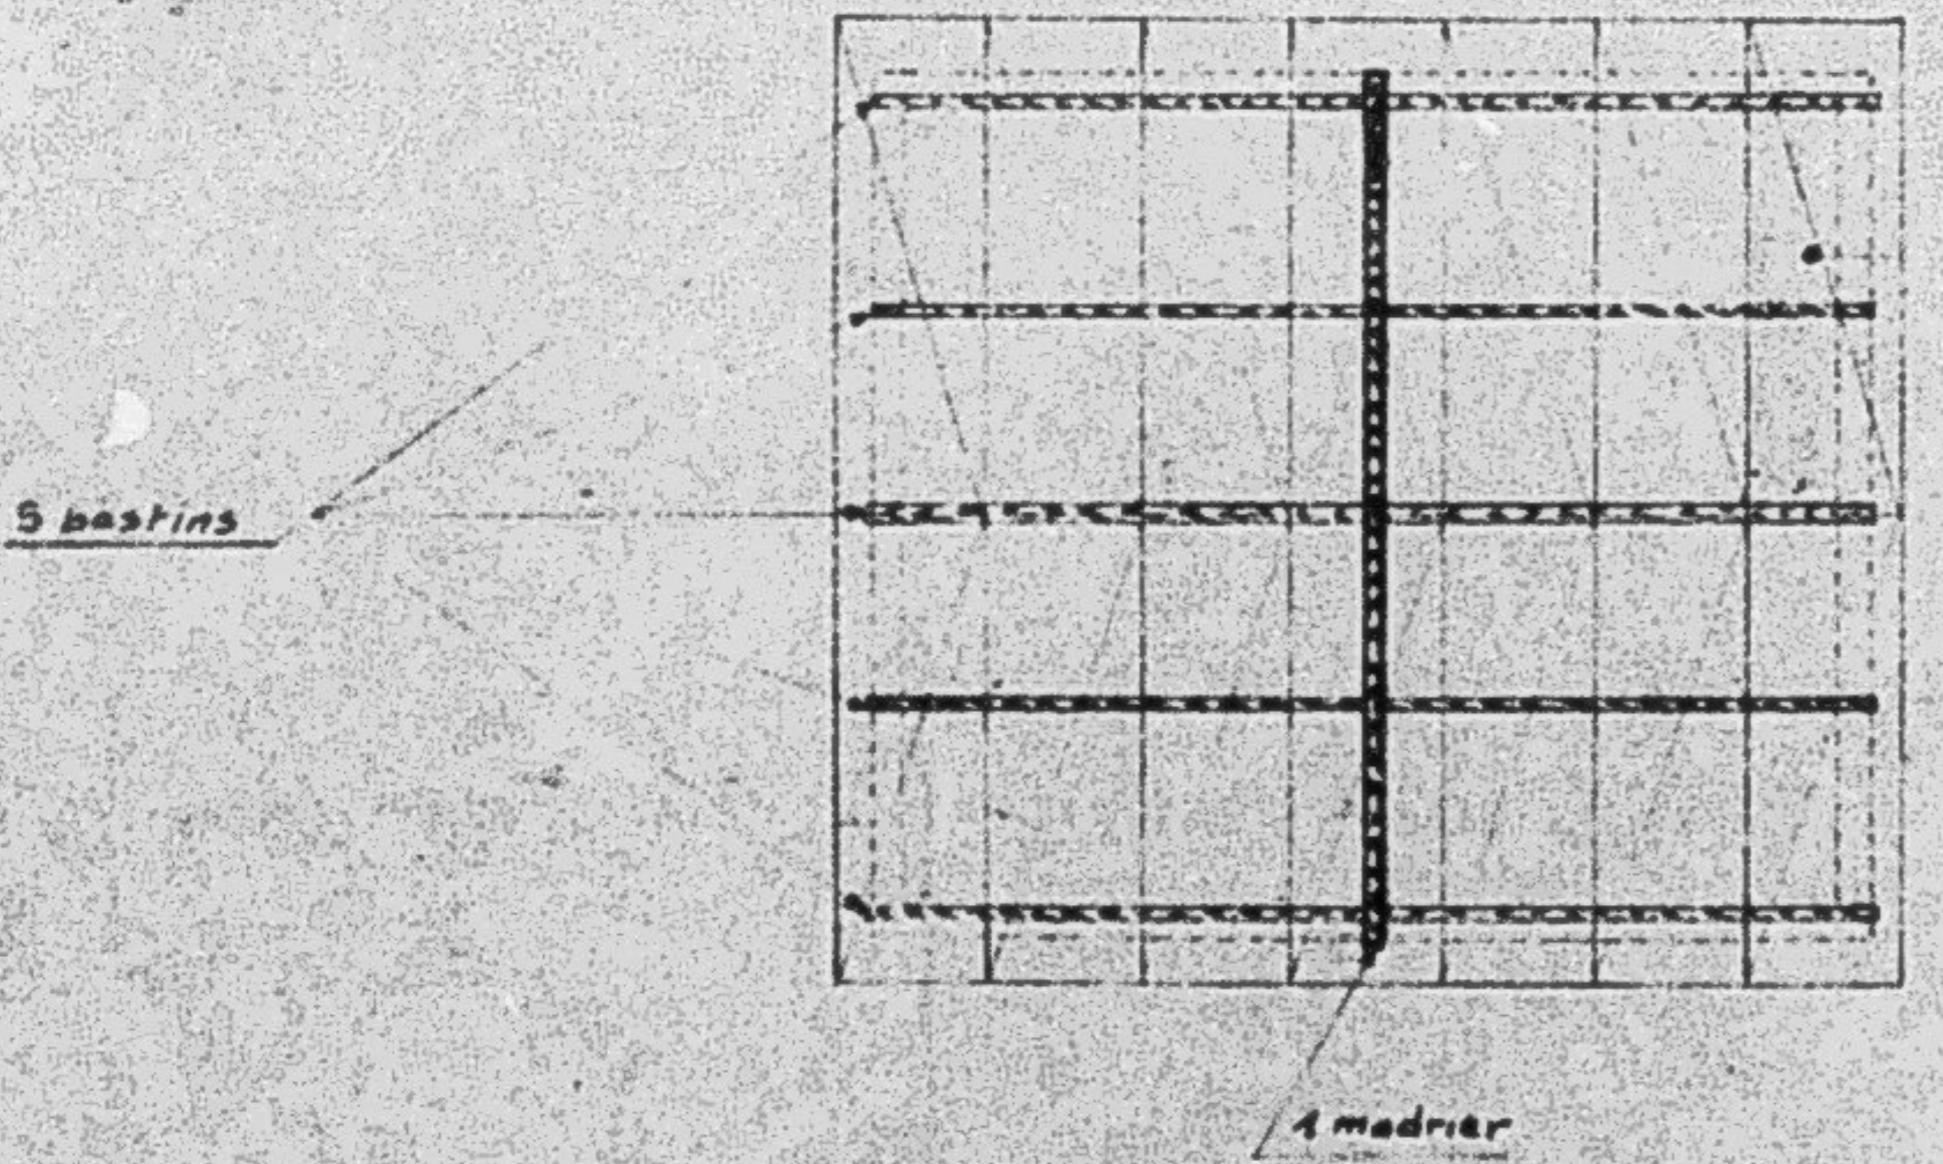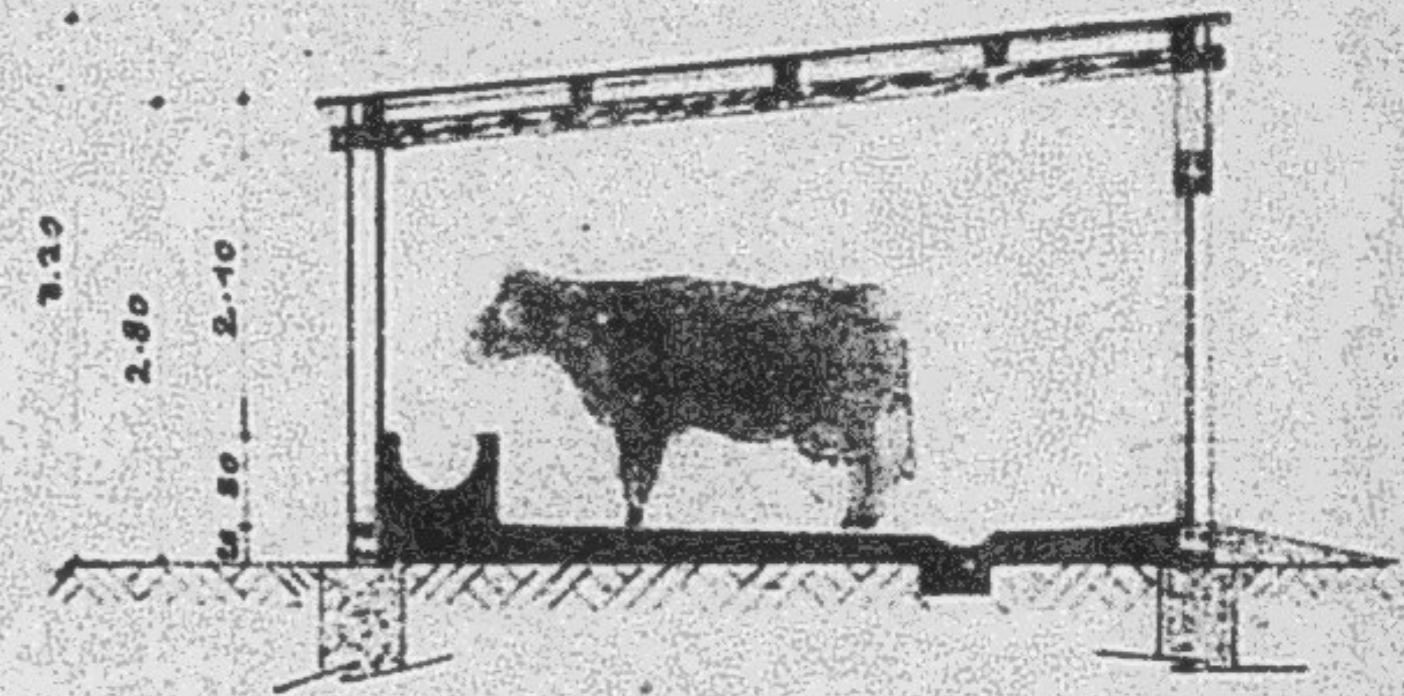

DETAIL PLANCHER

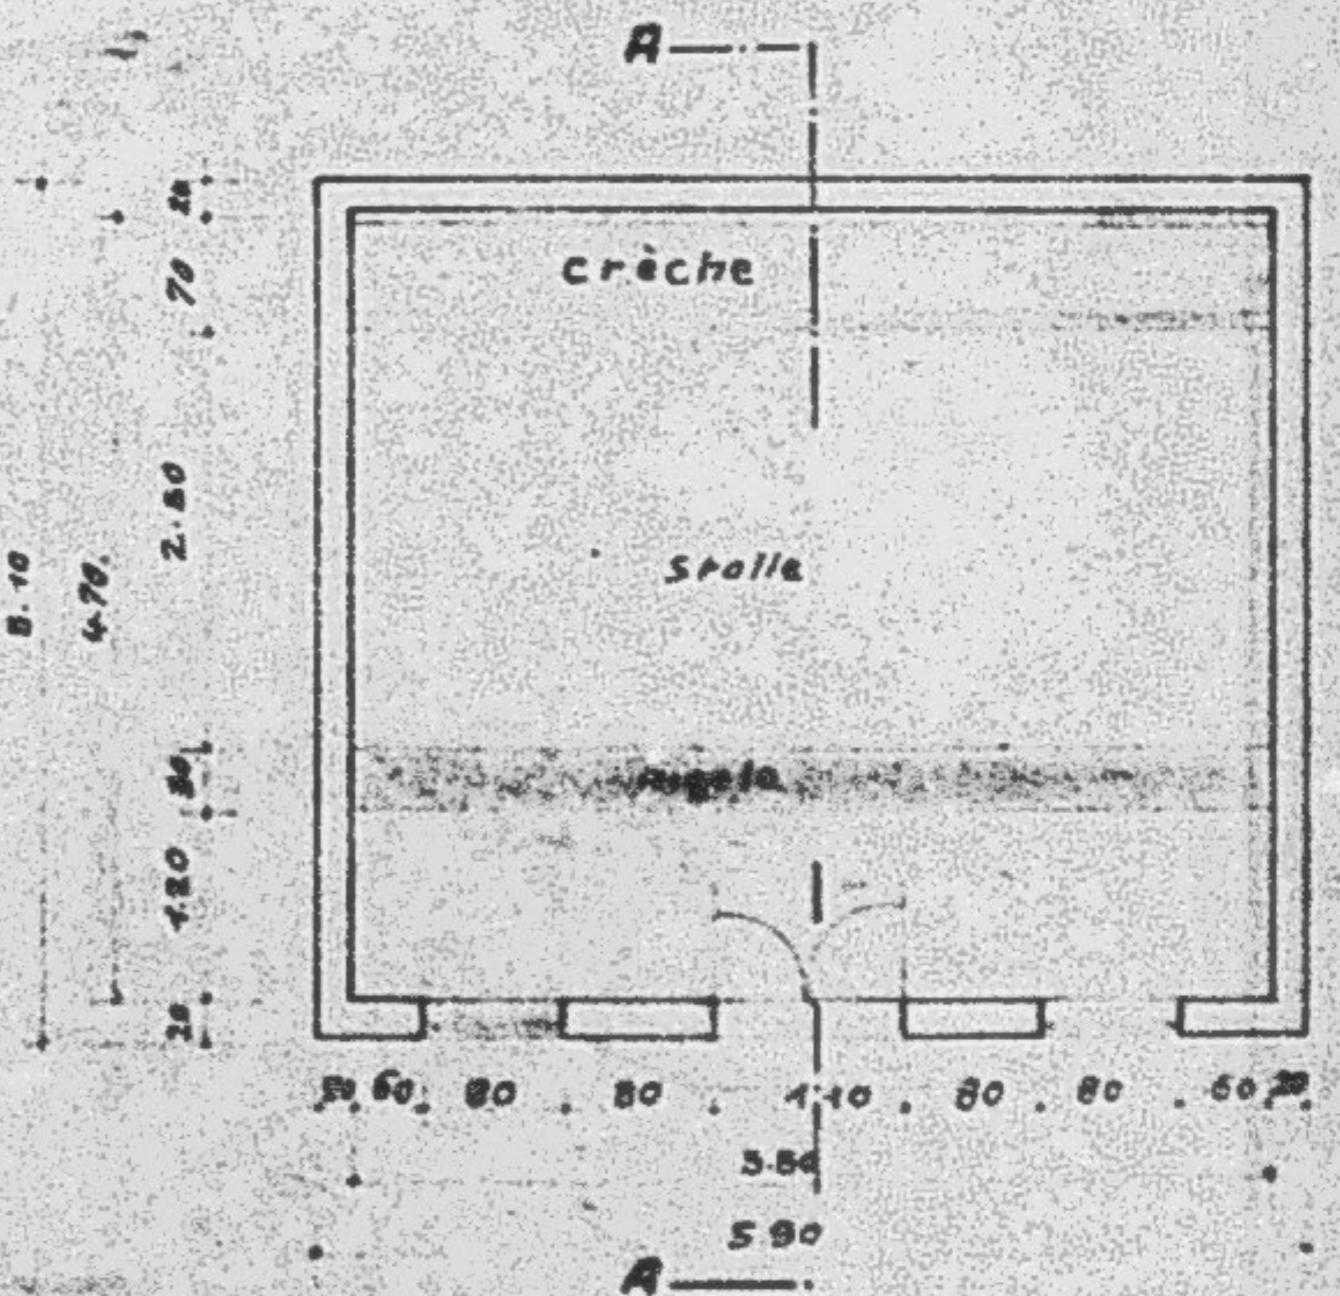

PLAN

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CNA-34130



PROGRAMME: VILLAGES FORESTIERS

ETABLE

(5 Vacants)

4


# PLAN

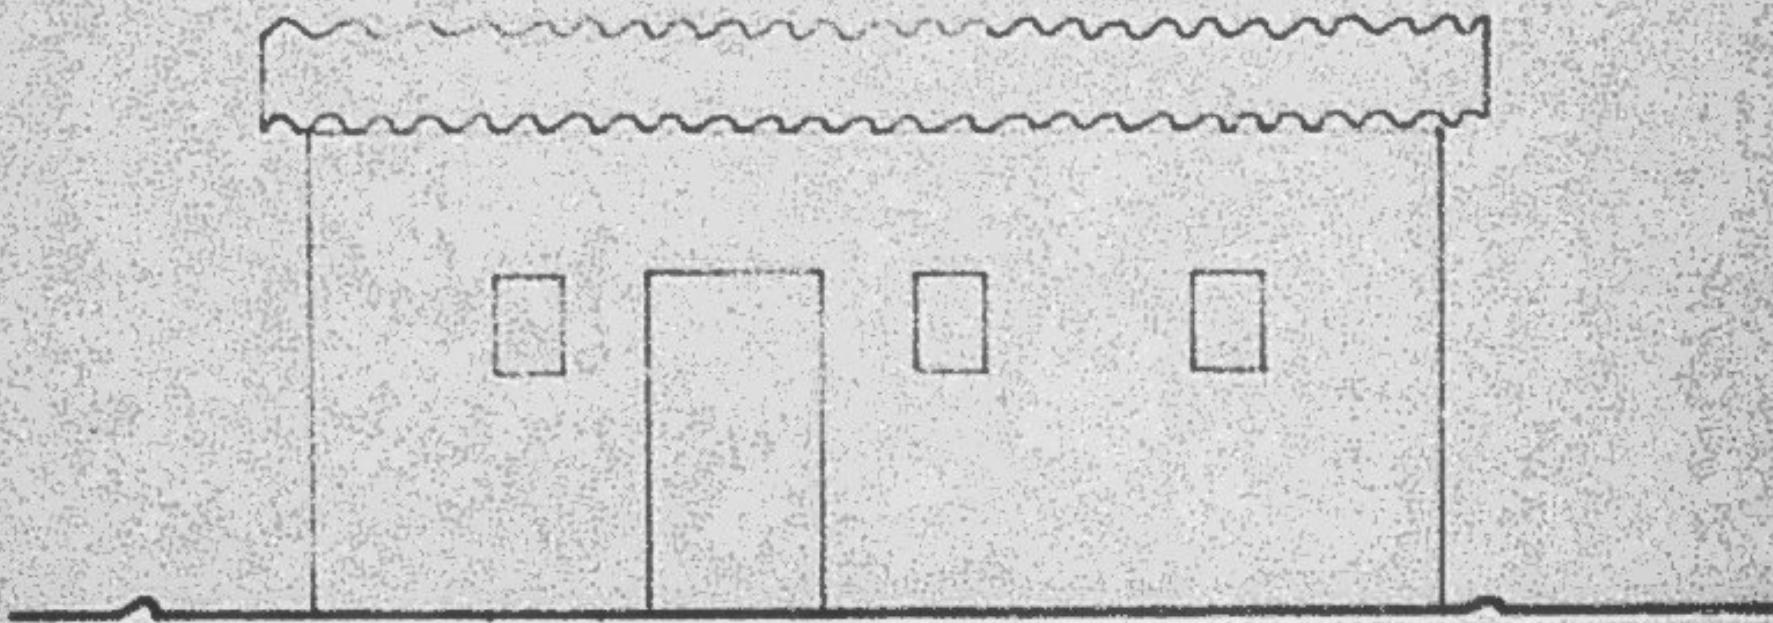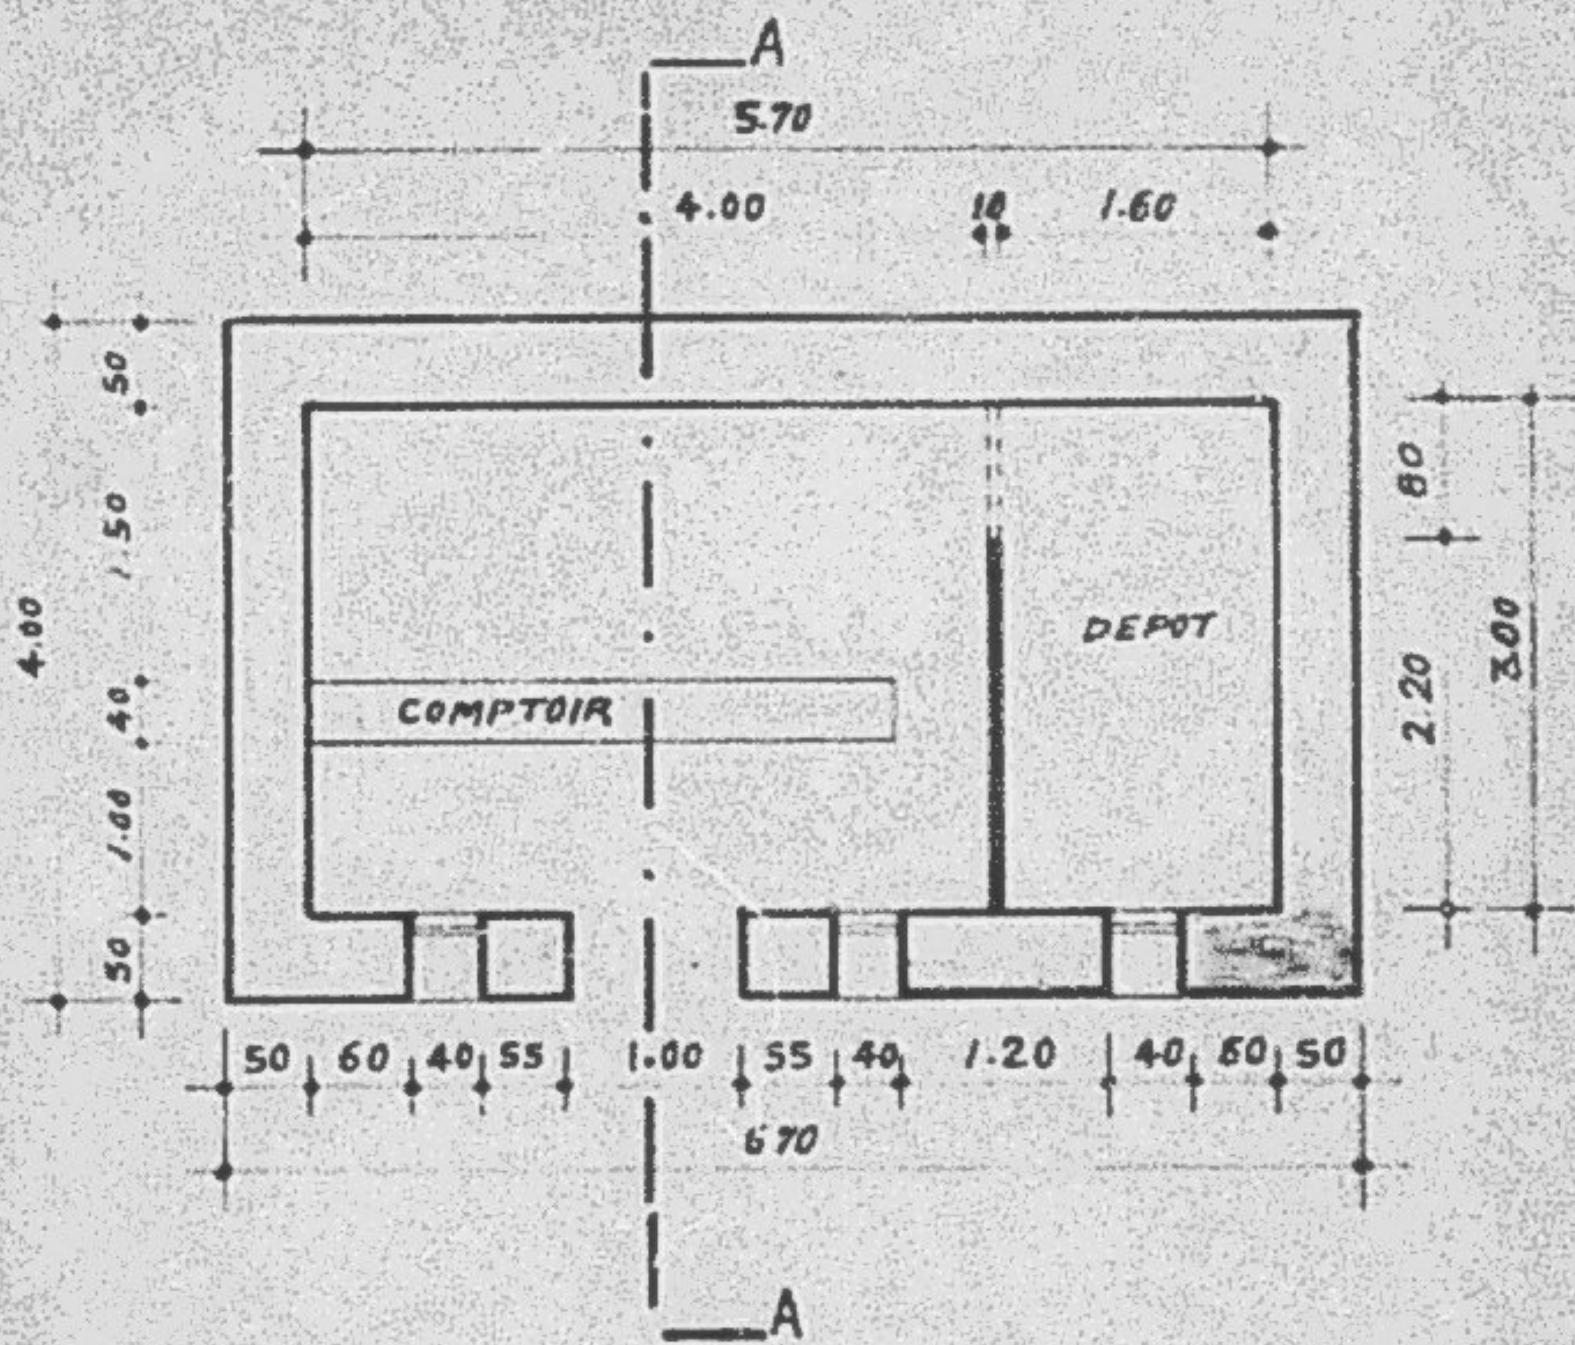


FAÇADE PRINCIPALE

# COUPE AA

34/130 -

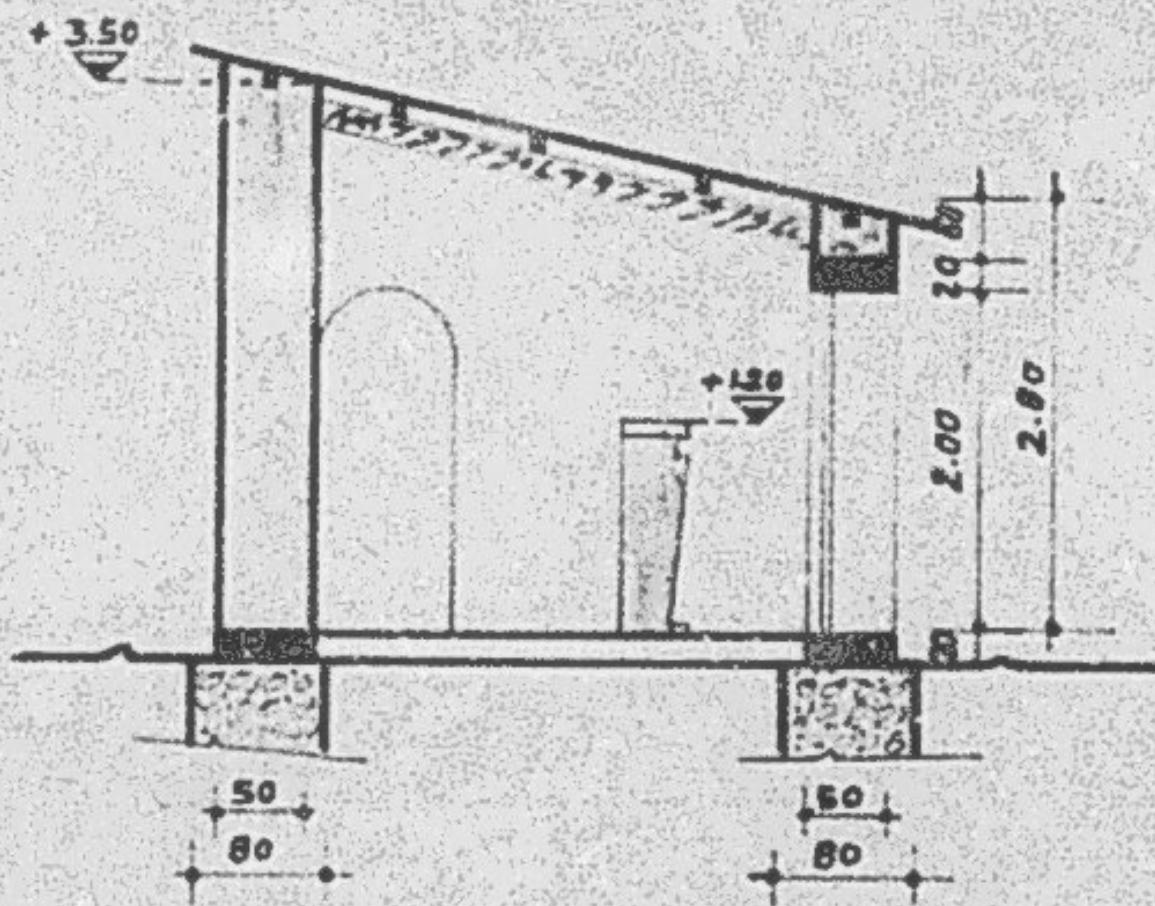

1 Madrier

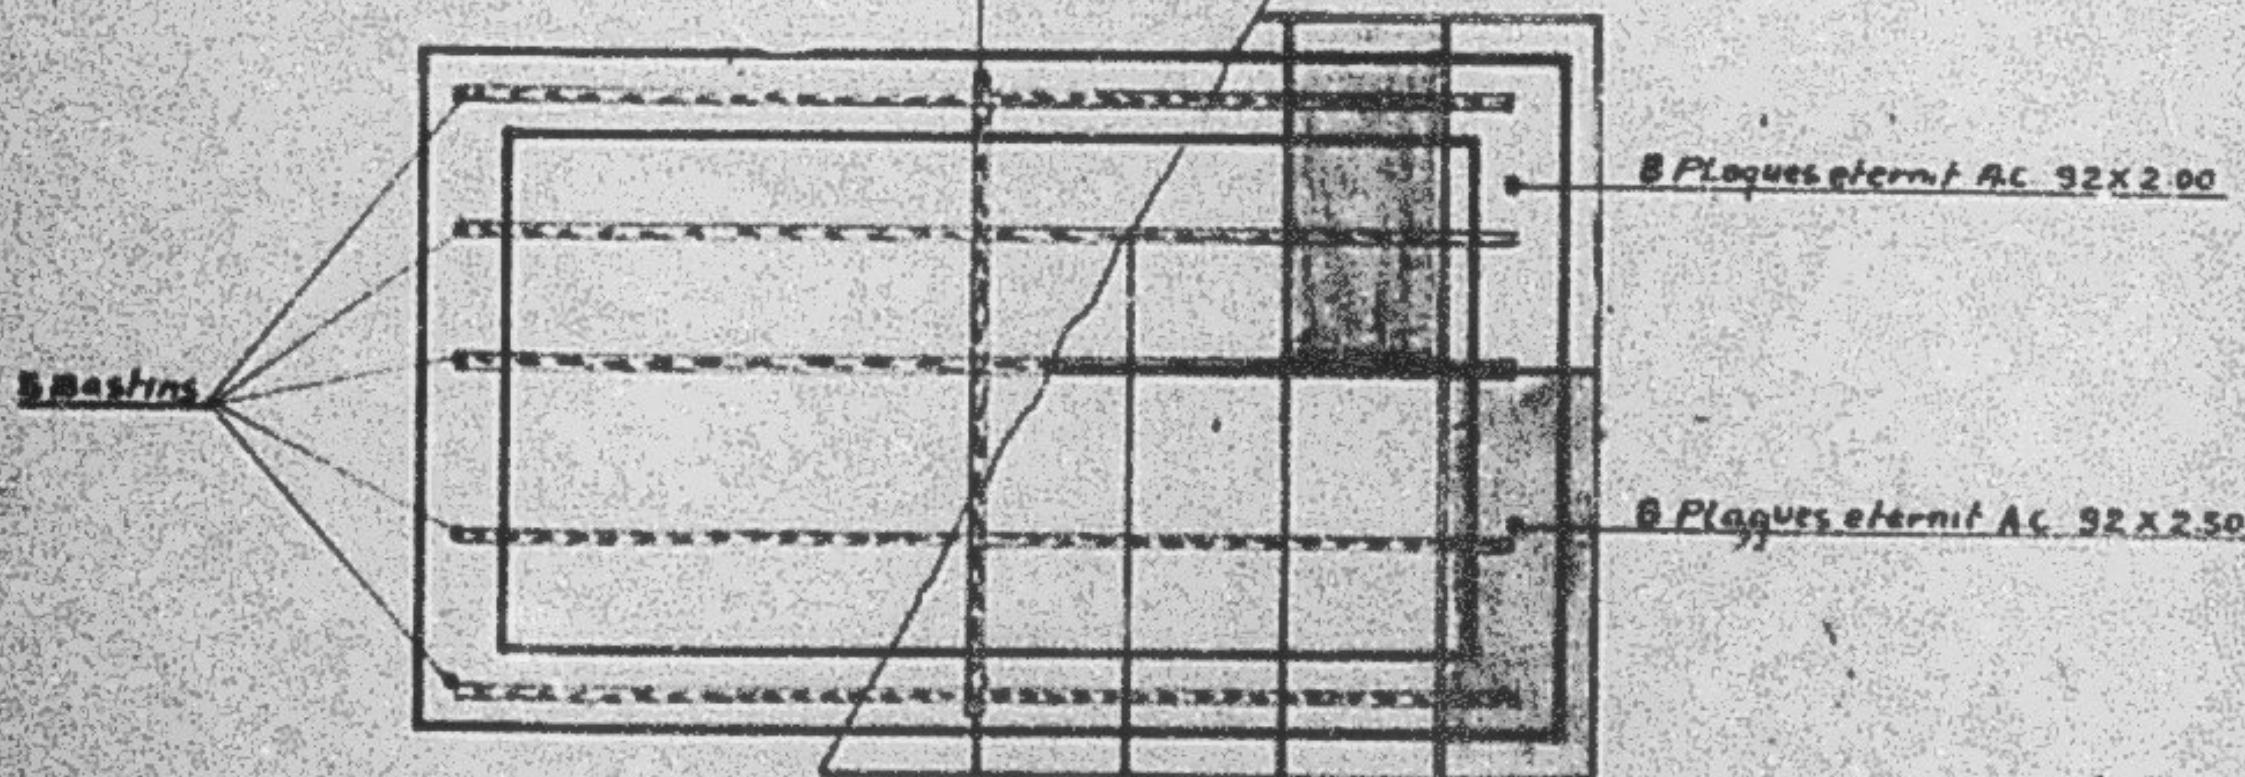


DETAIL PLANCHER

50  
80

80  
80

1 Madrier

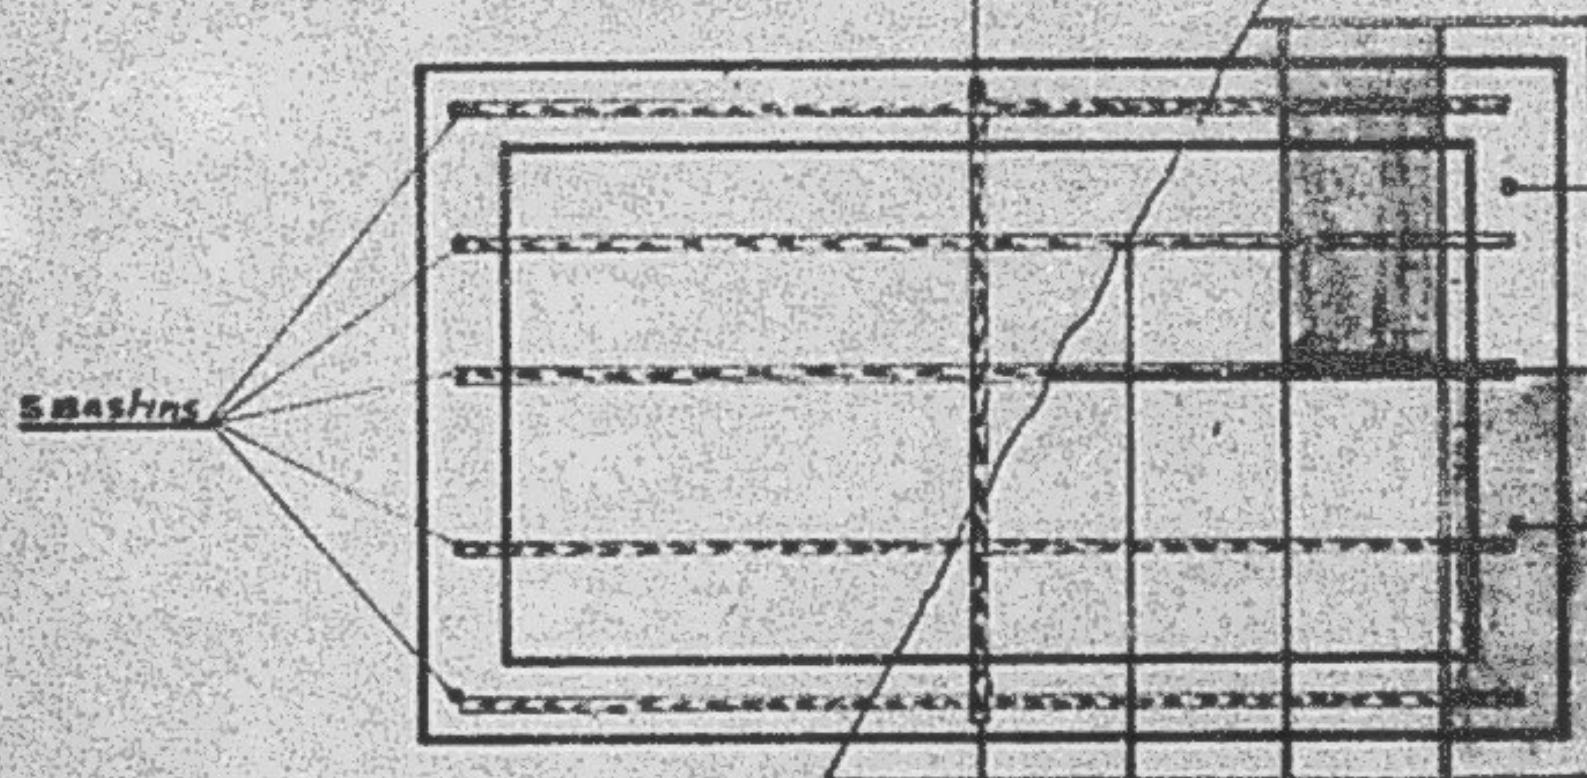

### DETAIL PLANCHER

10


REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROGRAMME VILLAGES FORESTIERS


MAGASIN

Ech:1:50 Fev.74


PLAN

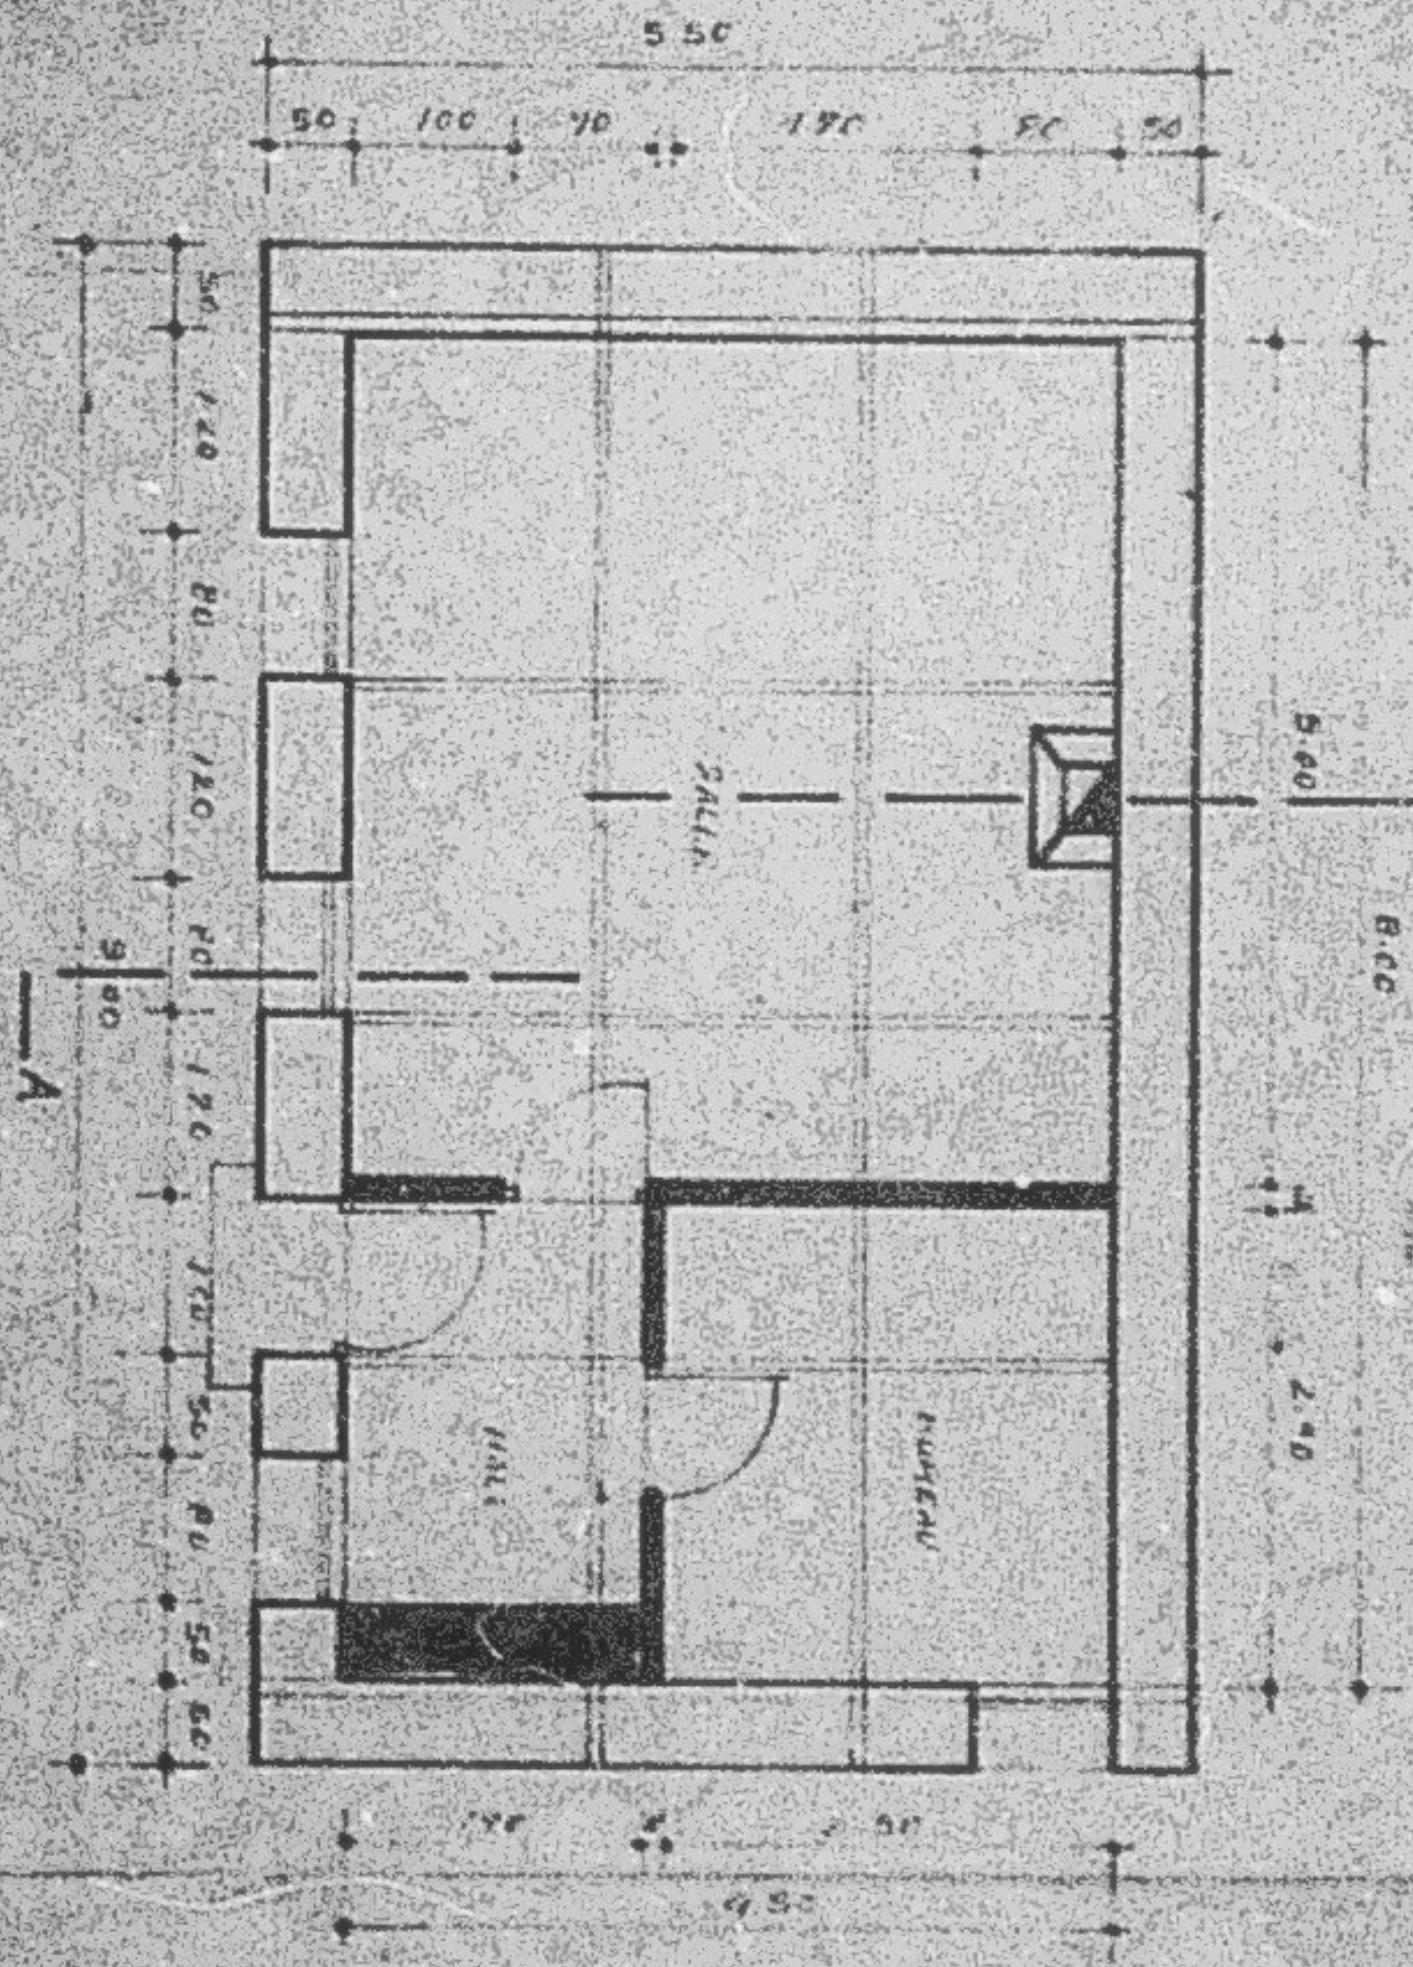


FAÇADE PRINCIPLE

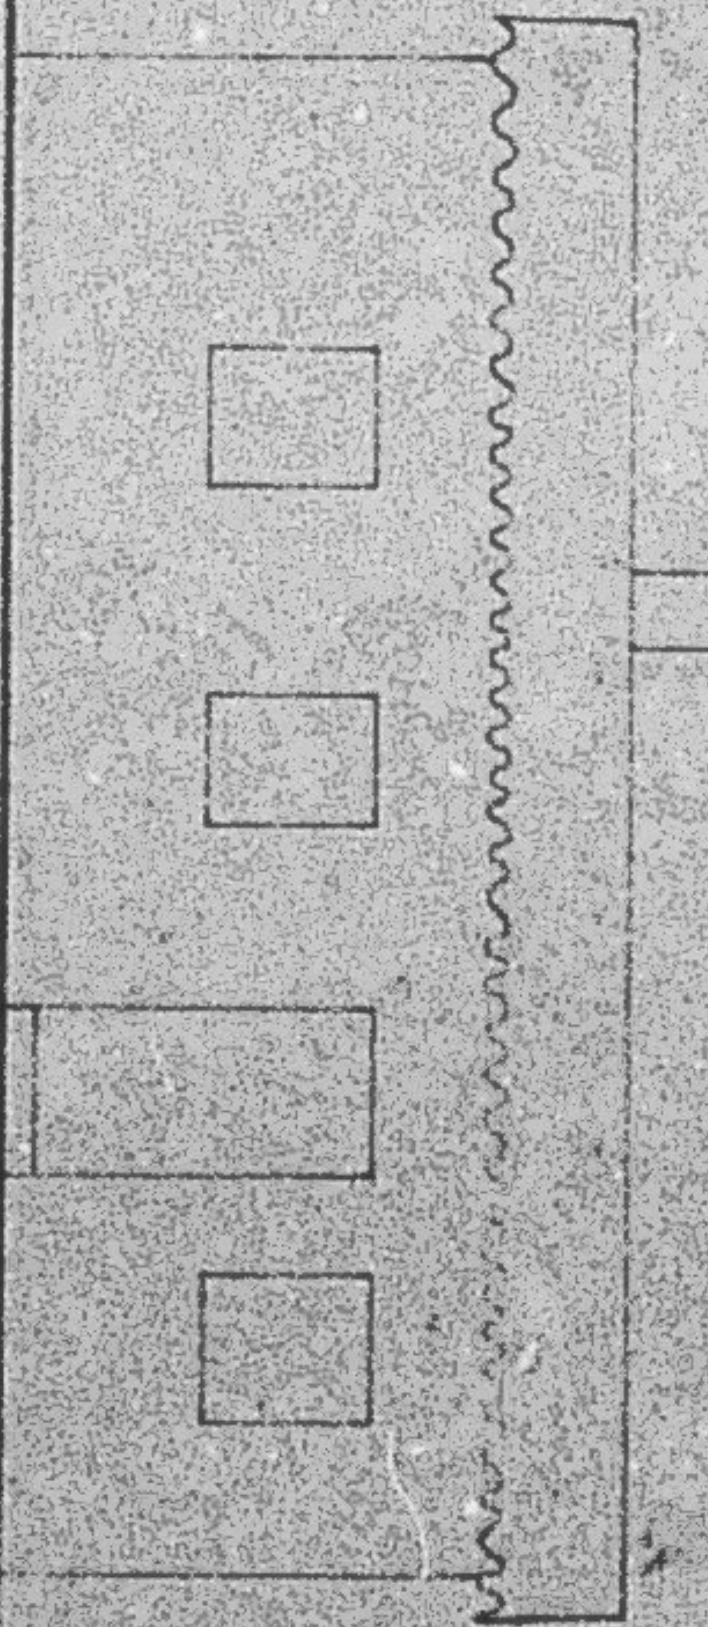

COURSE A

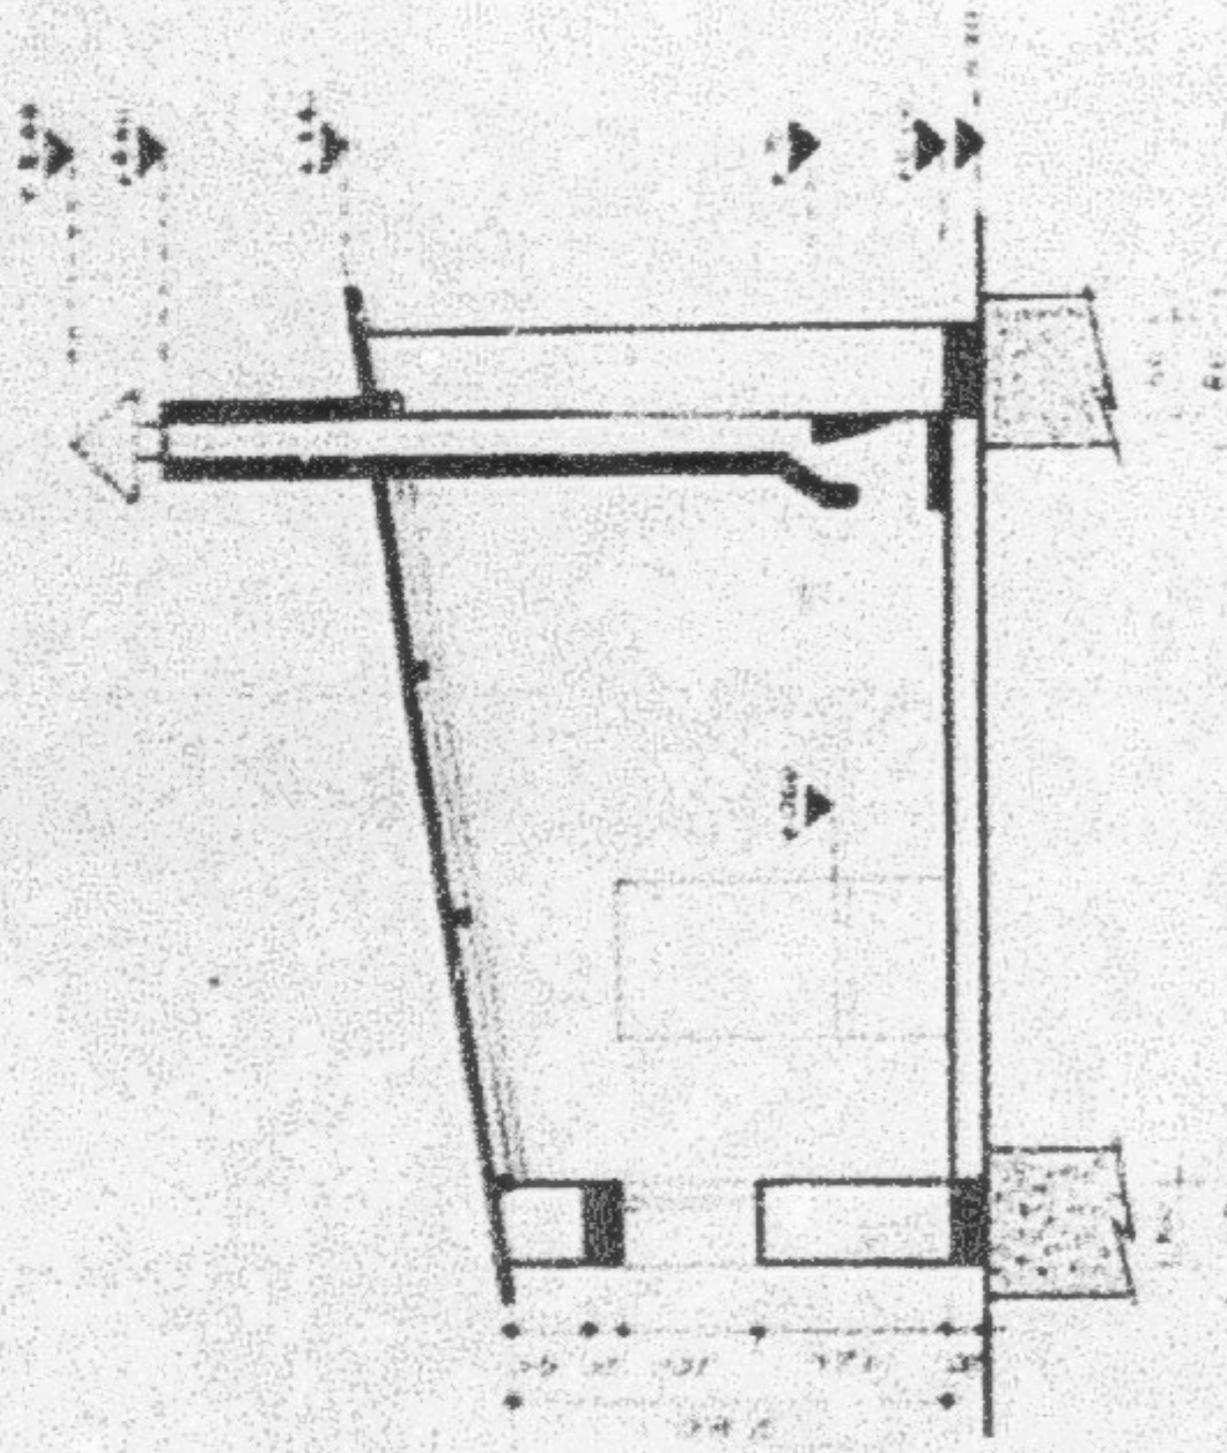

FACADE LATÉRALE

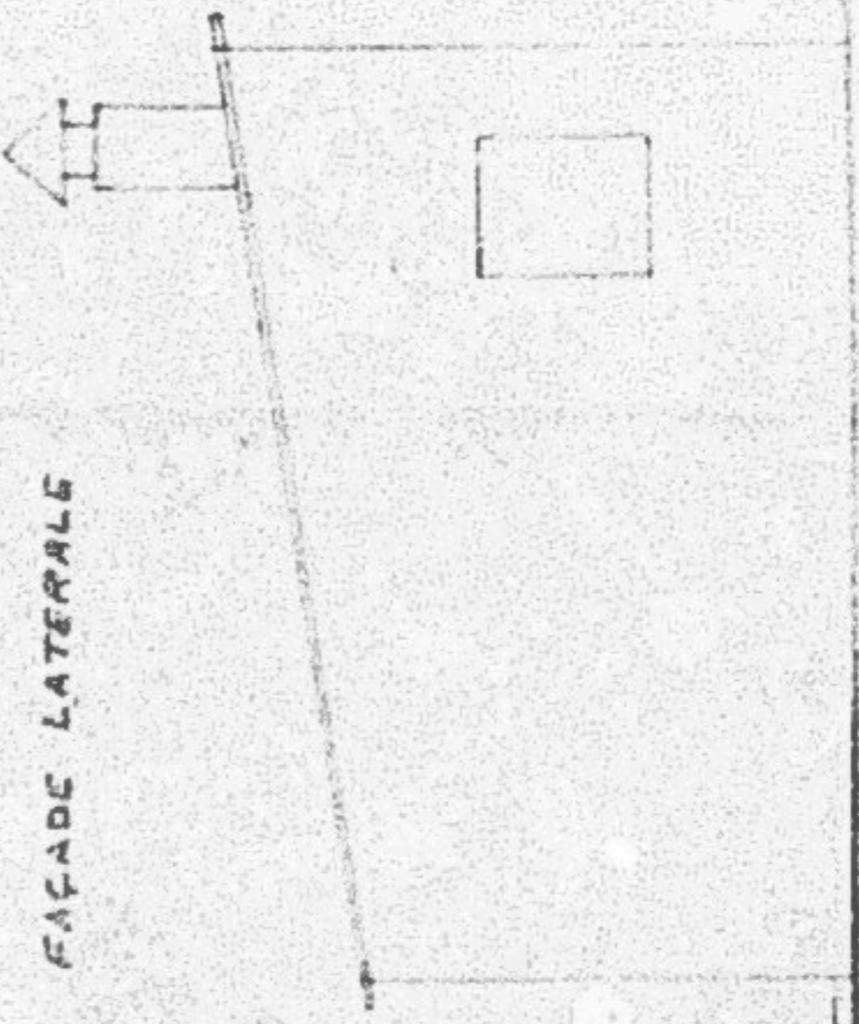

REPUBLIQUE TUNISIENNE


PROGRAMME VILLAGES FORESTIERS

SALLE DE REUNION


//

A. BOUAFIA

Ech: 1/50 JANV: 74

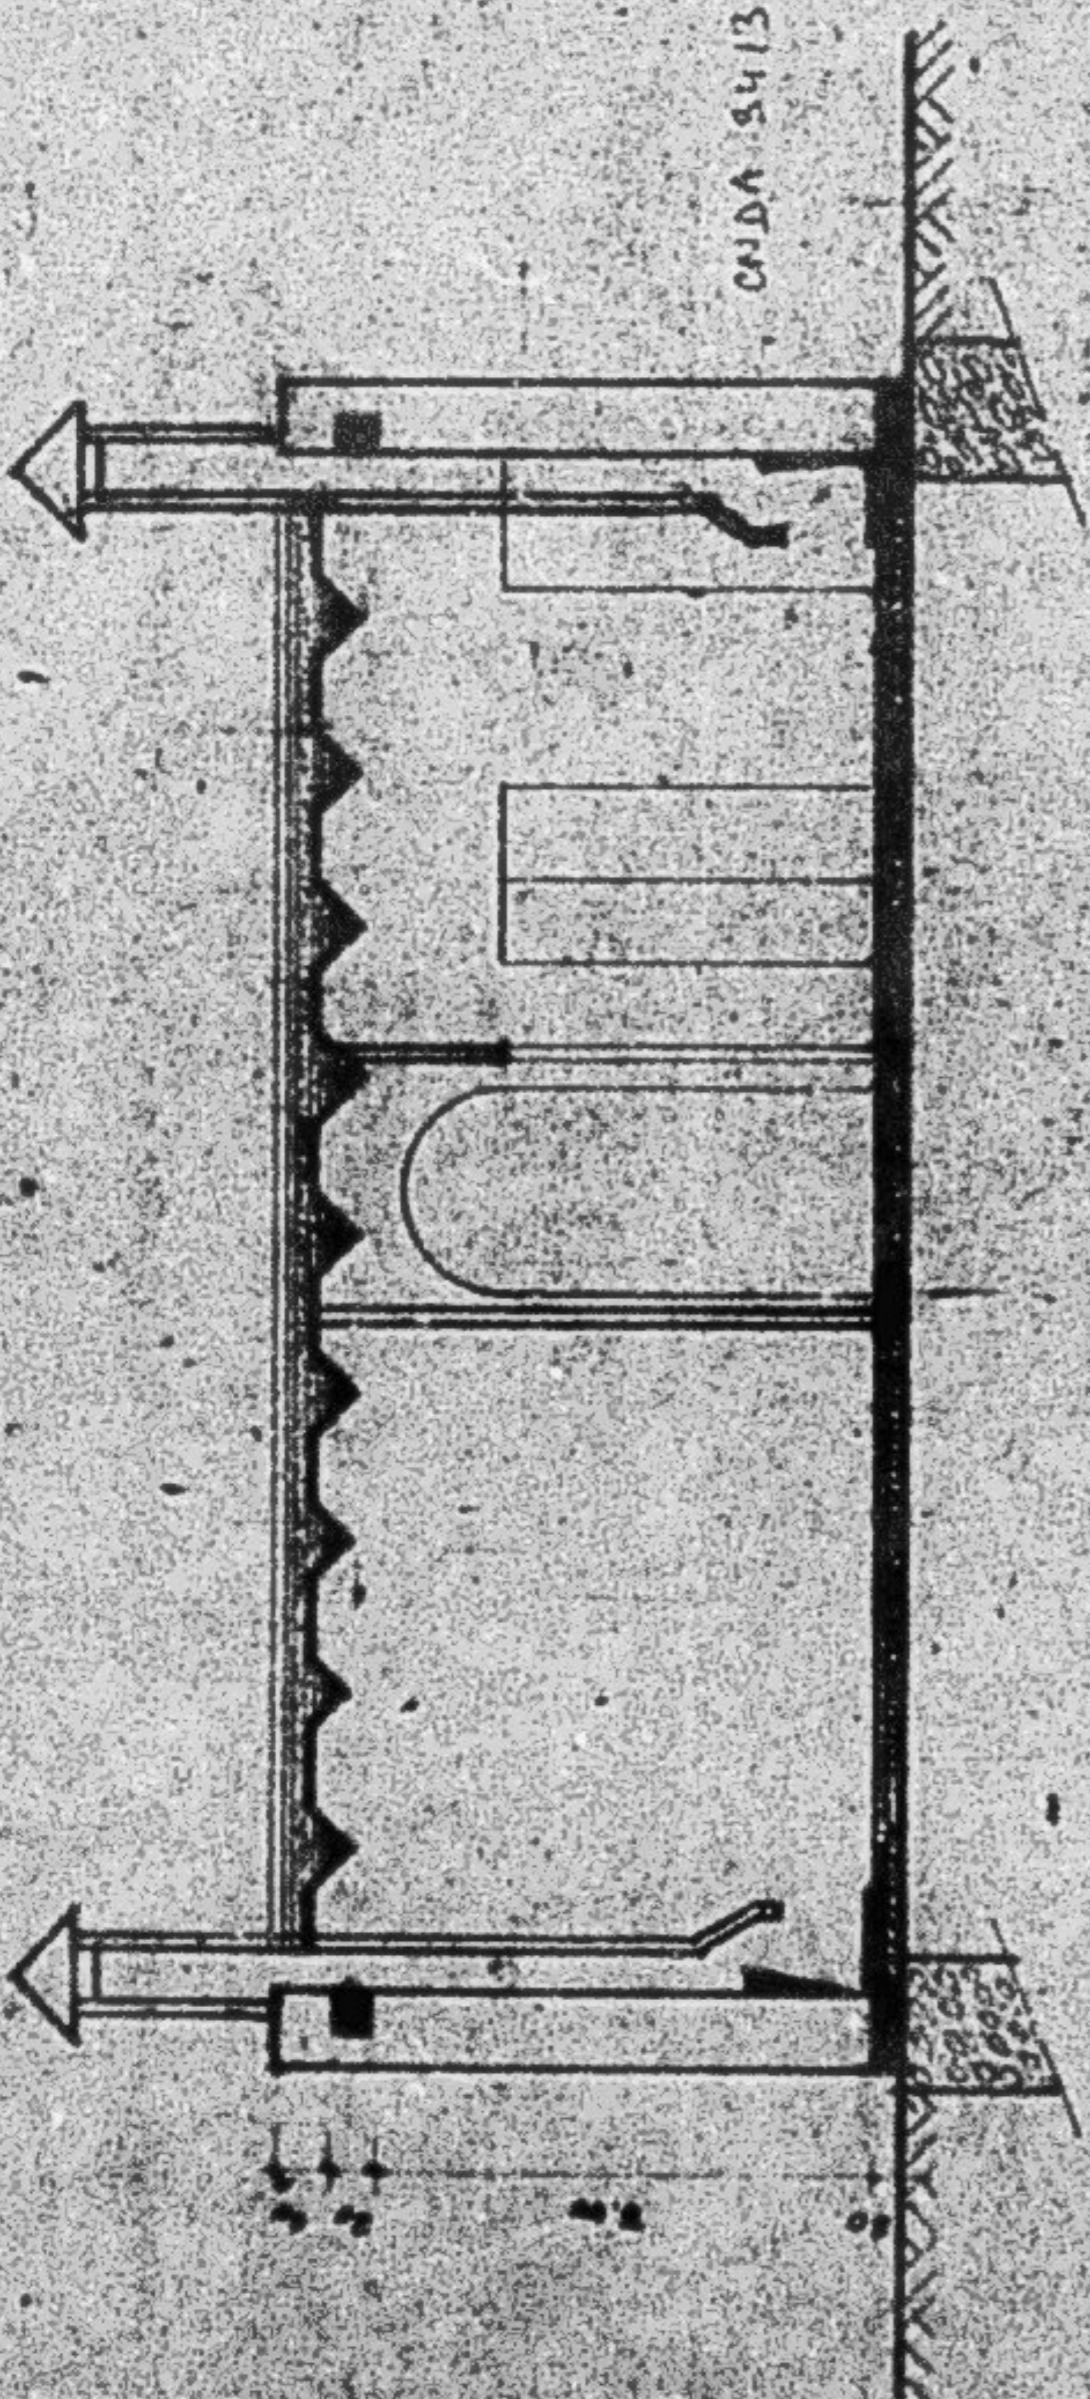



COUNT : 14

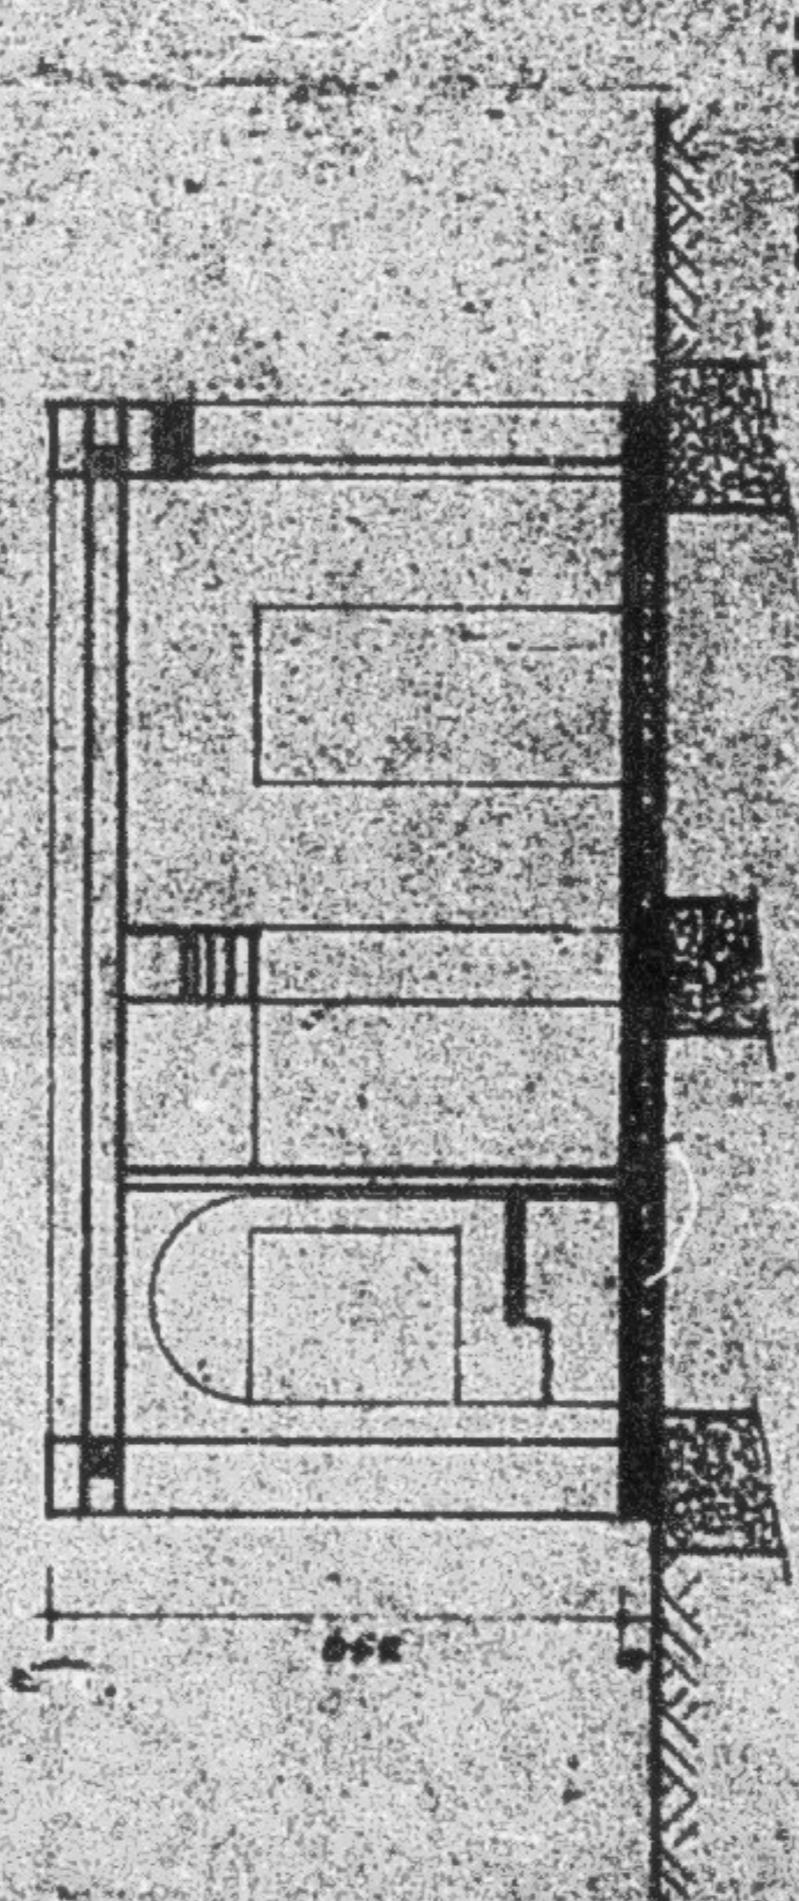



ARE PUBLIQUE TUNISIENNE

PROGRAMME VILLAGES FORESTIERS


DISPENSaire AURAL

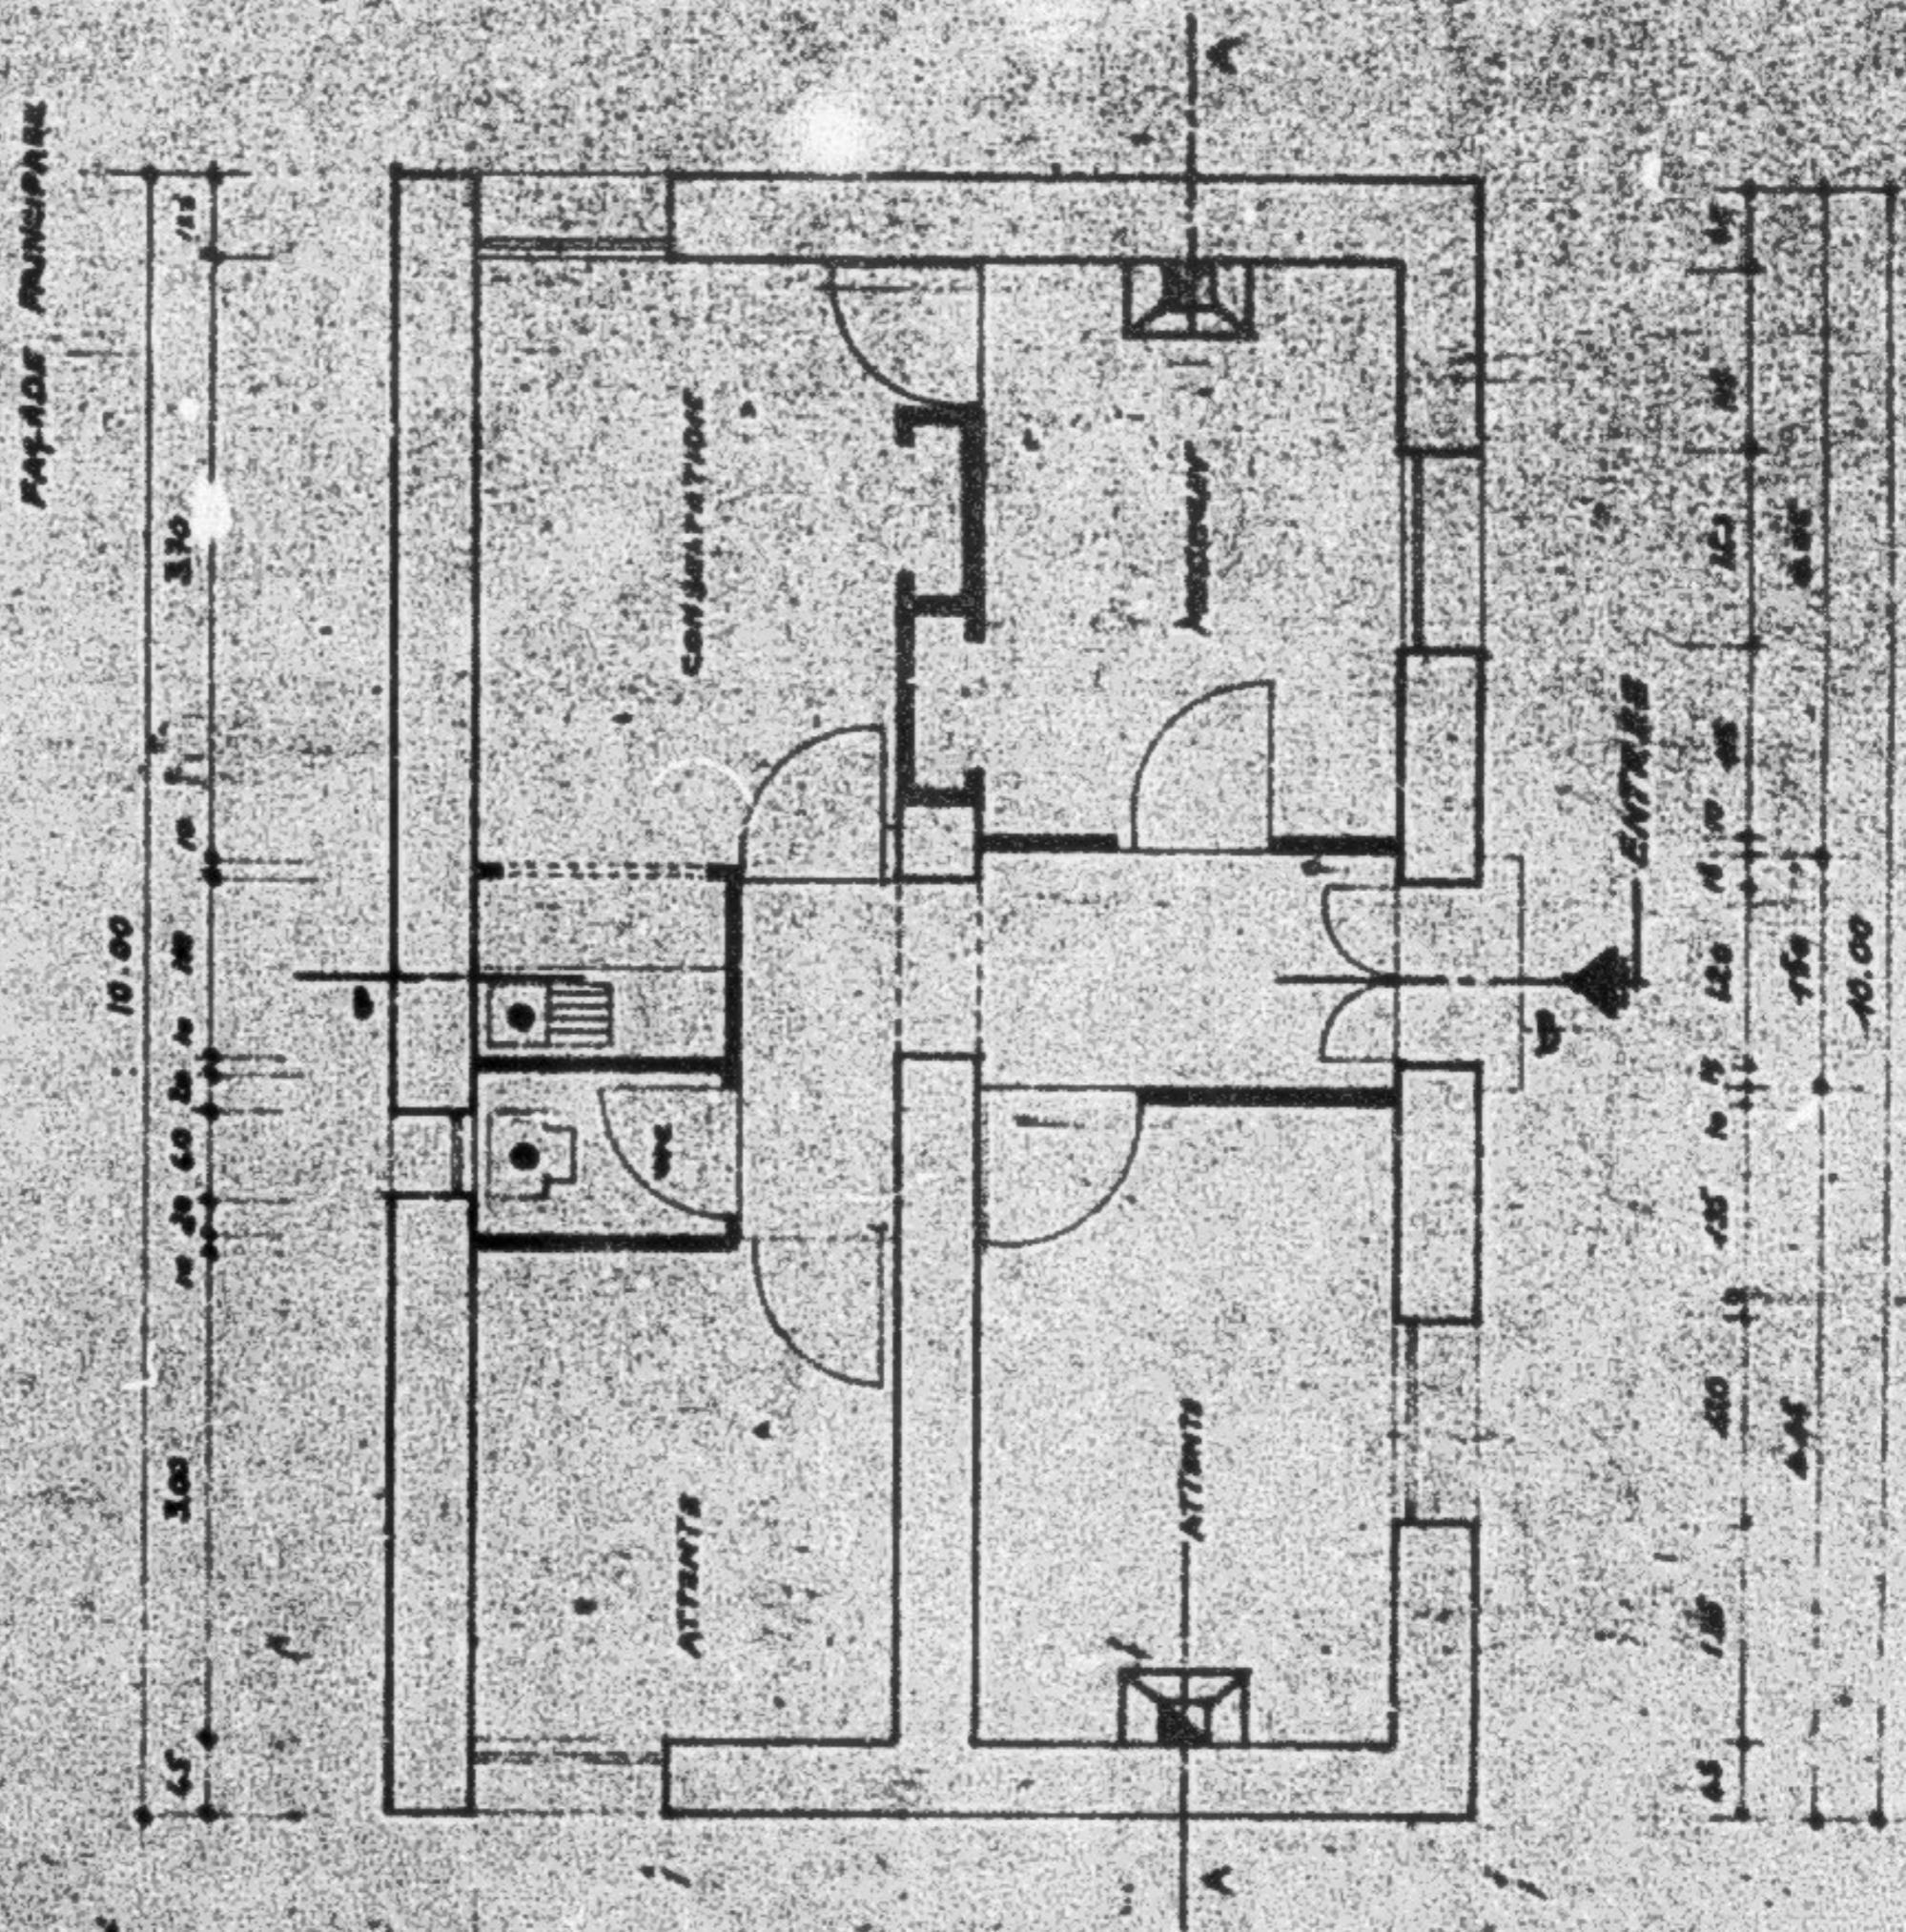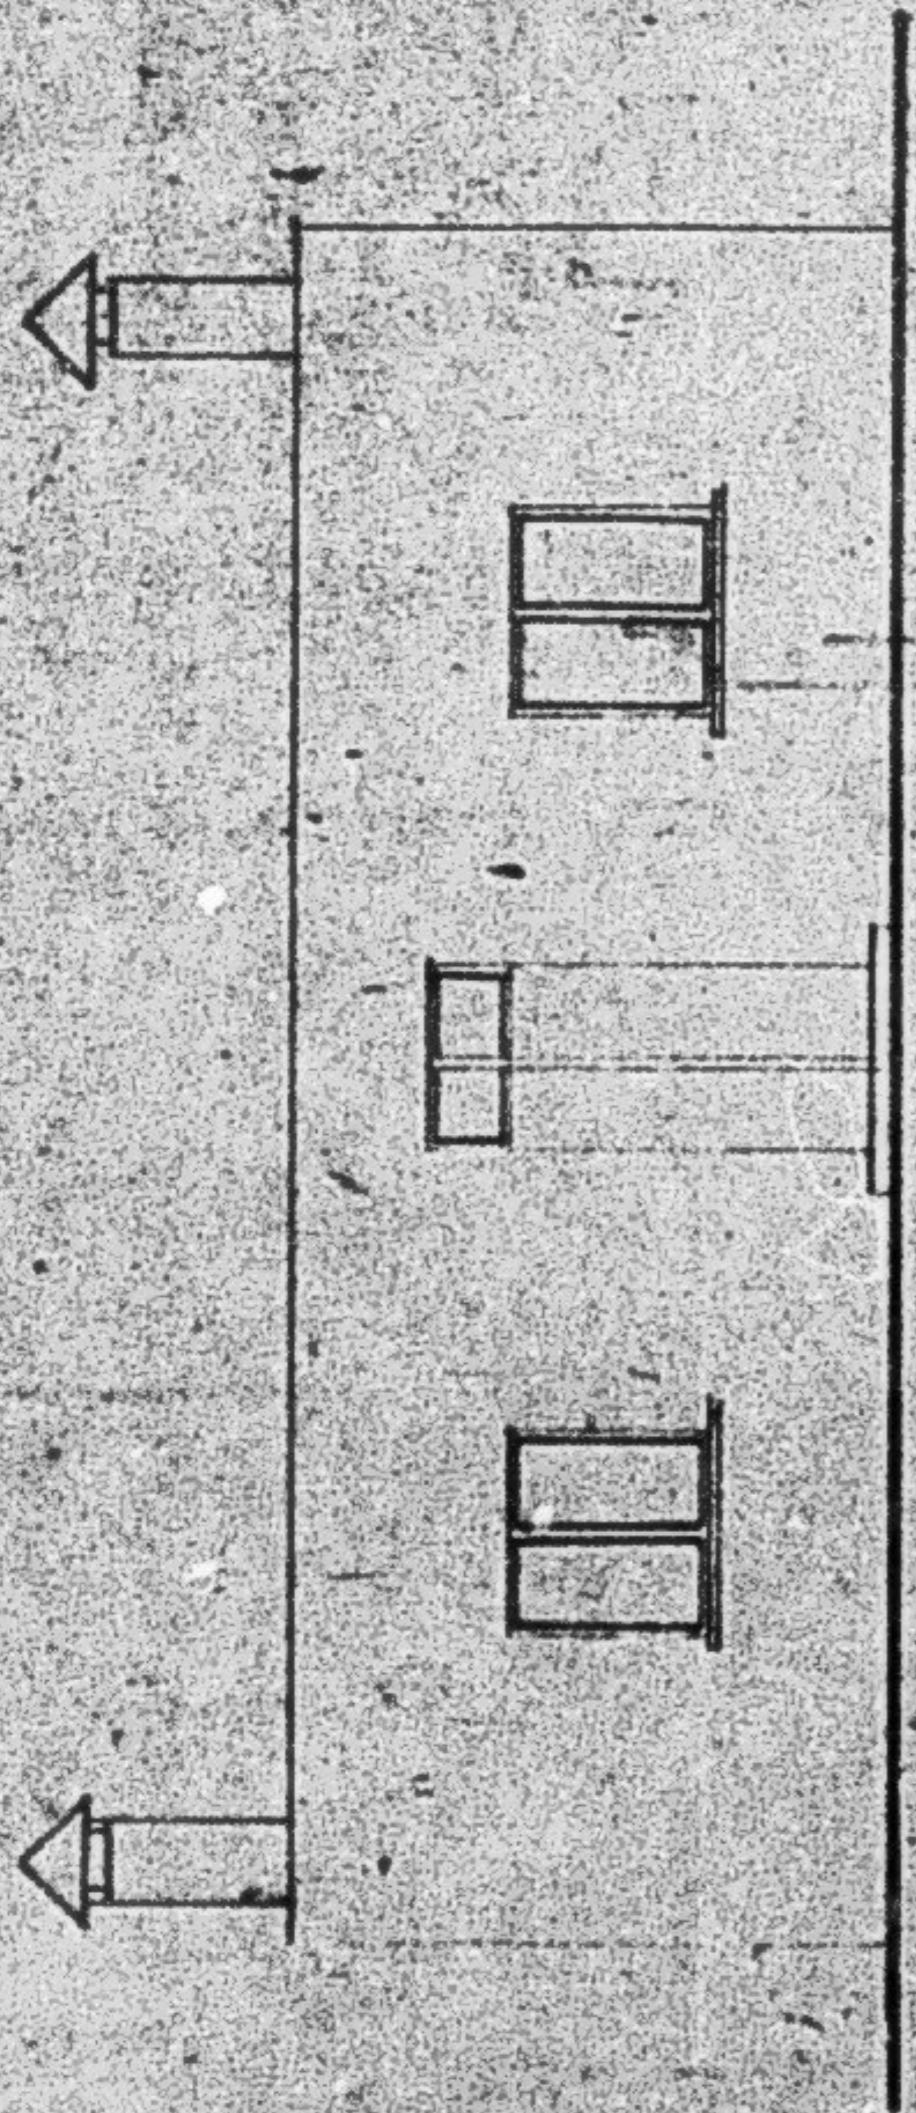


PLAN

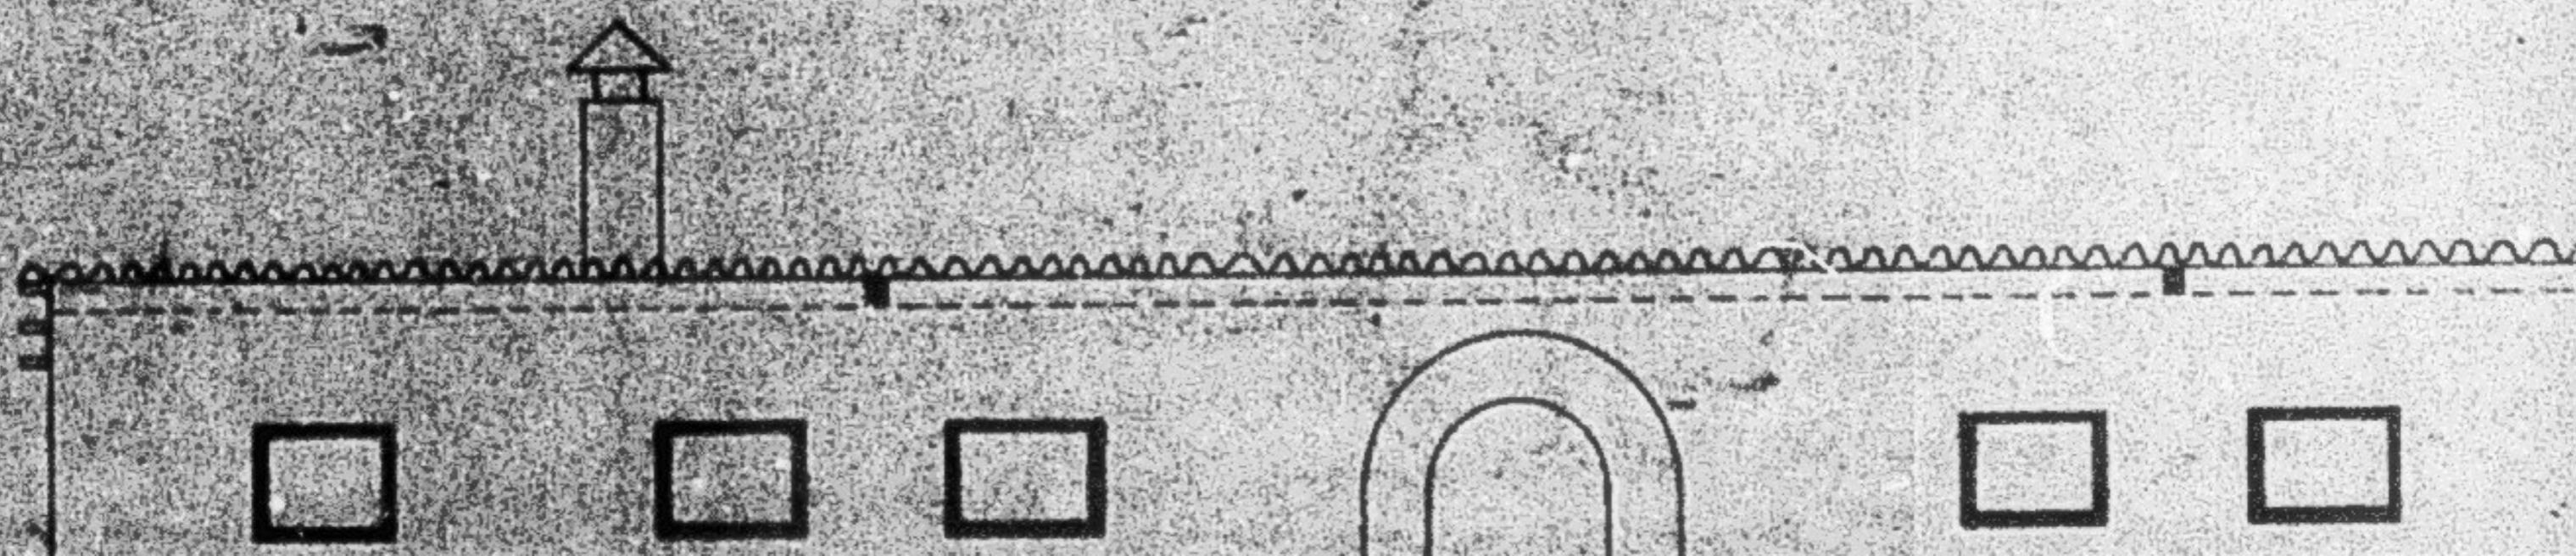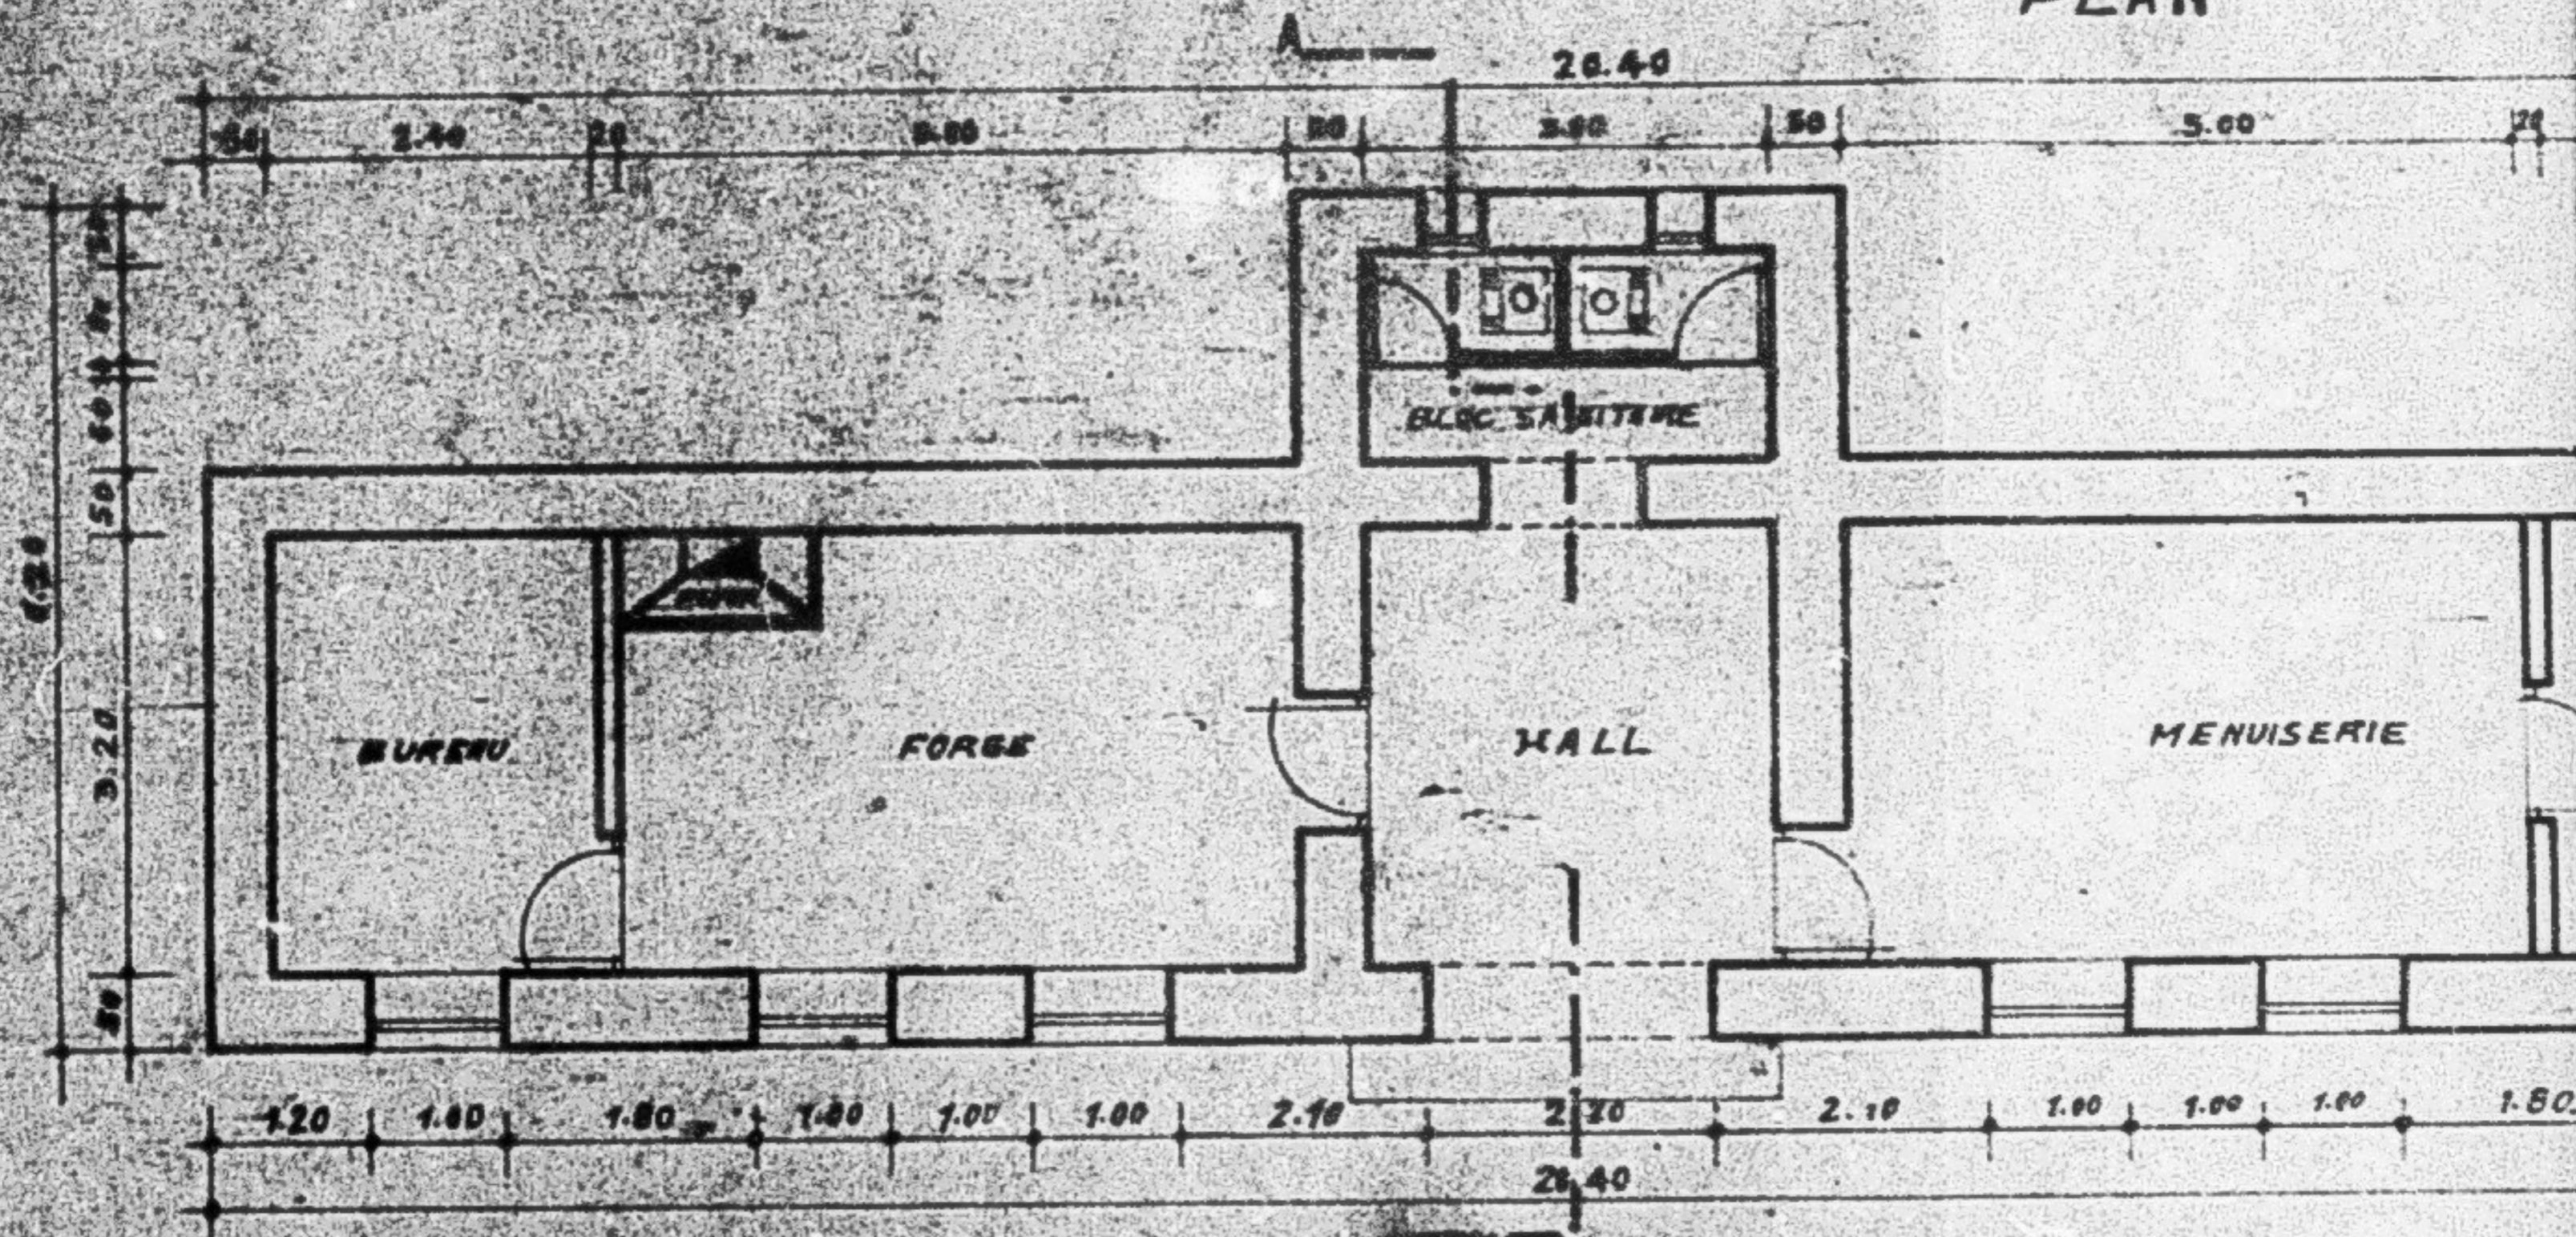

PLAN

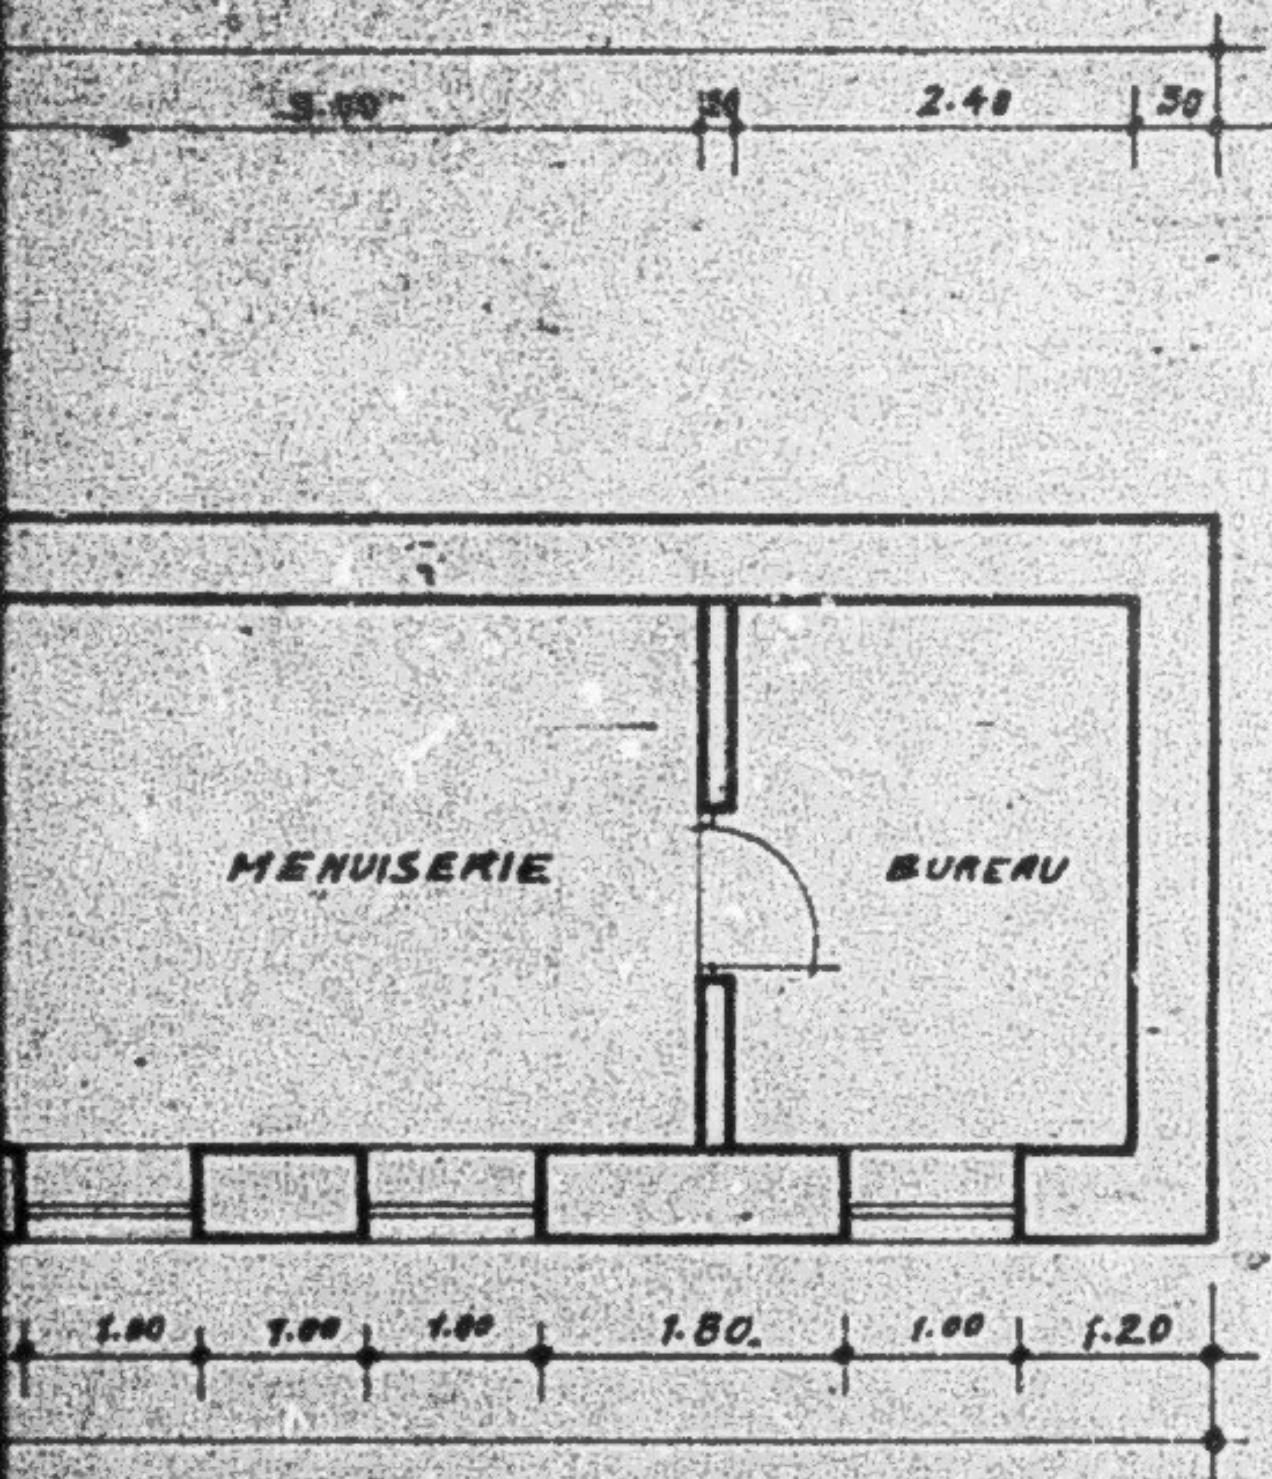


COUPE: AA

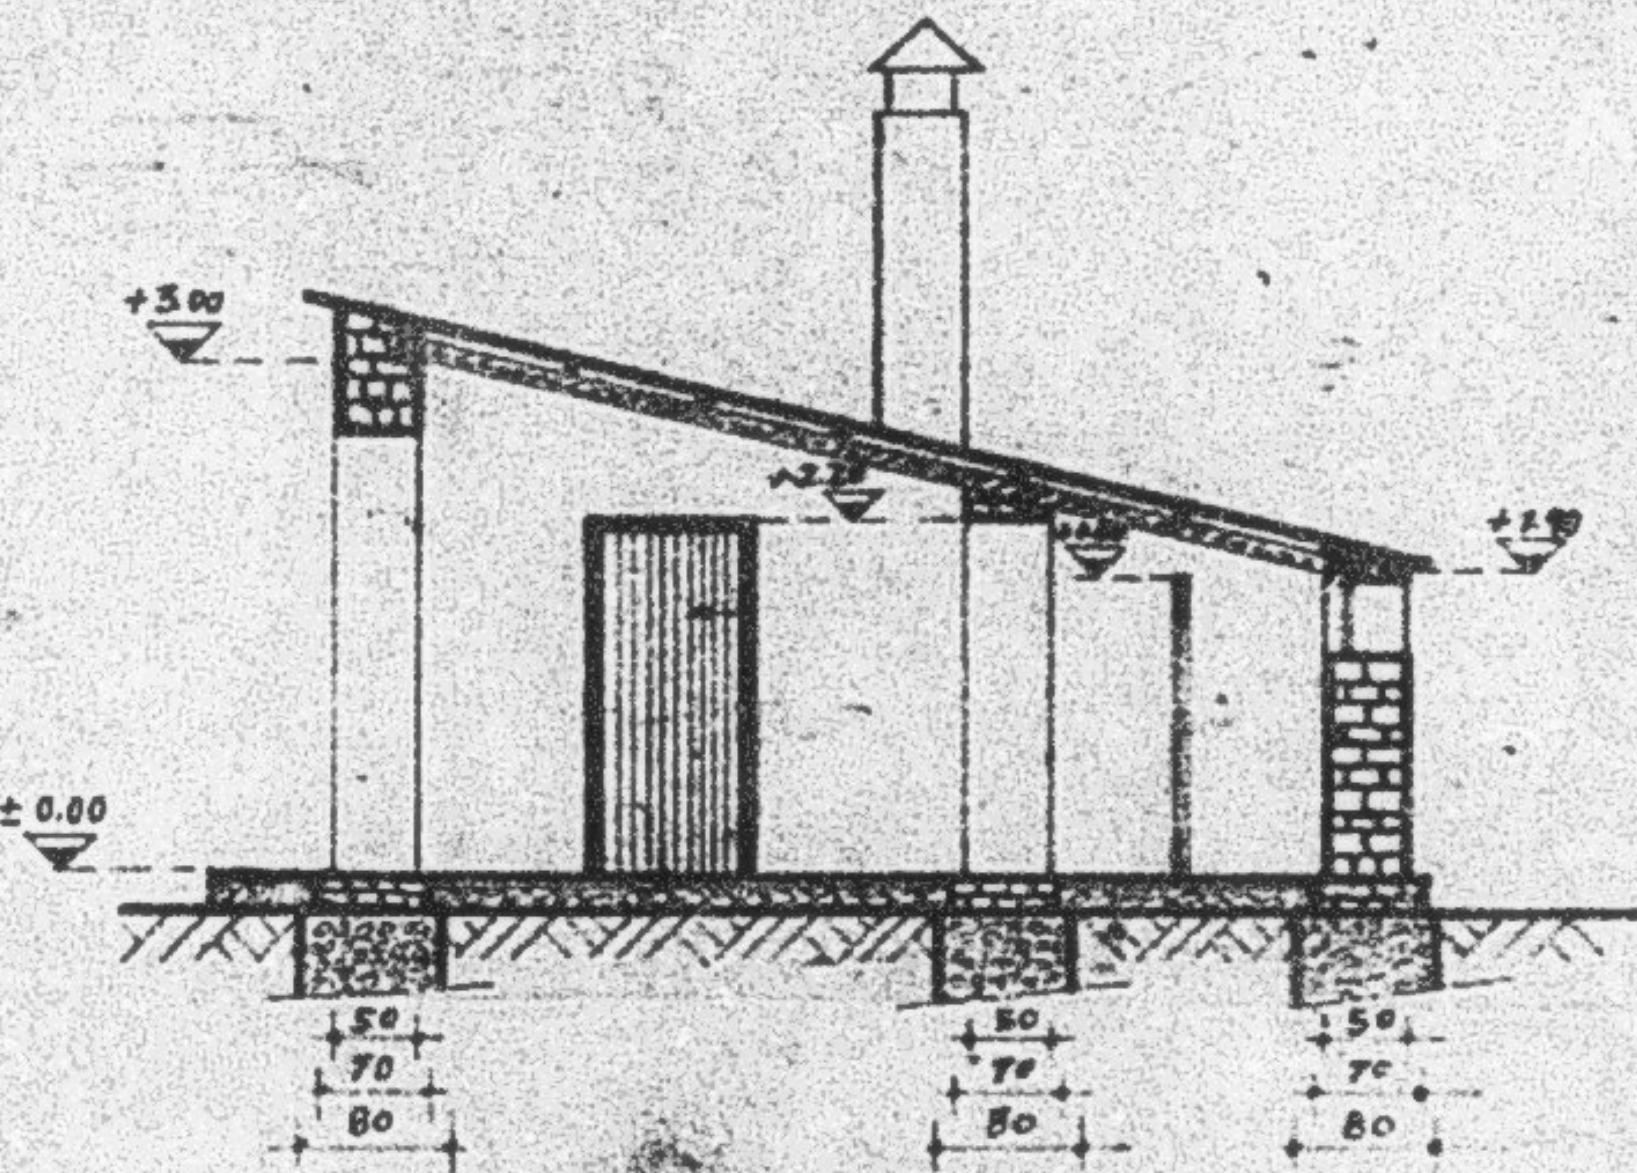


CNDA 34130


PLAN

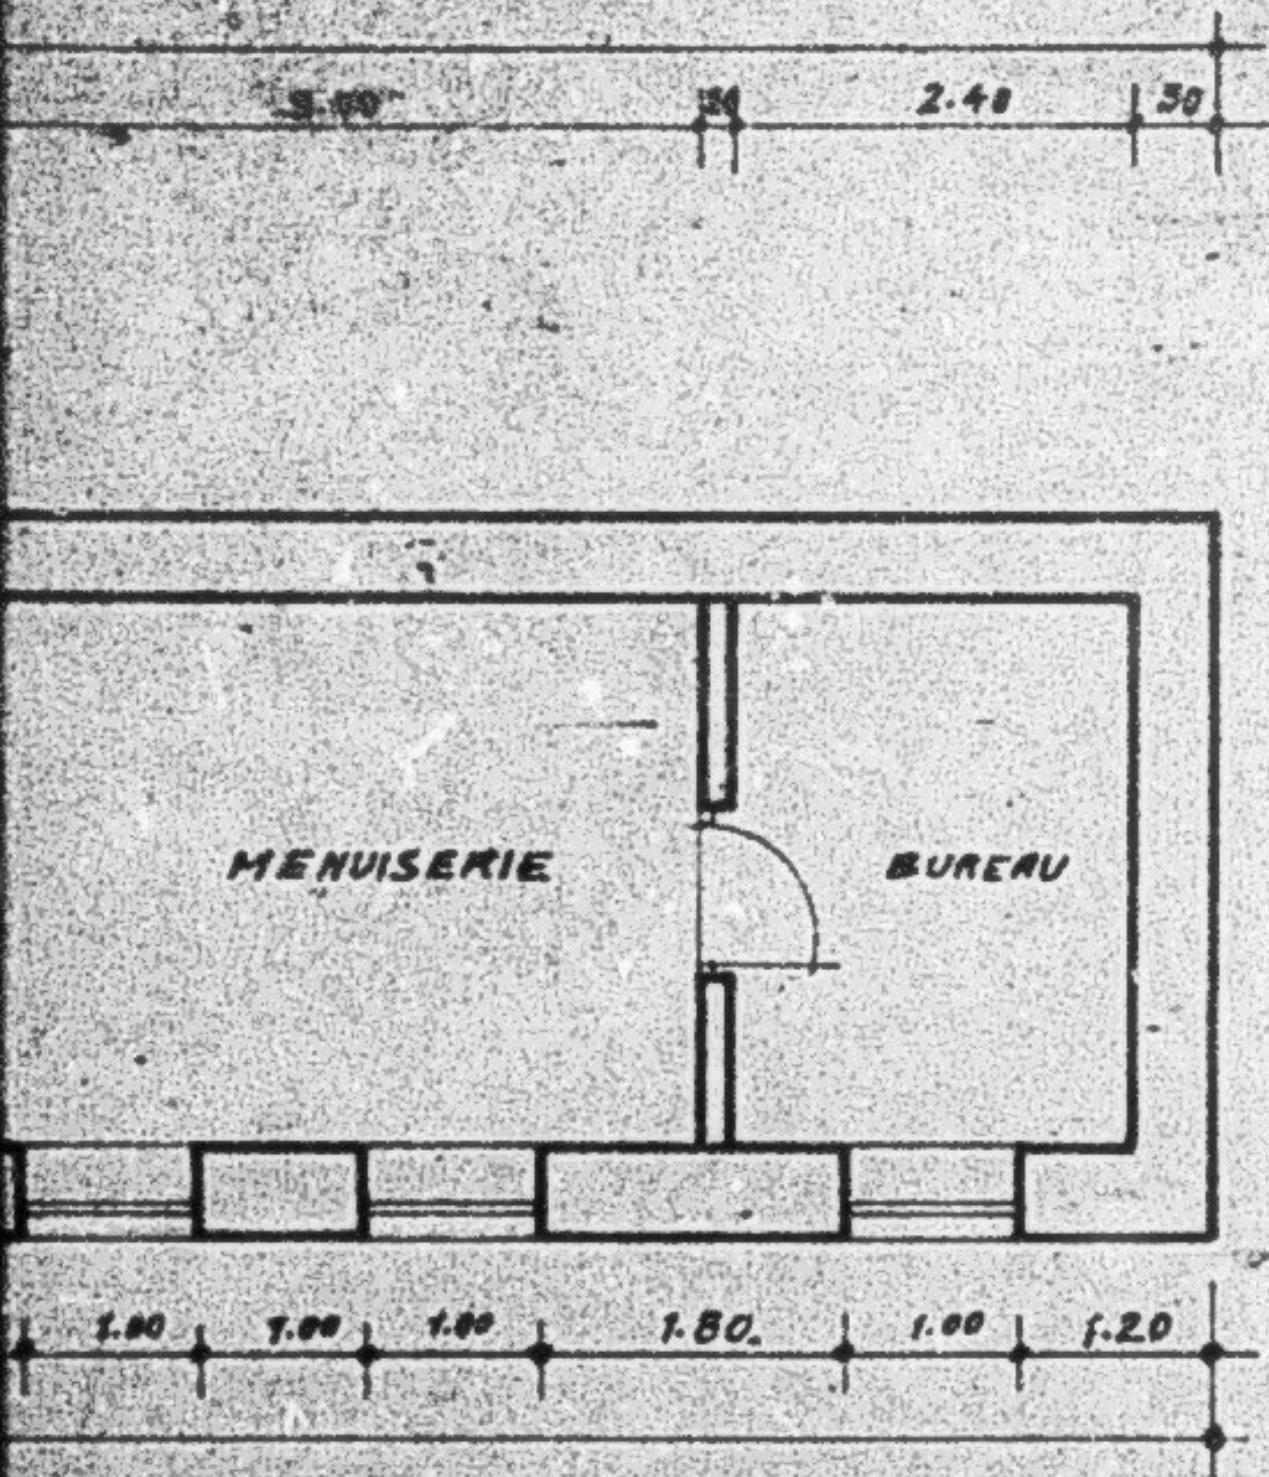



COUPE: AA

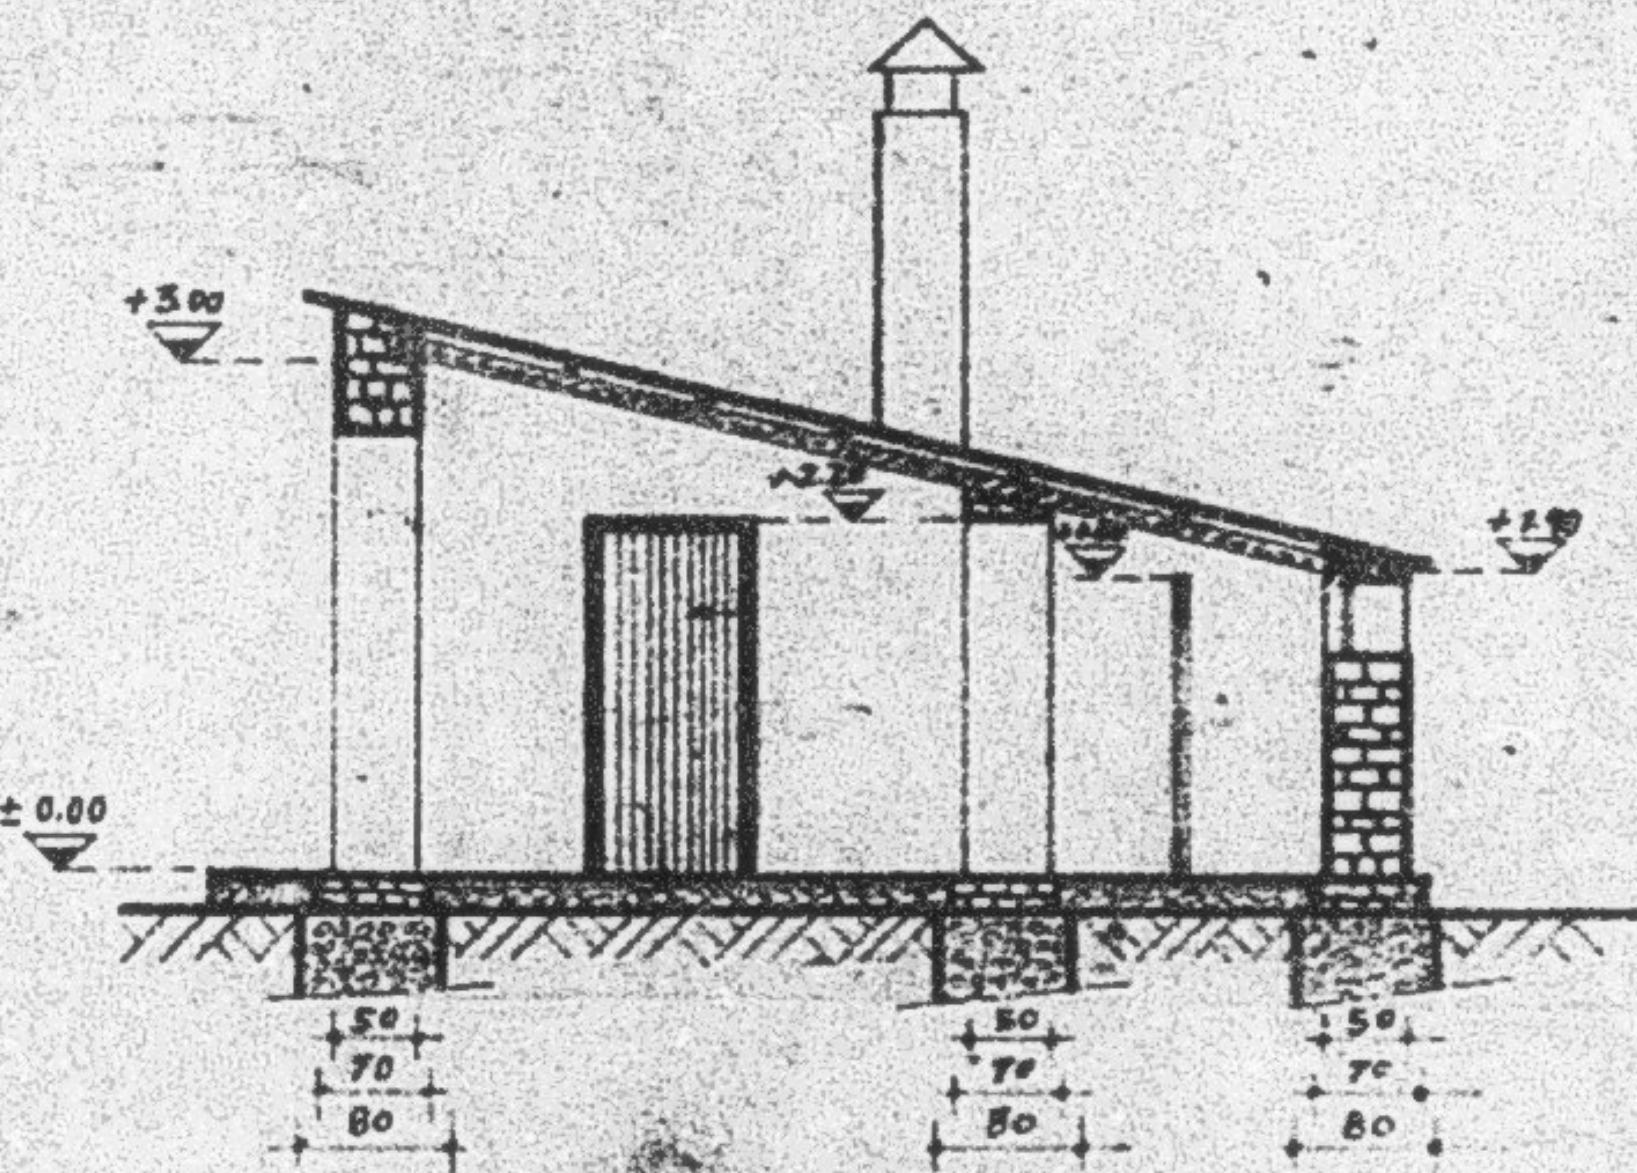



CNDA 34130

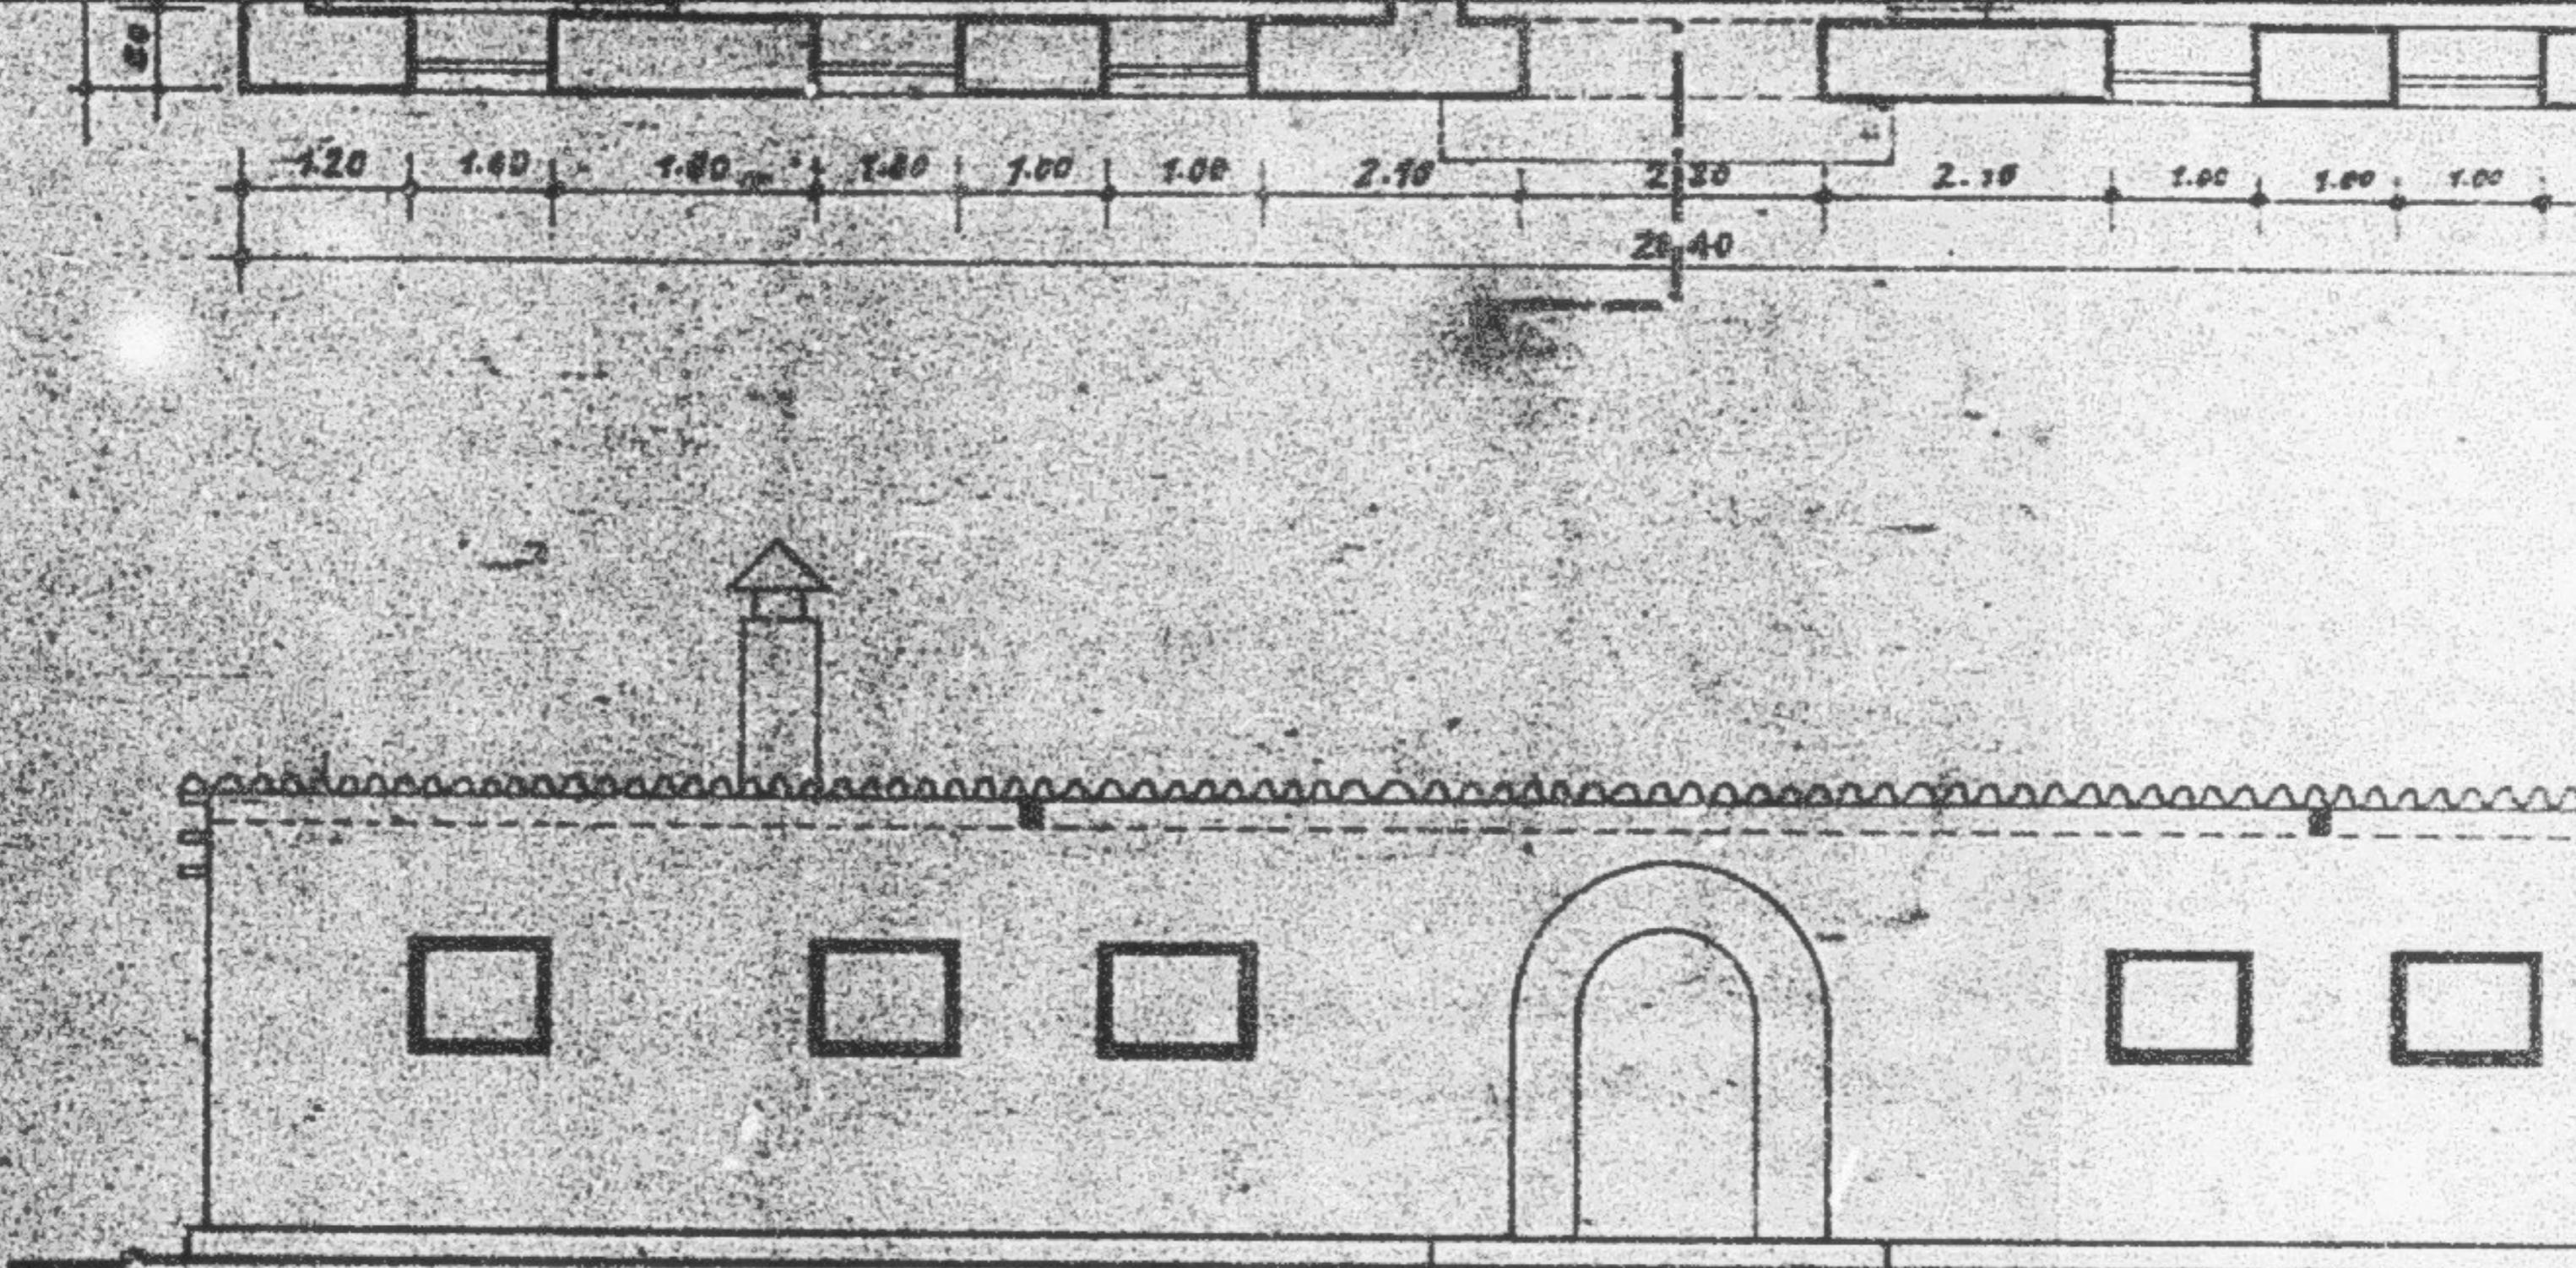

FAÇADE - PRINCIPALE

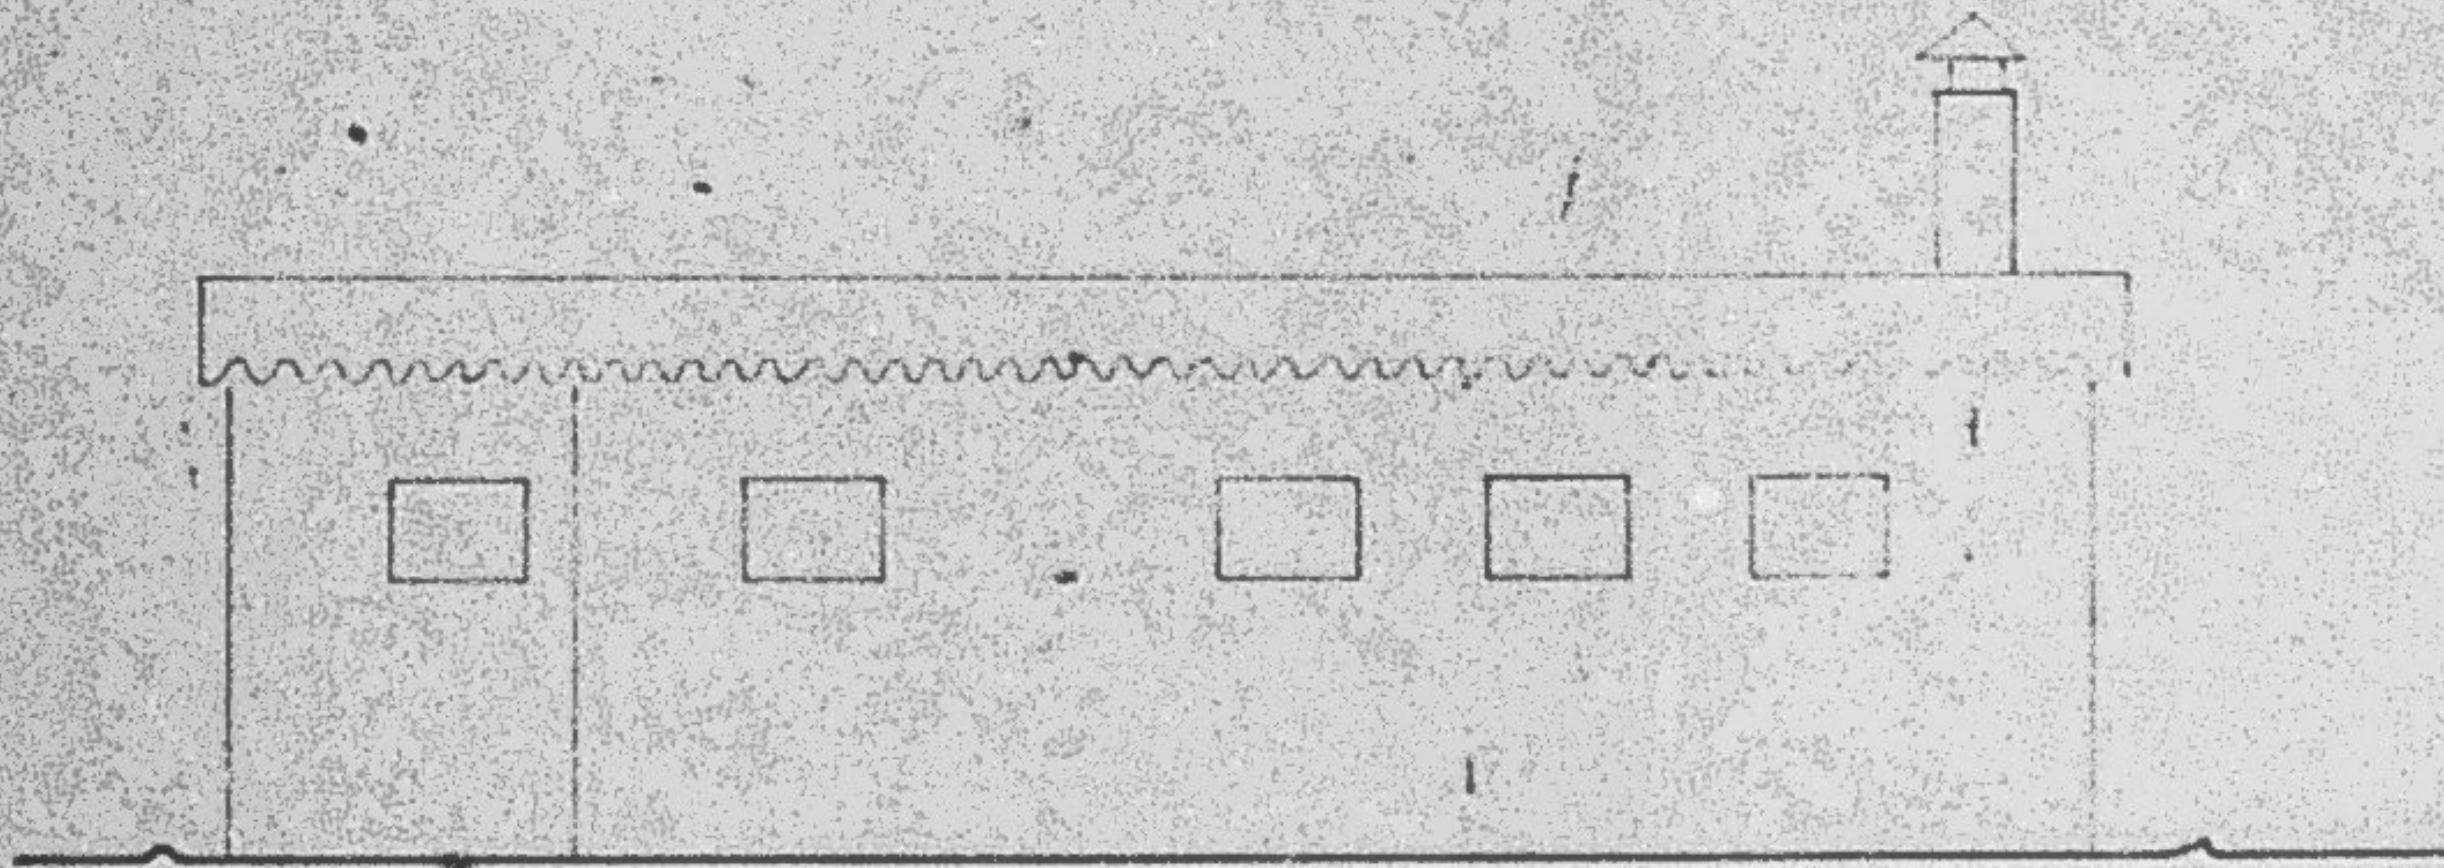
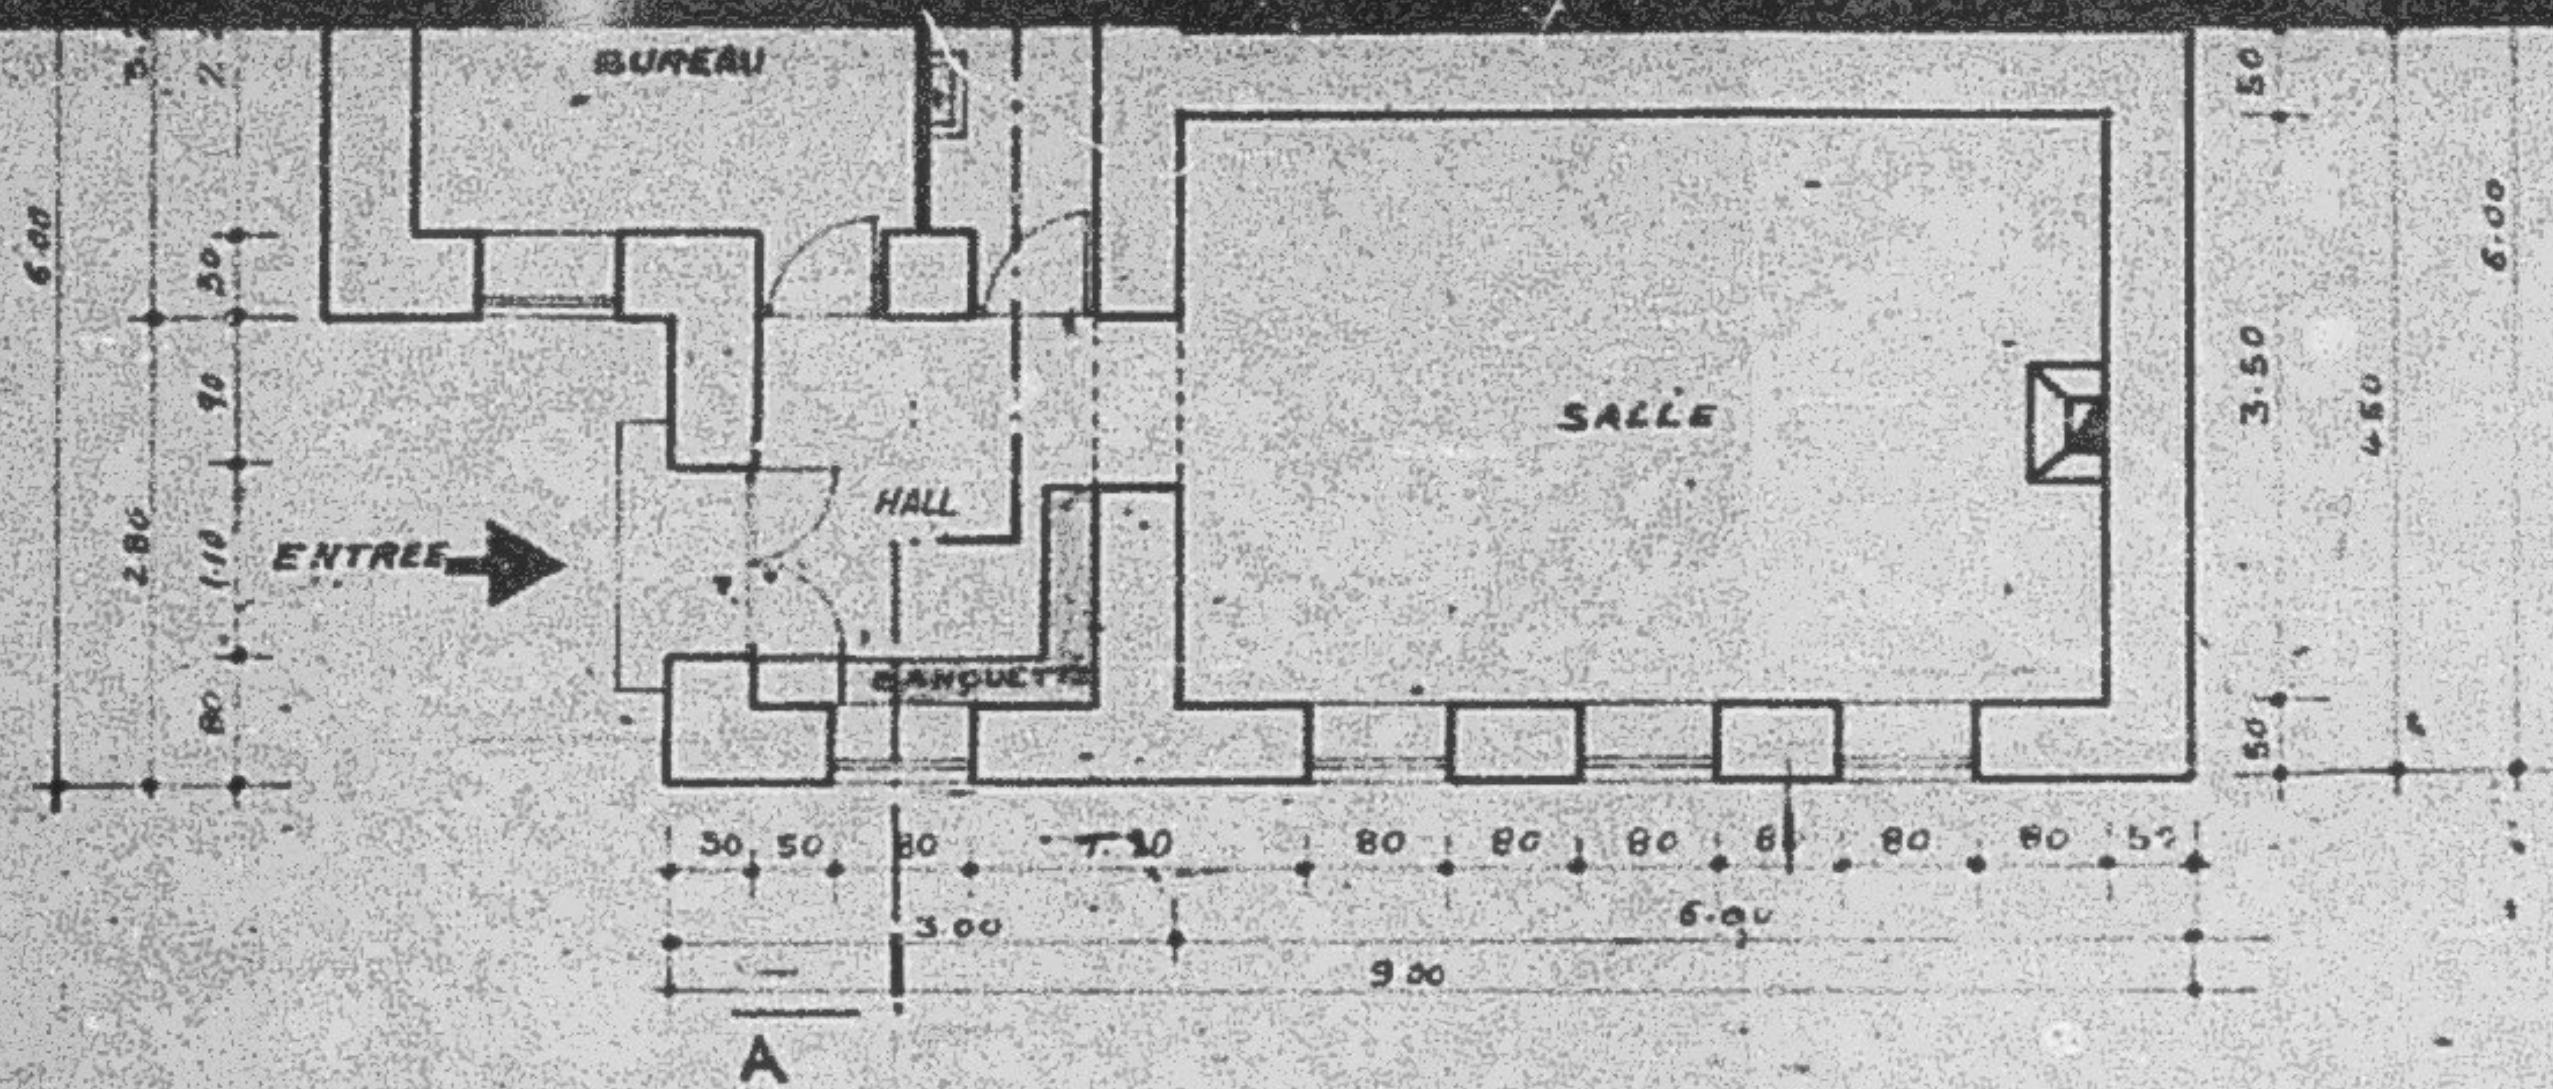


FAÇADE PRINCIPALE

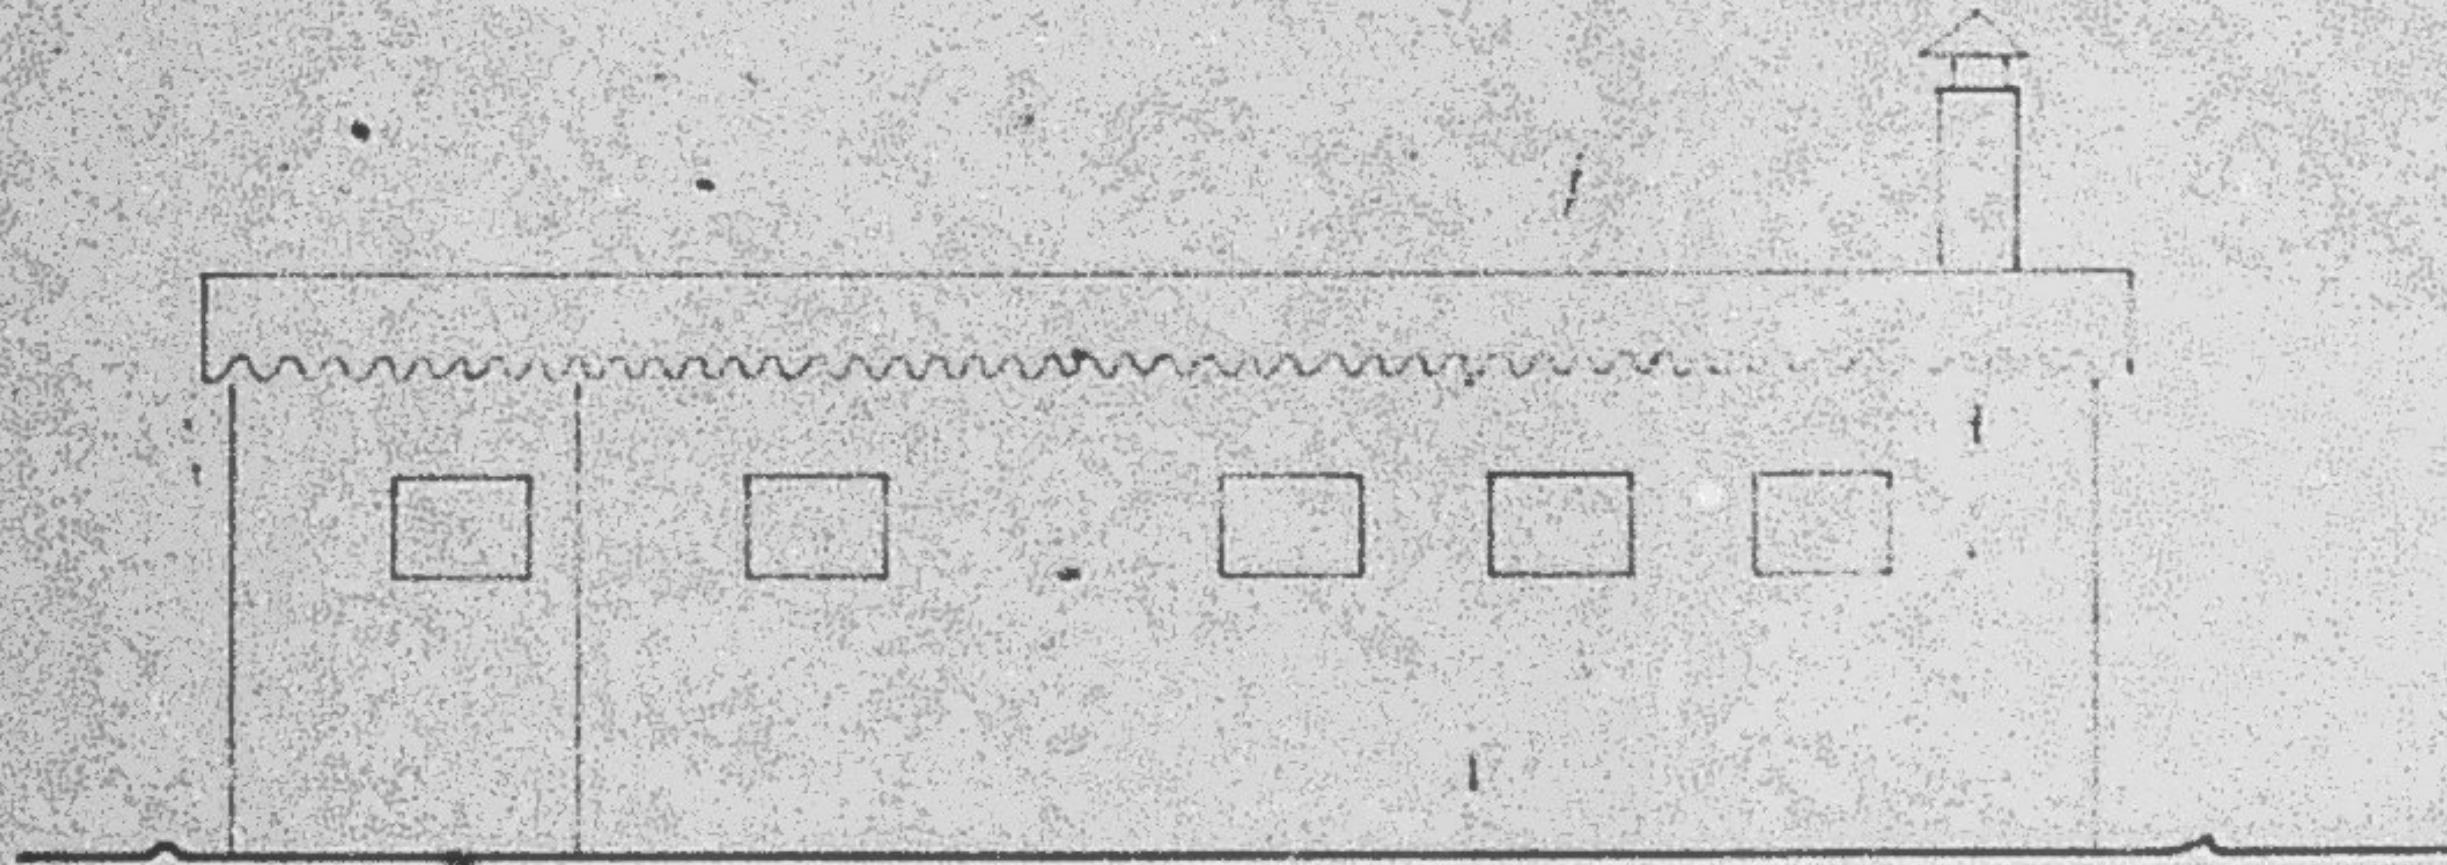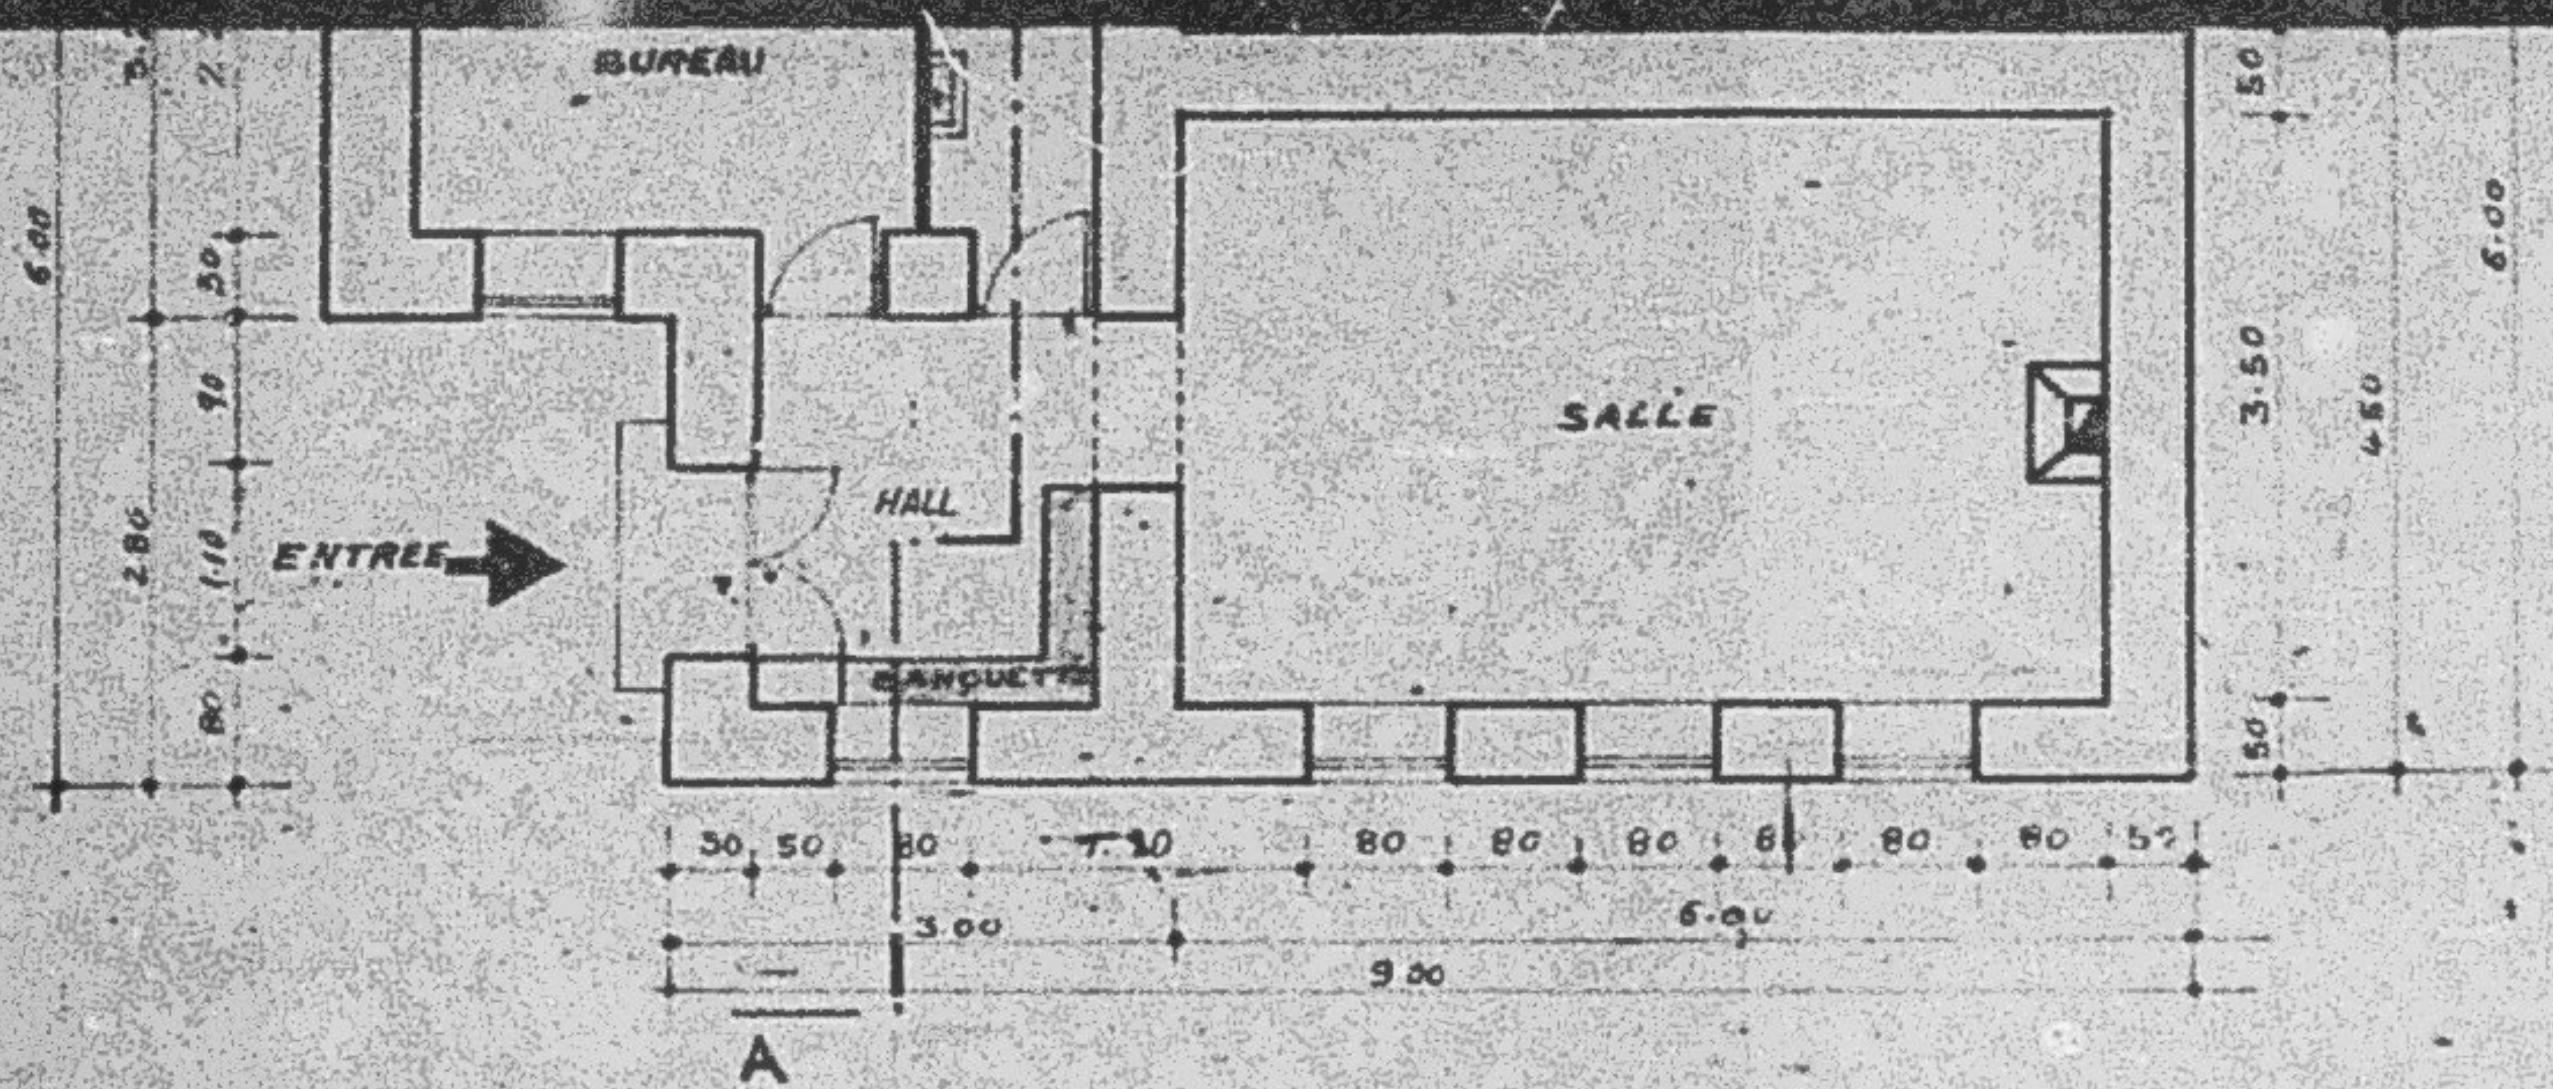

FAÇADE PRINCIPALE

*COUPE AA*

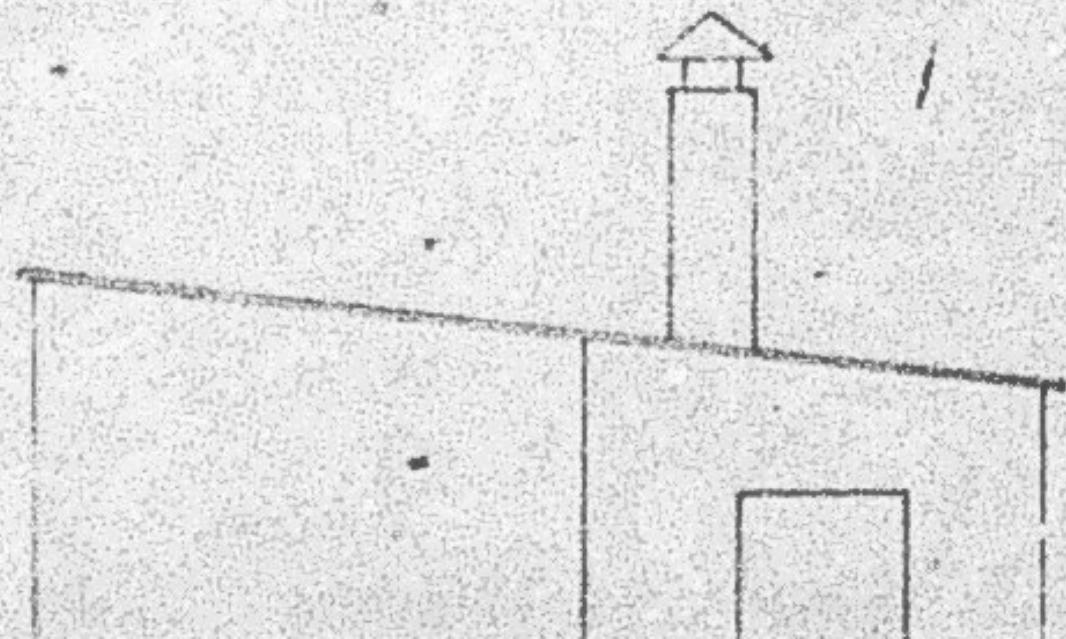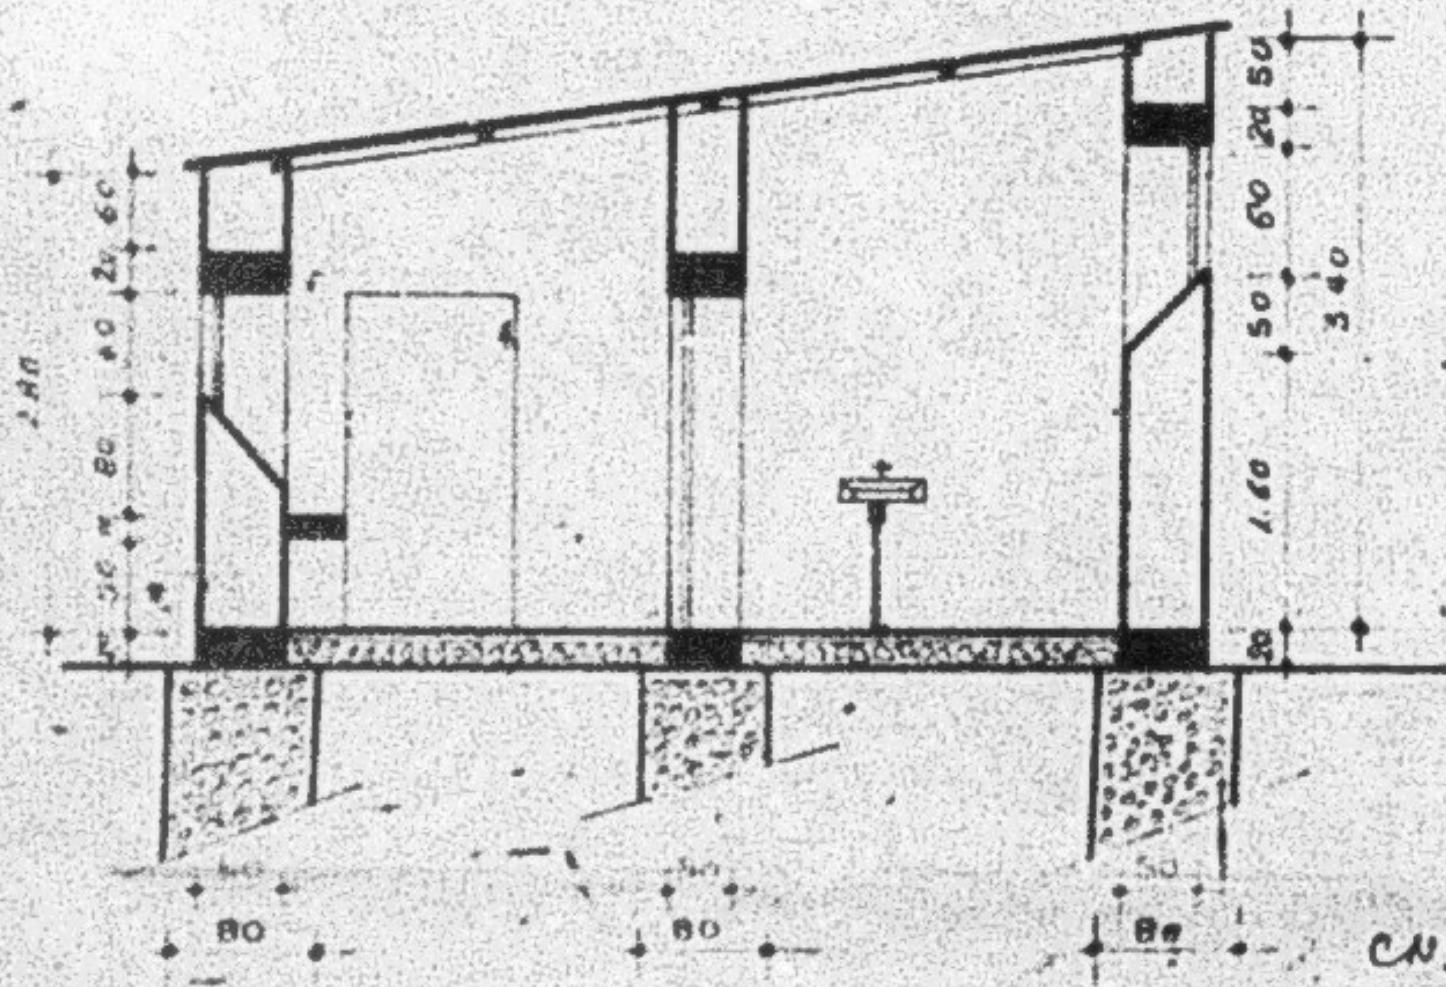


80

80

80

CNDA 34130

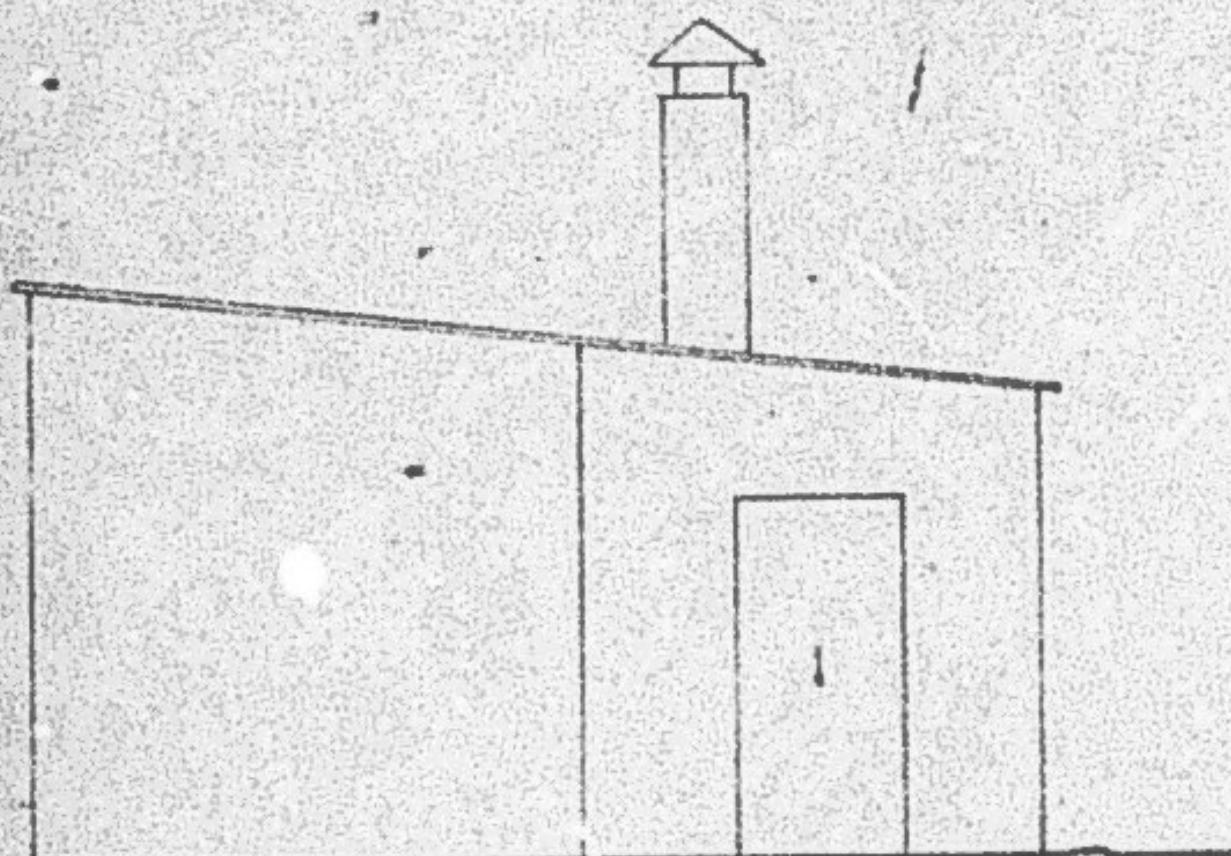

FAÇADE (ENTREE)

Projet FAO / SIDA  
TF / TUN 3 SWI  
Assistance au Développement  
des Actions Forestières de Tunisie

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROGRAMME VILLAGES FORESTIERS

CENTRE DE TISSAGE

111

59

VILLEB
